



**ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
COMUNA COSMEȘTI
PRIMAR**



Str. G-ral Dumitru Dămăceanu, nr. 73, COSMEȘTI, cod postal 807085; jud. Galați; tel.: 0236336227;
Fax: 0236336218; CUI 3655943; e-mail: cosmesti@gl.e-adm.ro; Web-site: www.primaria-cosmesti.ro

**DISPOZIȚIA nr. 297
Din 05.09.2022**

Privind convocarea Consiliului Local Cosmești în ședință extraordinară pe luna septembrie 2022

Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispozițiile:

- Art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată;
- Art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- Art. 7, alin. (2) din Codul Civil aprobat prin Legea 287/2009 cu modificările ulterioare;
- Art. 133, alin. (1) și art. 134, alin. (1), lit. „a” și alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare;
- Hotărârile Consiliului Local nr. din 15/25.02.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Cosmești, județul Galați.

În temeiul prevederilor 196, alin. (1), lit. „b”, din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare,

***PRIMARUL COMUNEI COSMEȘTI validat prin Încheierea în Camera de Consiliu a Judecătoriei
Tecuci în dosarul nr. 4235/324/14.10.2020, emite următoarea dispoziție:***

Art.1. Se convoacă Consiliul Local al Comunei Cosmești, în ședință extraordinară pe luna septembrie 2022, în data 09.09.2022, ora 09,00, ce va avea loc în sala de sedințe a Consiliului Local din Căminul Cultural „General Eremia Grigorescu” Cosmești.

Art.2. Se dispune participarea tuturor doamnelor/domnilor consilieri în sală, la data și ora stabilite.

Art.3. Propunerile privind ordinea de zi sunt cuprinse în **anexa** care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.4. Proiectele sunt însoțite de Referatul de aprobare, Raportul de specialitate al aparatului de specialitate al primarului, alte materiale, iar comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local, vor întocmi avizele prevăzute de lege și le vor depune la secretarul general al comunei până la data de 08.09.2022, ora 16,00, însoțite de eventualele amendamente formulate și fundamentate, în scris.

Art.5. Prezenta dispoziție se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al comunei Cosmești, în termenul prevăzut de lege, Instituției Prefectului Galați, doamnelor și domnilor consilieri locali, letric sau prin email și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Primăriei Cosmești și prin publicarea pe site la adresa: www.primaria-cosmesti.ro, în Monitorul Oficial Local, la rubrica dedicată dispozițiilor primarului.

**PRIMARUL COMUNEI COSMEȘTI,
Ing. ION TUCHILUȘ**



**Contrasemnează pentru legalitate:
Secretar General al Comunei,
ZAHARIA CRISTINA**

PROPUNERILE
privind ordinea de zi a ședinței extraordinare din data de 09.09.2022, ora 09,00

1. Însușirea procesului verbal al ședinței Consiliului Local din data de 30.08.2022.
2. Proiect de hotărâre privind: *aprobarea prelungirii Scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN- SA pentru proiectul finanțat prin Masura 19.2 Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală al Comunei Cosmești "AMENAJARE TEREN DE SPORT SAT FURCENII NOI, COMUNA COSMEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI";*
3. Proiect de hotărâre privind: *Aprobarea Documentației Tehnice, faza SF pentru obiectivul „Construire monument închinat eroilor din comuna Cosmești, județul Galați”;*
4. Proiect de hotărâre privind: *rectificarea bugetului local al Comunei Cosmești, județul Galați pentru anul 2022;*
5. Întrebări, interpelări, răspunsuri.

CONSILIERII LOCALI					
1.	BALHUI DUMITRU	E-mail/letric	9.	RADU GOGU	E-mail/letric
2.	BÎRLĂDENU EMIL-CONSTANTIN	E-mail	10.	ROȘCA MARICICA	E-mail/letric
3.	PODARU ZAMFIRICA	E-mail	11.	ROȘCA DAN	E-mail/letric
4.	PĂDURE FLORIN	E-mail	12.	CĂCU MARIAN	E-mail
5.	BERBECI MARIN	E-mail	13.	CHIRIȚĂ VASILE	E-mail/letric
6.	CIOT IOAN	Letric	14.	LIONTE RADU	E-mail
7.	COJOCARU COSTICĂ	E-mail/letric	15.	MICU CORNEL	E-mail
8.	NUNU DORU	E-mail/letric			

INVITAȚI ȘI SEMNĂTURILE PENTRU LUARE LA CUNOȘTINȚĂ:					
1.	Eugen Floroiu		2.		

Primar,
Ing. Ion Tuchiluş



Secretar general al comunei
Cristina Zaharia



ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
COMUNEI COSMEȘTI
PRIMAR

Str. G-ral Dumitru Dămăceanu, nr. 73;
cod postal 807085;
e-mail: cosmesti@gl.e-adm.ro;
Web-site: www.primaria-cosmesti.ro

Nr. 7301/05.09.2022

CONVOCARE

În conformitate cu prevederile 133, alin.(2), lit. a) și a art. 134, alin.(1), lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, sunteți convocat în data de 09.09.2022, ora 09,00 la Ședința extraordinară pe luna septembrie 2022 a Consiliului Local Cosmești, ce va avea loc în sala de ședințe a Consiliului Local din Căminul Cultural „General Eremia Grigorescu” Cosmești cu participarea efectivă a tuturor consilierilor, ședință care a fost convocată prin Dispoziția Primarului nr. 297/2022, cu următoarea ordine de zi:

1. Însușirea procesului verbal al ședinței Consiliului Local din data de 30.08.2022.
2. Proiect de hotărâre privind: **aprobarea prelungirii Scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN– SA pentru proiectul finanțat prin Masura 19.2 Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală al Comunei Cosmești “AMENAJARE TEREN DE SPORT SAT FURCENII NOI, COMUNA COSMEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI”;**
3. Proiect de hotărâre privind: **Aprobarea Documentației Tehnice, faza SF pentru obiectivul „Construire monument închinat eroilor din comuna Cosmești, județul Galați”;**
4. Proiect de hotărâre privind: **rectificarea bugetului local al Comunei Cosmești, județul Galați pentru anul 2022;**
5. Întrebări, interpelări, răspunsuri.

Proiectele sunt însoțite de Referatul de aprobare, Raportul de specialitate al aparatului de specialitate al primarului, alte materiale, iar comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local, vor întocmi avizele prevăzute de lege în termenul prevăzut în Dispoziția de convocare.

Materialele de ședință vor fi puse la dispoziția domnilor consilieri în format electronic prin e-mail sau pe site-ul instituției și letric la solicitarea acestora.

Materialele complete pot fi vizualizate online, pe site-ul Primăriei Cosmești: www.primaria-cosmesti.ro, la rubrica „Monitorul Oficial local” pagina Proiecte.

Reiterez importanța urmăririi materialelor de ședință online, în vederea punerii în aplicare a măsurilor cu privire la digitalizarea României.

Primar,
Ing. Ion Tuchiluş



PROCESUL-VERBAL
al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Cosmești,
județul Galați din 30.08.2022, ora 10,00

Lista de prezență :

Consilieri locali prezenți:

1.	BALHUI DUMITRU	PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT	P
2.	BERBECI MARIN	PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT	P
3.	BÎRLĂDEANU EMIL- CONSTANTIN	PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT	P
4.	CIOT IOAN	PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT	P
5.	COJOCARU COSTICĂ	PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT	P
6.	LIONTE RADU	PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT	P
7.	PĂDURE FLORIN	PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT	P
8.	PODARU ZAMFIRICA	PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT	P
9.	CĂCU MARIAN	PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL	P-on line
10.	CHIRIȚĂ VASILE	PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL	P
11.	NUNU DORU	PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL	P
12.	RADU GOGU	PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL	P
13.	ROȘCA DAN	PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL	P
14.	ROȘCA MARICICA	PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL	P
15.	MICU CORNEL	PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ	P

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ: CORNEL MICU

Demnitari de nivel local: ION TUCHILUȘ- primarul comunei- prezent

Secretarul general al comunei: Cristina Zaharia - prezent

Invitați: Eugen Floroiu- șef Birou-prezent

Ședința a fost convocată prin Dispoziția nr. 275/2022 pentru data de 30.08.2022, ora 10.00.

Ședința are loc în sala de ședințe a Consiliului Local Cosmești din incinta Căminului Cultural Cosmești.

Efectuarea prezenței s-a făcut nominal de către secretarul general al comunei. Sunt prezenți în sală **14 consilieri locali**, domnul primar, secretarul general al comunei, șeful Biroului Financiar contabil și este prezent online domnul Căcu, fortuit să lipsească fizic, datorită unei urgențe medicale a mamei sale, dar care a solicitat să îi fie aprobată participarea online.

Secretarul general al comunei constată că este cvorum pentru ținerea ședinței, că ședința este legal constituită, că toate proiectele propuse au în spate documentele necesare aprobării și că se poate desfășura conform prevederilor legale și Regulamentului Consiliului Local aprobat prin Hotărârea nr. 15/2021, drept pentru care dă cuvântul dnului președinte pentru a conduce lucrările. Acesta face precizarea că în sală mai sunt prezenți dnii Țuchel Iancu-cetățean din Furcenii Noi- propus de primar să facă parte din Comitetul director al Clubului Sportiv, dnii Marin Marius și Cristea Costică.

Dl președinte dă citire Ordinii de zi propusă de primar prin Dispoziție.

Ținând cont că nu sunt intervenții la Ordinea de zi, dnul președinte continuă lucrările, supune la vot Ordinea de zi în forma propusă de domnul primar. Toți consilierii sunt de acord cu Ordinea de zi în forma propusă.

Având în vedere majoritatea de voturi <pentru> (15), ordinea de zi va fi cum a fost propusă de domnul primar și adoptată de Consiliul Local.

I. Dl președinte de ședință propune să se treacă la punctul 1 al ordinii de zi: Aprobarea și însușirea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al comunei Cosmești, județul Galați din 29.07.2022.

Dl președinte de ședință anunță că materialele au fost trimise în timp util și au fost afișate pe site-ul instituției pentru a le vedea fiecare.

Nu mai sunt înscrieri la cuvânt, drept pentru care supune la vot pentru aprobarea și însușirea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al comunei Cosmești, județul Galați din 29.07.2022.

Au votat <pentru> un număr de 14 consilieri. Se abține dnul Nunu, deoarece el nu a participat la ședința precedentă.

Prin urmare, Procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al comunei Cosmești, județul Galați din 29.07.2022, a fost aprobat și însușit.

II. Dl președinte de ședință propune să se treacă la punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind: aprobarea înregistrării în domeniul privat al comunei Cosmești, județul Galați a suprafeței de 18673 mp. situat în Tarla 61, parcela 357+358, extravilan Furcenii Vechi, teren neproductiv și a suprafeței de 1934 mp, situat în cv. 7, P 375, intravilan Furcenii Vechi, teren neproductiv.

Dnul președinte cere ca oricine va lua cuvântul să se refere la subiect și să nu dureze mai mult de 3 min.

Nu se înscrie nimeni la cuvânt.

Dl președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea înregistrării în domeniul privat al comunei Cosmești, județul Galați a suprafeței de 18673 mp. situat în Tarla 61, parcela 357+358, extravilan Furcenii Vechi, teren neproductiv și a suprafeței de 1934 mp, situat în cv. 7, P 375, intravilan Furcenii Vechi, teren neproductiv.

Au votat <pentru> un număr de 14 consilieri. S-a abținut dnul Radu, vot ce va fi contabilizat la „Împotrivă” conform Regulamentului CL.

Având în vedere faptul că au votat <pentru> un număr de 14 consilieri, dl președinte de ședință anunță că, Proiectul de hotărâre privind aprobarea înregistrării în domeniul privat al comunei Cosmești, județul Galați a suprafeței de 18673 mp. situat în Tarla 61, parcela 357+358, extravilan Furcenii Vechi, teren neproductiv și a suprafeței de 1934 mp, situat în cv. 7, P 375, intravilan Furcenii Vechi, teren neproductiv, a fost adoptat. (n.r. HCL 52 /2022).

III. Dl președinte de ședință propune să se treacă la punctul 3 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind: aprobarea înregistrării în domeniul public al comunei Cosmești, județul Galați a suprafeței de 2790 mp. situat în Furcenii Vechi, categoria drum comunal/stradă, identificat Dc 375.

Nu sunt înscrieri la cuvânt.

Dl președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea înregistrării în domeniul public al comunei Cosmești, județul Galați a suprafeței de 2790 mp. situat în Furcenii Vechi, categoria drum comunal/stradă, identificat Dc 375.

Au votat <pentru> un număr de 15 consilieri.

Având în vedere faptul că au votat <pentru> un număr de 15 consilieri, dl președinte de ședință anunță că, Proiectul de hotărâre privind: aprobarea înregistrării în domeniul public al comunei Cosmești, județul Galați a suprafeței de 2790 mp. situat în Furcenii Vechi, categoria drum comunal/stradă, identificat Dc 375, a fost adoptat. (n.r. HCL 53/2022).

IV. Dl președinte de ședință propune să se treacă la punctul 4 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind: numirea Comitetului Director al Clubului Sportiv Local „Siretul” pentru următorii 4 ani.

Dnul Balhui propune dintre consilieri pe dnul Bîrlădeanu și pe dnul Ciot, propunere adoptată cu 10 voturi pentru și 5 abțineri(dnii Radu, Chiriță, Roșca, Nunu și dna Roșca). Ia cuvântul dnul Nunu, care spune că nu trebuie să fie consilieri cei numiți de Consiliul Local, deoarece ANI nu s-a pronunțat încă la incompatibilitate. Consiliul Local votează bugetul Clubului și nu poate participa la cheltuirea lui. Se fac discuții pro și contra, se ceartă cu dnul primar, care a intervenit, și-i spune că nu are voie să intervină în discuții, primarul spune că o să părăsească sala să poată vorbi el, dnul Nunu spune că de fapt nu e nici o schimbare, deși nimeni nu a propus altceva, unii susțin că la Club au fost performanțe naționale și județene, dar nu vor ei să le vadă, cineva spune că cei din Comitetul director nu sunt remunerați, deci nu au conflicte de interese sau incompatibilități și secretarul comunei citește din Regulamentul Clubului care specifică clar cum sunt numiți membrii Comitetului director/art. 21, alin. (2). Dnul Radu spune că acest Club nu trebuie finanțat doar din buget ci și din donații sau sponsorizări. Întreabă dacă sunt și sponsorizări. I se răspunde că da, dar mici. Dnul Radu spune că el a cerut să fie și sponsorizări/donații încă de la înființarea Clubului. Dorește să se consemneze acest lucru în procesul verbal. Intervine și dnul Marin care invită pe dnul Radu pe stadion să vadă că banii sunt investiți în oameni de calitate care fac performanțe. Dnul președinte de ședință felicită sportivii clubului pentru rezultatele din acest an, și cere dnilor consilieri să revină la subiect. Dnul Bîrlădeanu propune din societatea civilă pe dnul Marin Marius și pe dnul Cristea Costică, fost sportiv de performanță, a căror merite sunt recunoscute pe plan local ca și participare la competițiile sportive locale și suport moral acordat Clubului. Dnul președinte supune la vot propunerea formulată de dnul Bîrlădeanu din partea societății civile, votată cu 9 voturi pentru și 6 abțineri(dnii Radu, Nunu, Căcu, Roșca Dan, Chiriță și dna Roșca). Nu au fost alte propuneri. Nu mai sunt discuții.

Dl președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre privind: ***numirea Comitetului Director al Clubului Sportiv Local „Siretul” pentru următorii 4 ani.***

Au votat <pentru > un număr de 9 consilieri. S-au abținut dnii Nunu, Radu, Căcu, Roșca, Chiriță și dna Roșca, voturi ce vor fi contabilizate la voturi împotriva, cf. Regulamentului Consiliului Local.

Având în vedere faptul că au votat <pentru > un număr de 9 consilieri, dl președinte de ședință anunță că, ***Proiectul de hotărâre privind : numirea Comitetului Director al Clubului Sportiv Local „Siretul” pentru următorii 4 ani, a fost adoptat.*** (n.r. HCL 54/2022).

V. Dl președinte de ședință propune să se treacă la ***punctul 5*** al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind: ***desemnarea unui reprezentant și a unui membru supleant din Consiliul Local al comunei Cosmești pentru a face parte din Comisia de evaluare a probei Interviu, la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct –organizat de Inspectoratul Școlar Județean Galați.***

Dnul Pădure propune pe dnul Bîrlădeanu, membru și pe dra Podaru, supleant. Nu mai sunt alte propuneri. Se supune la vot propunerea făcută, se aprobă cu 9 voturi pentru și 6 abțineri(dnii Nunu, Radu, Căcu, Roșca, Chiriță și dna Roșca).

Dl președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre privind ***desemnarea unui reprezentant și a unui membru supleant din Consiliul Local al comunei Cosmești pentru a face parte din Comisia de evaluare a probei Interviu, la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct –organizat de Inspectoratul Școlar Județean Galați.*** Au votat <pentru> un număr de 9 consilieri. S-au abținut dnii Nunu, Radu, Căcu, Roșca, Chiriță și dna Roșca, voturi contabilizate la împotriva, conform prevederilor Regulamentului CL.

Având în vedere faptul că au votat <pentru > un număr de 9 consilieri, dl președinte de ședință anunță că, ***Proiectul de hotărâre privind: desemnarea unui reprezentant și a unui membru supleant din Consiliul Local al comunei Cosmești pentru a face parte din Comisia de evaluare a probei Interviu, la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct –organizat de Inspectoratul Școlar Județean Galați, a fost adoptat.*** (n.r. HCL 55/2022).

VI. Dl președinte de ședință propune să se treacă la **punctul 6** al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind: ***aprobarea Regulamentului pentru acordarea unor premii și „Diplome de onoare” cuplurilor care au împlinit 50 de ani și peste 50 de ani de căsătorie, a premierii sportivilor comunei Cosmești cu performanțe județene/naționale/internaționale pentru activitatea depusă și a elevilor cosmeșteni cu rezultate deosebite la concursuri/examene județene/naționale/internaționale.***

Dnul Radu spune că în mandatul precedent a cerut să fie premiat dnul Niță, care împlinise 50 de ani de căsătorie și nu s-a vrut, deși el auzise că s-a mai premiat și anterior. Primarul spune că nu au fost date niciodată premii pentru așa ceva, că atunci nu a venit nimeni cu un proiect de Regulament. Acum a venit el cu acest proiect și se vor premia în acest an și cei care au depășit 50 de ani, pentru a fi alături de cetățeni. Urmând ca ulterior să fie premiere doar la aniversare. Dnul Radu spune că el se bucură pentru acest proiect. Dnul Floroiu spune că premiarea va viza 87 de familii care au 50 de ani și peste de căsătorie, fotbaliști de la Club,-21, canoiști -3, un copil care a luat 10 la Bacalureat în acest an, un copil de la școala din comună cu merite deosebite la concursuri de muzică și 3 fete de la școală, care au talent la muzică. Nu mai sunt înscrieri la cuvânt.

Dl președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre privind: ***aprobarea Regulamentului pentru acordarea unor premii și „Diplome de onoare” cuplurilor care au împlinit 50 de ani și peste 50 de ani de căsătorie, a premierii sportivilor comunei Cosmești cu performanțe județene/naționale/internaționale pentru activitatea depusă și a elevilor cosmeșteni cu rezultate deosebite la concursuri/examene județene/naționale/internaționale.***

Au votat <pentru > un număr de 15 consilieri.

Având în vedere faptul că au votat <pentru > un număr de **15 consilieri**, dl președinte de ședință anunță că, ***Proiectul de hotărâre privind: aprobarea Regulamentului pentru acordarea unor premii și „Diplome de onoare” cuplurilor care au împlinit 50 de ani și peste 50 de ani de căsătorie, a premierii sportivilor comunei Cosmești cu performanțe județene/naționale/internaționale pentru activitatea depusă și a elevilor cosmeșteni cu rezultate deosebite la concursuri/examene județene/naționale/internaționale, a fost adoptat.*** (n.r. HCL 56/2022).

VII. Dl președinte de ședință propune să se treacă la **punctul 7** al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind: ***Aprobarea Proiectului Tehnic pentru efectuarea obiectivului „Extindere alimentare cu apă pe străzile Viilor, Crizantemelor, Livezii în comuna Cosmești, județul Galați” și a Devizului estimativ.***

Dna Roșca întreabă de ce se face pe strada Livezii, că unii dintre vecini au apă. Răspunde primarul că acolo au parțial apă, fiecare pe cont propriu, dar nu este rețea. Proiectul a fost făcut la cererea cetățenilor, nu de capul nostru. Dnul Nunu spune că așa facem noi, investim facem rețea și o dăm degeaba la Apă Canal să sugă bani pentru a se îmbogăți. Este supărat că banii nu se întorc înapoi. Primarul spune că extinderea utilităților este de competența administrației publice locale. Energie, apă, gaze.... Dnul Nunu spune că vrea să i se transmită toate proiectele indiferent de volumul de copiere. De ce nu i s-a dat și lui un exemplar tipărit. I se spune că a fost transmis integral pe email și este integral postat pe site. Nu mai sunt înscrieri la cuvânt. Nu mai sunt discuții.

Dl președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre privind: ***Aprobarea Proiectului Tehnic pentru efectuarea obiectivului „Extindere alimentare cu apă pe străzile Viilor, Crizantemelor, Livezii în comuna Cosmești, județul Galați” și a Devizului estimativ.***

Au votat <pentru > un număr de 14 consilieri. S-a abținut dnul Nunu, vot contabilizat la împotrivă, conform prevederilor Regulamentului CL.

Având în vedere faptul că au votat <pentru > un număr de 14 consilieri, dl președinte de ședință anunță că, Proiectul de hotărâre privind: ***Aprobarea Proiectului Tehnic pentru efectuarea obiectivului „Extindere***

alimentare cu apă pe străzile Viilor, Crizantemelor, Livezii în comuna Cosmești, județul Galați” și a Devizului estimativ, a fost adoptat.(n.r. HCL 57/2022).

VIII. Dl președinte de ședință propune să se treacă la **punctul 8** al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind: *aprobarea Studiului de oportunitate și fundamentare pentru delegarea gestiunii activității de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor și Stației de Sortare Valea Mărului din județul Galați, delegarea serviciilor de operare, documentației de atribuire precum și acordarea unui mandat special pentru reprezentantul UAT Cosmești în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați.*

Nu sunt înscrieri la cuvânt. Nu sunt discuții.

Dl președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre privind: *aprobarea Studiului de oportunitate și fundamentare pentru delegarea gestiunii activității de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor și Stației de Sortare Valea Mărului din județul Galați, delegarea serviciilor de operare, documentației de atribuire precum și acordarea unui mandat special pentru reprezentantul UAT Cosmești în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați.*

Au votat <pentru> un număr de 14 consilieri. S-a abținut dnul Nunu, vot contabilizat la împotrivă, conform prevederilor Regulamentului CL.

Având în vedere faptul că au votat <pentru> un număr de 14 consilieri, dl președinte de ședință anunță că, Proiectul de hotărâre privind: *aprobarea Studiului de oportunitate și fundamentare pentru delegarea gestiunii activității de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor și Stației de Sortare Valea Mărului din județul Galați, delegarea serviciilor de operare, documentației de atribuire precum și acordarea unui mandat special pentru reprezentantul UAT Cosmești în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați, a fost adoptat.(n.r. HCL 58/2022).*

IX. Dl președinte de ședință propune să se treacă la **punctul 9** al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind: *Aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul „Modernizare străzi principale și secundare în comuna Cosmești, județul Galați”.*

Dnul Radu spune că la ulițele de la Furcenii Noi nu s-a terminat de asfaltat legătura dintre DJ și străzi. Primarul spune că mâine va avea întâlnire cu realizatorii lucrării de reabilitare a DJ 252 și va avea în vedere și aceste reparații. Și dnul Micu îi spune că firma care a lucrat la DJ 252 trebuie să finalizeze aceste lucrări, stânga-dreapta. Nu mai sunt înscrieri la cuvânt. Nu mai sunt discuții.

Dl președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre privind: *Aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul „Modernizare străzi principale și secundare în comuna Cosmești, județul Galați”.*

Au votat <pentru> un număr de 15 consilieri.

Având în vedere faptul că au votat <pentru> un număr de 15 consilieri, dl președinte de ședință anunță că, Proiectul de hotărâre privind: *Aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul „Modernizare străzi principale și secundare în comuna Cosmești, județul Galați”, a fost adoptat.(n.r. HCL 59/2022).*

X. Dl președinte de ședință propune să se treacă la **punctul 10** al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind: *rectificarea bugetului local al Comunei Cosmești, județul Galați pentru anul 2022.*

Nu sunt înscrieri la cuvânt. Nu sunt discuții.

Dl președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre privind: *rectificarea bugetului local al Comunei Cosmești, județul Galați pentru anul 2022.*

Au votat <pentru> un număr de 14 consilieri. S-a abținut dnul Nunu, vot contabilizat la împotrivă, conform prevederilor Regulamentului CL.

Având în vedere faptul că au votat <pentru > un număr de 14 consilieri, dl președinte de ședință anunță că, Proiectul de hotărâre privind: **rectificarea bugetului local al Comunei Cosmești, județul Galați pentru anul 2022, a fost adoptat.(n.r. HCL 60/2022).**

XI. Dl președinte de ședință propune să se treacă la punctul 8 al ordinii de zi: **Întrebări, interpelări și răspunsuri.**

Se înscrie dnul Radu, dnul Nunu și secretarul general al comunei.

Dnul Radu spune că s-a oprit curentul la Furcenii Noi, că cei de la Electrica au venit la solicitare au văzut și au venit la reparații abia a doua zi, stând cetățenii o zi fără curent. Dnul primar întreabă cine o fi vinovat? Administrația nu are cu ce repara. Se fac polemici că Electrica este stat în stat.

Dnul Nunu spune că a aflat că se face iar manifestarea asta de zilele comunei. Întreabă: „ce se sărbătorește? A făcut primarul vreo investiție importantă? A făcut ceva ca 3000 de ha să nu fie afectate de secetă? A făcut ceva să se întoarcă acasă din tinerii plecați peste hotare sau la oraș? A creat condiții pentru un trai mai bun? ” primarul spune că doar el nu vrea să vadă, dar rezultate sunt. Dnul Nunu spune că este un haos în comună, nu avem ce sărbători, dnul Balhui spune că se sărbătorește comuna, nu realizările, că cine vrea să se întoarcă s-a întors, dnul Nunu spune că va chema 112, dacă se mai fac „chiolhanuri” în Grădiniță, cu băuturi și șprițuri și-i spune primarului că nu are ce căuta acolo. Fac polemică...

Secretarul general al comunei spune că dnul primar a decis să pună la dispoziția consilierilor un calculator în sala de ședință, pentru a se vedea Proiectele de hotărâri care au un volum mare de hârtie. Dnul primar cere consilierilor să voteze dacă sunt de acord să vadă online proiectele atașate la proiectele de hotărâri(cele care au un volum mare de pagini). Votează pentru 11 consilieri locali și sunt împotrivă dnii Radu, Nunu, Roșca și Chiriță. Dnul Nunu spune că nu vrea și că nu poate decide Consiliul Local să poată fi transmise doar online. Dnul Radu cere să se consemneze că la propunerea secretarului comunei nu se vor mai trimite materialele letric, ci doar online. Vrea să vadă dacă are voie să facă asta? Domnul primar spune că el a propus, secretarul i-a informat. Secretarul general al comunei spune că regulile le fac majoritatea dnilor consilieri. A pus la dispoziția dnilor consilieri o adresă de email, cu user și parolă ce poate fi accesată de orice consilier. Dnul Radu spune că a mai fost odată votat să fie transmise și letric. Dnul Nunu spune că se face cum spune în Codul administrativ, așa este și la Parlament? S-a aruncat un laptop în sala de ședințe și toți parlamentarii se uită pe el? Secretarul spune că ei sunt 15 din care 11 au votat să fie afișate online și ceilalți patru pot veni să le studieze la sala de ședințe. Dnul Radu spune că propune si el să nu mai ia consilierii indemnizația. Cine o aprobă? Secretarul general îi răspunde că poate propune, dacă este adoptată cu majoritate este bine venită. Regulile Consiliului Local le face majoritatea, conform legii.

Nu mai sunt înscrieri la cuvânt. Dl președinte declară ședința închisă.

Conținutul procesului-verbal se completează cu cele ale proiectelor de hotărâre prezentate și adoptate, precum și cu pontajul privind participarea la ședință a consilierilor locali.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CORNEL MICU.**

**SECRETAR GENERAL al COMUNEI COSMEȘTI,
CRISTINA ZAHARIA**

**Cristina
Zaharia**

Semnat digital de
Cristina Zaharia
Data: 2022.08.30
22:06:36 +03'00'



ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
COMUNA COSMEȘTI
PRIMAR

CF: 3655943; Str. G-ral Dumitru Dămăceanu, nr.73, sat Cosmești, com. Cosmești, jud. Galați, CP: 807085;
e-mail: cosmesti@gle-adm.ro; primaria.cosmesti@gmail.com; Web-site: www.primaria-cosmesti.ro; Tel. 0236336227; Fax 0236336218

Nr. 7232/02.09.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Privind: aprobarea prelungirii Scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN- SA pentru proiectul finanțat prin Masura 19.2 Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală al Comunei Cosmești "AMENAJARE TEREN DE SPORT SAT FURCENII NOI, COMUNA COSMEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI"

Inițiator: primarul comunei Cosmești, jud. Galați- ing. Ion Tuchiluş;

Nr. și data proiectului de hotărâre: 7232/02.09.2022

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

- art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
- art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
- art.44 alin.1 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și ale HGR nr.28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economică aferentă investițiilor publice precum și al structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiții și lucrări de intervenții;
- prevederile art. 1) alin. (1) și alin. (2), și art. 3) din O.U.G. nr. 79/2009 reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.262/2009;
- prevederile art. 2) și cele ale art. 4) alin. (5) din contractul de finanțare nerambursabilă nr. C1920074A204021802384 din data de 07.03.2019 încheiat între Comuna Cosmești și CRFIR 2 Sud Est Constanța;
- art. 84 și art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. b), din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

Luând act de:

- HCL nr. 66/2017, HCL nr. 67/2017 și HCL nr. 65/2019, HCL 75/2021 și HCL 20/2022 privind implementarea Proiectului și aprobarea Scrisorii de garanție pentru Proiect;
- Notificarea FN/01.09.2022, înregistrată sub nr.7209/02.09.2022 din partea firmei de consultanță EUROMIS HR Galați și Notificarea AFIR FN înregistrată sub nr. 7154/01.09.2022;
- Proiectul de hotărâre și referatul de aprobare prezentate de către primarul Tuchiluş Ion, în calitatea sa de inițiator, înregistrate cu nr. 7232/02.09.2022, respectiv 7233/02.09.2022;
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr. 7316/05.09.2022, prin care se motivează, în drept și în fapt, necesitatea și oportunitatea proiectului de hotărâre;
- raportul comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului Local Cosmești,
- În temeiul prevederilor art. 139, alin. (3) și cele al art. 196, alin. (1) lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COSMEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI, întrunit în ședința extraordinară în data de, HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă prelungirea Scrisorii de garanție din partea FGCR IFN SA București nr. IG193300385/ 09.12.2019 pentru proiectul integrat finanțat prin masura 19.2 al comunei Cosmești "AMENAJARE TEREN DE SPORT SAT FURCENII NOI, COMUNA COSMEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI", până la data de 07.06.2023, conform anexei la prezenta și parte intergrantă din ea.

Art.2. Se aprobă plata integrală a comisionului de garantare în valoare de 874,58 lei către Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN SA pentru acordarea prelungirii Scrisorii de Garantare, pentru perioada de valabilitate a Scrisorii de Garantare.

Art.3. Se împuternicește primarul Comunei Cosmești, jud. Galați, ing. Ion Tuchiluş, pentru efectuarea tuturor demersurilor legale necesare punerii în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4. Prezenta va fi transmisă Instituției Prefectului Galați, primarului, Biroului financiar-contabil, altor instituții interesate și va fi făcută publică prin afișare și publicare pe pagina web a Comunei Cosmești prin grija secretarului general al comunei.

Primar, ing. Ion Tuchiluş

CERERE
de prelungire a valabilității scrisorii de garanție

1. Comuna COSMESTI, având următoarele date de identificare: CUI 3655943, sediul în localitatea Cosmesti, str. G-ral Dumitru Dămăceanu, nr. 73., județul Galați, telefon 0236336227, fax 0236-336218, e-mail: cosmesti@gl.e-adm.ro.

2. Reprezentanții legali:

Nr. crt.	Numele și prenumele	Funcția	Actul de numire sau de împuternicire	CI, seria și nr.	Codul numeric personal
1	TUCHILUȘ ION	PRIMAR	Incheiere în Camera de Consiliu a Judecatoriei Tecuci în dosarul nr. 4235/324/2020	ZL 002732	1550331173161

vă rugăm să aprobați prelungirea valabilității Scrisorii de garanție nr. IG193300385/ 09.12.2019, până la data de 07.06.2023 inclusiv.

3. Data-limită de executare a proiectului conform contractului este 07.12.2022.

4. Valoarea scrisorii de garanție este de 291.524,71 lei, reprezentând 100% din valoarea avansului în sumă de 291.524,71 lei.

5. Valabilitatea inițială a scrisorii de garanție este 07.12.2022 inclusiv.

6. Numărul de luni de valabilitate pentru care se solicită prelungire este de 6 luni.

7. Valabilitatea propusă a scrisorii de garanție este 07.06.2023 inclusiv.

8. Comisionul de garantare aferent prelungirii Scrisorii de garanție nr. IG193300385/ 09.12.2019 este în sumă totală de 874,58 lei, din care s-a achitat integral suma de 874,58 lei, conform OP anexat (în copie), conform prevederilor art. 7 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2009, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările și completările ulterioare.

9. Beneficiarul scrisorii de garanție: Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), cod fiscal: 13533790, localitatea: municipiul București, str. Știrbei Vodă nr. 43, sectorul 1, telefon: 021-402.27.50, fax: 021-315.67.79.

10. Beneficiarul declară și garantează fondului de garantare că la data prezentei cereri:

10.1. nu au fost inițiate și nu sunt în curs proceduri judiciare, poprii (asupra conturilor sale deschise la trezorerie, în care încasează veniturile proprii, și/sau asupra conturilor sale deschise la instituțiile de credit) împotriva sa care pot afecta capacitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin contractul de finanțare nerambursabilă încheiat cu AFIR;

10.2. viza de control financiar preventiv, în cazul beneficiarilor publici, aplicată pe prezenta cerere de către conducătorul compartimentului desemnat potrivit legii și regulamentelor interne să exercite controlul financiar preventiv la nivelul beneficiarului atestă fără rezerve că toate condițiile prealabile, necesare pentru semnarea solicitării și a acordului de garantare, au fost îndeplinite.

11. La prezenta solicitare se anexează următoarele documente însoțite de un opis:

11.1. hotărârea de aprobare a beneficiarului privind solicitarea prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului de garantare (în copie);

11.2. nota explicativă înregistrată la AFIR prin care beneficiarul solicită aprobarea prelungirii duratei de execuție a contractului de finanțare prin act adițional și răspunsul AFIR;

11.3. ultimul act adițional încheiat între autoritatea contractantă și beneficiar, în baza căruia sunt modificate și completate prevederile contractului de finanțare;

11.4. acordurile de garantare, ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 1 și 11 la normele metodologice;

11.5. copie de pe actele de identitate (BI/CI) ale reprezentanților legali;

11.6. copie de pe hotărârea instanței judecătorești de numire a reprezentanților legali, după caz;

11.7. În cazul în care biletul la ordin nu acoperă perioada solicitată pentru prelungire, pentru GAL/OUAI/FOUAI, emiterea unui nou bilet la ordin stipulat fără protest cu scadența la vedere, de valoare egală cu suma garantată, emis de GAL/OUAI/FOUAI, avalizat de reprezentantul legal, în favoarea fondurilor de garantare, de valoare egală cu valoarea scrisorii de garanție.

Prin prezenta cerere de prelungire a valabilității Scrisorii de garanție nr. IG193300385/ 09.12.2019, subsemnatul Tuchilus Ion, în calitate de reprezentant legal al comunei Cosmesti, județul Galați, numit în baza sentinței civile nr. 4235/324/2020, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale cu privire la pedepsirea pentru fals în înscrisuri oficiale și în declarații, că mă oblig să respect prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a emiterii de către Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN SA a scrisorii de garanție pentru restituirea avansului.

Data semnării

Primar Tuchilus Ion,

Data semnării

Responsabil economic, șef birou financiar contabil
Ec. Eugen Floroiu





ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
COMUNA COSMEȘTI
PRIMAR

CF: 3655943; Str. G-ral Dumitru Dămăceanu, nr.73, sat Cosmești, com. Cosmești, jud. Galați, CP: 807085;
e-mail: cosmesti@e-adm.ro; primaria.cosmesti@gmail.com; Web-site: www.primaria-cosmesti.ro; Tel. 0236336227; Fax 0236336218

Nr. 7233/02.09.2022

REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotărâre privind: aprobarea prelungirii Scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN– SA pentru proiectul finanțat prin Masura 19.2 Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală al Comunei Cosmești "AMENAJARE TEREN DE SPORT SAT FURCENII NOI, COMUNA COSMEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI"

Domnilor consilieri, după cum știți în anul 2017 prin HCL 66/12.12.2017 privind aprobarea implementării proiectului „AMENAJARE TEREN DE SPORT, SAT FURCENII NOI, COMUNA COSMEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI” și ulterior prin HCL 67/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice aferentă obiectivului de investiții „AMENAJARE TEREN DE SPORT, SAT FURCENII NOI, COMUNA COSMEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI”, Consiliul Local Cosmești și-a dat acordul pentru demararea implementării acestui proiect de investiție pentru satul Furceni Noi. Efectuarea studiilor și obținerea avizelor necesare implementării acestui proiect s-au derulat pe parcursul anului 2018, fiind în final depus la AFIR Constanța și aprobat pentru finanțare conform Contractului C1920074A204021802384 din data de 07.03.2019 încheiat între Comuna Cosmești și CRFIR 2 Sud Est Constanța.

După verificarea documentației depuse și aprobarea valorii care se poate deconta din valoarea proiectului, au fost identificate sumele eligibile care se vor deconta și valoarea sumelor neeligibile, care se vor finanța din bugetul local.

De asemenea, conform Contractului de finanțare, s-a solicitat un avans de finanțare a lucrării, în valoare de 291.524,71 lei pentru care s-a aprobat în anul 2019 solicitarea unei scrisori de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural-IFN SA București. Datorită faptului că s-au prorogat termenele de finalizare ale Proiectului, mai ales din cauza pandemiei, a apărut necesitatea de a prelungi termenele de execuție și implicit termenele de finanțare și de colaborare cu AFIR. Una dintre obligații este și aceea de a prelungi și scrisoarea de garanție din partea FGCR IFN SA București nr. IG193300385/ 09.12.2019 pentru proiectul integrat finanțat prin masura 19.2 al comunei Cosmești "AMENAJARE TEREN DE SPORT SAT FURCENII NOI, COMUNA COSMEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI", aprobată de Consiliul Local Cosmești prin HCL nr. 65/2019, prelungită prin HCL 75/2021 și HCL nr. 20/2022, care trebuie iar prelungită, fiind lucrarea încă în curs.

Aprobarea cheltuielilor publice este de competența Consiliului Local, la propunerea ordonatorului de credite.

Aprobarea documentațiilor de dezvoltare a comunei sunt de competența Consiliului local conform prevederilor OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, art. 129, alin(4), lit. d): „ d) aprobă, la propunerea primarului, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local, în condițiile legii; și a art. 44, alin.(1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale: „ Aprobarea proiectelor de investiții publice locale

(1) Documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum și ale celor finanțate din împrumuturi interne și externe, contractate direct sau garantate de autoritățile administrației publice locale, se aprobă de către autoritățile deliberative.”

Prin acest referat de aprobare, solicit avizul Biroului financiar contabil prin efectuarea Raportului de specialitate, azi și propun spre avizare comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului local Cosmești, fiind un proiect cu incidență în bugetul comunei, de competența acestei comisii.

Este de competența Consiliului Local de a studia și aproba în plen, proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN– SA pentru proiectul finanțat prin Masura 19.2 Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală al Comunei Cosmești "AMENAJARE TEREN DE SPORT SAT FURCENII NOI, COMUNA COSMEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI"

PRIMAR,

Ing. Ion Tuciș





ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
COMUNA COSMEȘTI
Biroul financiar contabil

CF: 3655943; Str. G-ral Dumitru Dămăceanu, nr.73, sat Cosmești, com. Cosmești, jud. Galați, CP: 807085;
e-mail: cosmesti@gl.e-adm.ro; primaria.cosmesti@gmail.com ; Web-site: www.primaria-cosmesti.ro; Tel. 0236336227; Fax 0236336218

Nr. 7316/05.09.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de hotărâre privind: aprobarea prelungirii Scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN- SA pentru proiectul finanțat prin Masura 19.2 Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală al Comunei Cosmești "AMENAJARE TEREN DE SPORT SAT FURCENII NOI, COMUNA COSMEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI"

Prezentul raport de specialitate este întocmit în conformitate cu prevederile art. 136, alin.(4) și alin.(8) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

- Proiectul de hotărâre inițiat de d-l ing. Tuchiluş Ion, primarul comunei Cosmești, este bine justificat și corect încadrat juridic : art. 129, alin. (2) lit. b) și alin (4), lit. d), din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
- se respecta prevederile art.44 alin.1 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare si ale HCL nr.12/2019 privind aprobarea și utilizarea excedentului bugetului local al comunei Cosmești pe anul 2019.
- proiectul este legal, oportun și necesar, el fiind aprobat pentru finanțare de către CRFIR Constanța Sud-Est conform Contractului C1920074A204021802384 din data de 07.03.2019, dar se va prelungi executarea lui până la 31.12.2022.
- Nu este nevoie sa precizăm ca amenajarea unor spații propice desfășurării sportului de masă, asigură accesul locuitorilor satului Furcenii Noi și chiar a comunei, la practicarea unor sporturi benefice sănătății umane, dar mai ales se creează o bază materială utilă copiilor de la Școala din sat. In plus cheltuielile aferente Proiectului sunt prevăzute în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției, potrivit legii, iar Autoritățile administrației publice locale și-au asumat deja obligația de a asigura veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului.

Este de competența Consiliului Local al comunei Cosmești județul Galați, în conformitate cu prevederile art. 129 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, ca în ședință să adopte Hotărârea privind aprobarea prelungirii Scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN- SA pentru proiectul finanțat prin Masura 19.2 Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală al Comunei Cosmești "AMENAJARE TEREN DE SPORT SAT FURCENII NOI, COMUNA COSMEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI"

Biroul Financiar Contabil
Consilier superior,
Ec. Cristina Briceag

EUROMIS HR GALATI

SOCIETATE DE PROIECTARE
CONSULTANȚĂ
SI ASISTENȚĂ TEHNICĂ

STR. IULIENEI NR. 1, CLADIREA 6, BIROU 6, SPATIUL 2, LOC.
GALATI /UD. GALATI, RO 21473591, 117/217/2016
RO28TREZ3065089XXX015553, Trezoreria Galati
RO53BACX00000001262243000, UNICREDIT BANK
TEL: 0746070449

Data 01.09.2022

Handwritten notes: "Danut", "04.09.2022", and a signature.

NOTIFICARE PRELUNGIRE SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA

Handwritten: 7209, 22, 09, 02

Prin prezenta, in calitate de consultant, va aducem la cunostinta faptul ca pentru proiectul „AMENAJARE TEREN DE SPORT SAT FURCENII NOI, COMUNA COSMESTI, JUDETUL GALATI trebuie prelungita scrisoarea de garantie bancara .

Conform procedurilor privind implementarea proiectelor prin Fonduri Europene, autoritatea contractanta va depune ultimul desar de plata cu 90 zile inainte sa expire contractul de finantare.

Avand in vedere ca termenul de depunere expira in 07.09.2022, este necesara prelungirea duratei de implementare a acestuia. Deasemenea , tinand cont ca beneficiarul a solicitat si a primit o suma de bani in avans , pentru care s-a emis scrisoarea de garantie bancara nr. IG193300385/ 09.12.2019, in momentul de fata este necesara si prelungirea acesteia .

Drept urmare, va rugam sa aveti in vedere emiterea documentelor necesare prelungirii scrisorii de garantie bancara.

Consultant
Hulea Danut

Handwritten signature of Hulea Danut

Stimate beneficiar,

Va informam pe aceasta cale ca la data de 31.08.2022 a expirat termenul de depunere TRANSA FINALA DE PLATA in valoare de 708.821,10 lei, aprobata in data de 04.04.2022, aferenta proiectului dumneavoastra nr. C 1920074A204021802384 / 07.03.2019, termen stipulat in Declaratia de esalonare nr. 208/04.04.2022.

Mai puteti depune dosarul cererii de plata tranşa 2-FINALA in termen de maxim 15 zile lucratoare de la data primirii emailului dar fara a depasi termenul de executie conform contract de finantare si Act aditional nr. 2/26.03.2022, respectiv data de 07.09.2022

Va rog sa confirmati de primire

Cu stima,

22 09 01 154

Consilier IA SLIN-CI

IONICA POPA

Agentia pentru Finantarea Investițiilor Rurale

Oficiul Județean pentru Finantarea Investițiilor Rurale Galați

Tel.: 0336 860 276

E-mail: ionica.popa@afir.info


Web www.afir.info



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE

Str. Știrbei Vodă, nr. 43, Sector 1, București
Telefon: 031-860.27.47
Web: www.afir.info

Împreună creștem satul românesc.



Gândește-te dacă ai nevoie cu adevărat să primești acest e-mail! Poți să protejezi mediul înconjurător și prin folosirea rațională a hârtiei.

AFIR vă pune la dispoziție în mod gratuit aplicația pentru telefonul mobil denumită Catalogul Produselor Alimentare Certificate (CPAC) cu care puteți accesa informațiile MADR cu privire la produsele agroalimentare înregistrate pe scheme naționale și europene de calitate.

Descărcați aplicația CPAC pentru a vă conecta instantaneu cu producătorii locali - fără intermediari!





ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COSMEȘTI



CF: 3655943; Str. G-ral Dumitru Dămăceanu, nr.73, sat Cosmești, com. Cosmești, jud. Galați, CP: 807085;
e-mail: cosmesti@l.e-adm.ro; primaria.cosmesti@gmail.com; Web-site: www.primaria-cosmesti.ro; TEL 0236336227; FAX 0236336218

HOTĂRÂREA nr. 20

Din 28.02.2022

Privind: **aprobarea prelungirii Scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN- SA pentru proiectul finanțat prin Masura 19.2 Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală al Comunei Cosmești "AMENAJARE TEREN DE SPORT SAT FURCENII NOI, COMUNA COSMEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI"**

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

- art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
- art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
- art.44 alin.1 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și ale HGR nr.28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economică aferentă investițiilor publice precum și al structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiții și lucrări de intervenții;
- prevederile art. 1) alin. (1) și alin. (2), și art. 3) din O.U.G. nr. 79/2009 reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.262/2009;
- prevederile art. 2) și cele ale art. 4) alin. (5) din contractul de finanțare nerambursabilă nr. C1920074A204021802384 din data de 07.03.2019 încheiat între Comuna Cosmești și CRFIR 2 Sud Est Constanța;
- art. 84 și art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. b), din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

Luând act de:

- HCL nr. 66/2017, HCL nr. 67/2017 și HCL nr. 65/2019, HCL 75/2021 privind implementarea Proiectului și aprobarea Scrisorii de garanție pentru Proiect;
- Notificarea FN/24.02.2022, înregistrată sub nr.1533/24.02.2022 din partea firmei de consultanță EUROMIS HR Galați
- Proiectul de hotărâre și referatul de aprobare prezentate de către primarul Tuchiluş Ion, în calitate sa de inițiator, înregistrate cu nr. 1534/24.02.2022, respectiv 1535/24.02.2022;
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr. 1536/24.02.2022, prin care se motivează, în drept și în fapt, necesitatea și oportunitatea proiectului de hotărâre;
- raportul comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului Local Cosmești,
- În temeiul prevederilor art. 139, alin. (3) și cele al art. 196, alin. (1) lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COSMEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI, întrunit în ședința extraordinară în data de 28.02.2022, HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă prelungirea Scrisorii de garanție din partea FGCR IFN SA București nr. IG193300385/ 09.12.2019 pentru proiectul integrat finanțat prin masura 19.2 al comunei Cosmești "AMENAJARE TEREN DE SPORT SAT FURCENII NOI, COMUNA COSMEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI", până la data de 07.12.2022, conform anexei la prezenta și parte intergrantă din ea.

Art.2. Se aprobă plata integrală a comisionului de garantare în valoare de 874,58 lei către Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN SA pentru acordarea prelungirii Scrisorii de Garantare, pentru perioada de valabilitate a Scrisorii de Garantare.

Art.3. Se împuternicește primarul Comunei Cosmești, jud. Galați, ing. Ion Tuchiluş, pentru efectuarea tuturor demersurilor legale necesare punerii în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4. Prezenta va fi transmisă Instituției Prefectului Galați, primarului, Biroului financiar-contabil, altor instituții interesate și va fi făcută publică prin afișare și publicare pe pagina web a Comunei Cosmești prin grija secretarului general al comunei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,



Contrasemnează,
Secretar general al comunei, CRISTINA ZAHARIA

Consilieri prezenți =14; Consilieri „pentru” = 14; Consilieri” contra” =0.

CERERE

- de prelungire a valabilității scrisorii de garanție
1. Comuna COSMESTI, având următoarele date de identificare: CUI 3655943, sediul în localitatea Cosmesti, str. Gral Dumitru Dămăceanu, nr. 73, județul Galați, telefon 0236336227, fax 0236-336218, e-mail: cosmesti@gl.e-adm.ro.
2. Reprezentanții legali:

Nr. crt.	Numele și prenumele	Funcția	Actul de numire sau de împuternicire	BI/CI, seria și nr.	Codul numeric personal
1	TUCHILUȘ ION	PRIMAR	Încheiere în Camera de Consiliu a Judecatoriei Tecuci în dosarul nr 4235/324/2020		

vă rugăm să aprobați prelungirea valabilității Scrisorii de garanție nr. IG193300385/ 09.12.2019, până la data de 07.12.2022 inclusiv.

3. Data-limită de executare a proiectului conform contractului este 07.03.2022.
4. Valoarea scrisorii de garanție este de 291.524,71 lei, reprezentând 100% din valoarea avansului în sumă de 291.524,71 lei.
5. Valabilitatea inițială a scrisorii de garanție este 07.03.2022 inclusiv.
6. Numărul de luni de valabilitate pentru care se solicită prelungire este de 6 luni.
7. Valabilitatea propusă a scrisorii de garanție este 07.12.2022 inclusiv.
8. Comisionul de garantare aferent prelungirii Scrisorii de garanție nr. IG193300385/ 09.12.2019 este în sumă totală de 874,58 lei, din care s-a achitat integral suma de 874,58 lei, conform OP anexat (în copie), conform prevederilor art. 7 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2009, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările și completările ulterioare.
9. Beneficiarul scrisorii de garanție: Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), cod fiscal: 13533790, localitatea: municipiul București, str. Știrbei Vodă nr. 43, sectorul 1, telefon: 021-402.27.50, fax: 021-315.67.79.
10. Beneficiarul declară și garantează fondului de garantare că la data prezentei cereri:
- 10.1. nu au fost inițiate și nu sunt în curs proceduri judiciare, popriri (asupra conturilor sale deschise la trezorerie, în care încasează veniturile proprii, și/sau asupra conturilor sale deschise la instituțiile de credit) împotriva sa care pot afecta capacitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin contractul de finanțare nerambursabilă încheiat cu AFIR;
- 10.2. viza de control financiar preventiv, în cazul beneficiarilor publici, aplicată pe prezenta cerere de către conducătorul compartimentului desemnat potrivit legii și regulamentelor interne să exercite controlul financiar preventiv la nivelul beneficiarului atestă fără rezerve că toate condițiile prealabile, necesare pentru semnarea solicitării și a acordului de garantare, au fost îndeplinite.
11. La prezenta solicitare se anexează următoarele documente însoțite de un opis:
- 11.1. hotărârea de aprobare a beneficiarului privind solicitarea prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului de garantare (în copie);
- 11.2. nota explicativă înregistrată la AFIR prin care beneficiarul solicită aprobarea prelungirii duratei de execuție a contractului de finanțare prin act adițional și răspunsul AFIR;
- 11.3. ultimul act adițional încheiat între autoritatea contractantă și beneficiar, în baza căruia sunt modificate și completate prevederile contractului de finanțare;
- 11.4. acordurile de garantare, ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 1 și 11 la normele metodologice;
- 11.5. copie de pe actele de identitate (BI/CI) ale reprezentanților legali;
- 11.6. copie de pe hotărârea instanței judecătorești de numire a reprezentanților legali, după caz;
- 11.7. În cazul în care biletul la ordin nu acoperă perioada solicitată pentru prelungire, pentru GAL/OUAI/FOUAI, emiterea unui nou bilet la ordin stipulat fără protest cu scadența la vedere, de valoare egală cu suma garantată, emis de GAL/OUAI/FOUAI, avalizat de reprezentantul legal, în favoarea fondurilor de garantare, de valoare egală cu valoarea scrisorii de garanție.
- Prin prezenta cerere de prelungire a valabilității Scrisorii de garanție nr. IG193300385/ 09.12.2019, subsemnatul Tuchilus Ion, în calitate de reprezentant legal al comunei Cosmesti, județul Galați, numit în baza sentinței civile nr. 4235/324/2020, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale cu privire la pedepsirea pentru fals în înscrisuri oficiale și în declarații, că mă oblig să respect prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a emiterii de către Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN SA a scrisorii de garanție pentru restituirea avansului.

Comuna Cosmesti, județul Galați

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ,

Ljonte Radu



Contrasemnează,
Secretar general al comunei
Cristina Zaharia



ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
COMUNA COSMEȘTI
PRIMAR



Str. G-ral Dumitru Dămăceanu, nr. 73, COSMEȘTI, cod postal 807085; jud. Galați; tel.: 0236336227;

Fax: 0236336218; CUI 3655943; e-mail: cosmesti@el.e-adm.ro; Web-site: www.primaria-cosmesti.ro

Nr. 7094/30.08.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Privind: ***Aprobarea Documentației Tehnice, faza SF pentru obiectivul „Construire monument închinat eroilor din comuna Cosmești, județul Galați”.***

Inițiator: ing. Tuchiluş Ion, primarul comunei Cosmești, județul Galați;

Numărul de înregistrare și data depunerii proiectului de hotărâre: 7094/30.08.2022.

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

- art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
- art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
- art. 10, art. 13, 84, alin. (5), art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare;
- art. 44 alin. 1 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și ale HGR nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economică aferentă investițiilor publice precum și al structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiții și lucrări de intervenții;
- HCL nr. 21/28.02.2022 privind ***Aprobarea Notei Conceptuale și realizării unui Monument de for public „Monument închinat eroilor din comuna Cosmești, județul Galați”.***
- HCL 8/2022 privind aprobarea bugetului local al comunei Cosmești pe anul 2022;

Luând act de:

- Referatul de necesitate nr. 7083/30.08.2022;
 - Proiectul de hotărâre și referatul de aprobare prezentate de către primarul Tuchiluş Ion, în calitate sa de inițiator, înregistrate cu nr. 7094/30.08.2022, respectiv 7095/30.08.2022;
 - raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr. 7284/05.09.2022, prin care se motivează, în drept și în fapt, necesitatea și oportunitatea proiectului;
 - raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Cosmești,
- În temeiul prevederilor art. 139, alin. (3), lit. a) și g) și art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare,**

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COSMEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI, întrunit în ședința extraordinară în data de HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă ***Documentației Tehnice, faza SF pentru obiectivul „Construire monument închinat eroilor din comuna Cosmești, județul Galați”,*** în vederea continuării demersurilor pentru realizarea proiectului propus.

Art.2. Prezenta Hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primarul comunei Cosmești, prin aparatul de specialitate.

Art.3. Prezenta va fi adusă la cunoștința Instituției Prefectului Galați, primarului, Biroului financiar-contabil și va fi făcută publică prin afișare și publicare pe pagina web a Comunei Cosmești prin grija secretarului general al comunei.

Primar, ing. Ion Tuchiluş



Anexa la Proiectul nr. 7094/2022

DOCUMENTATIE TEHNICA
FAZA:
STUDIU DE FEZABILITATE

NUMAR PROIECT:

266

S. F.

AMPLASAMENT:

**JUD. GALAȚI, COM. COSMEȘTI, STR.
MAGNOLIEI, NR 27, NR CAD. 1071⁸⁴, C.F.**

OBIECTIV:

**CONSTRUIRE MONUMENT EROI ÎN
LOCALITATEA COSMEȘTI, COMUNA COSMEȘTI,
JUDEȚUL GALAȚI**

BENEFICIAR:

COMUNA COSMEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI

ADRESA BENEFICIAR:

**STR. GENERAL DUMITRU DĂMĂCEANU, NR.
73, LOCALITATEA COSMEȘTI, COMUNA
COSMEȘTI, JUD. GALAȚI, COD POSTAL 807085**

PROIECT NR:

266

DATA REALIZĂRII
DOCUMENTAȚIEI:

AUGUST 2022




PREZENTUL DOCUMENT ESTE COPIA ORIGINALULUI SAU AL CARUI AUTOR ESTE PRO ARHIMED S.R.L. UTILIZAREA SA TOTALA SAU PARTIALA, ASA CA SI ORICE REPRODUCERE SAU
CEDARE CATRE TERȚI, VA NECESITA O AUTORIZARE ANTERIOARA EXPRESA DIN PARTEA AUT. ASTEL FIIND INTERZISA ORICE MODIFICARE UNILATERALA A ACESTUIA.

Autor:

PRO ARHIMED S.R.L.

ARH. DIMA GEORGIAN MIRCEA - TNA 6724





PRO-ARHIMED S.R.L.

CIF: 31086762; J40/1006/2016; TEL: 0720538138; arhimd@yahoo.ro

LISTA SI SEMNĂTURILE PROIECTANTILOR:

PROIECT NUMĂR: 266

DENUMIRE
PROIECT: **CONSTRUIRE MONUMENT EROI IN LOCALITATEA
COSMESTI, COMUNA COSMEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI**

FAZA: **STUDIU DE FEZABILITATE**

BENEFICIAR: **COMUNA COSMEȘTI**

AMPLASAMNET: **JUD. GALATI, COM. COSMEȘTI, STR. MAGNOLIEI,
NR 27, NR CAD. 107184, C.F.**

PROIECTANT
GENERAL: **PRO ARHIMED S.R.L.**




PROIECTANTI DE SPECIALITATE:

ARHITECTURĂ: **PRO ARHIMED S.R.L.**
Arh. DIMA GEORGIAN MIRCEA
Sef proiect- TNA 6724

REZISTENȚA: **ȘUȘMAN CONSTRUCT S.R.L.**
Ing. Șușman Sebastian
Ing. Dr. Andrei Constantinescu

INSTALATII: **TRIAXIS DESIGN S.R.L.**
Ing. Sorin Secară



Adresăm mulțumiri doctorandului în istorie, dl. Paul Aelenei, fiu al localității, pentru datele furnizate despre istoria zonei comunei Cosmești.



PRO-ARHIMED S.R.L.

CIF.31086762; J40/1006/2016; TEL: 0720538138; arhimd@yahoo.ro

B O R D E R O U

A. PIESE SCRISE

CAPITOLUL 1. DATE GENERALE

- 1.1 Denumirea obiectivului de investiții;
- 1.2 Amplasamentul (județul, localitatea, strada, numărul);
- 1.3 Beneficiarul investiției;
- 1.4 Titularul investiției;
- 1.5 Codul de identificare al proiectului la proiectant;
- 1.6 Elaboratorul studiului.

CAPITOLUL 2. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

- 2.1 Situația actuală și informații despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului;
- 2.2 Descrierea investiției:
 - a) Necesitatea și oportunitatea promovării investiției (justificarea reactualizării studiului),
 - b) Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiții pot fi atinse:
 - scenariul recomandat de către elaborator;
 - avantajele scenariului recomandat;
 - c) Descrierea constructivă, funcțională;
- 2.3 Date tehnice ale investiției:
 - a) Zona și amplasamentul;
 - b) Statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat;
 - c) Situația ocupărilor definitive de teren: suprafața totală, reprezentând terenuri din
 - intravilan /extravilan;
 - d) Studii de teren;
 - e) Caracteristicile principale ale construcțiilor din cadrul obiectivului de investiții;
 - f) Situația existentă a utilităților și analiza de consum;
 - g) Concluziile evaluării impactului asupra mediului
- 2.4 Durata de realizare și etapele principale, graficul de realizare a investiției.

CAPITOLUL 3. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI

- 3.1 Valoarea totală cu detalierea pe structură a devizului general;
- 3.2 Eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției.





PRO-ARHIMED S.R.L.

CIF. 31086762; J40/1006/2016; TEL: 0720538138; arhimed@yahoo.ro

CAPITOLUL 4. ANALIZA COST-BENEFICIU

- 4.1 Identificarea investiției și definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referință;
- 4.2 Analiza opțiunilor;
- 4.3 Analiza financiară;
- 4.4 Analiza economică;
- 4.5 Analiza de senzitivitate.
- 4.6 Analiza de risc.

CAPITOLUL 5. SURSELE DE FINANȚARE ALE INVESTIȚIEI

CAPITOLUL 6. ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI

- 6.1 Număr de locuri de muncă create în faza de execuție;
- 6.2 Număr de locuri de muncă create în faza de operare.

CAPITOLUL 7. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ALE INVESTIȚIEI

- 7.1 Valoarea totală a investiției;
- 7.2 Eșalonarea investiției;
- 7.3 Durata de realizare;
- 7.4 Capacități
- 7.5 Antemăsurătoare

CAPITOLUL 8. AVIZE ȘI ACORDURI DE PRINCIPIU

- 8.1 Avizul beneficiarului de investiție privind necesitatea și oportunitatea investiției;
- 8.2 Certificatul de urbanism;
- 8.3 Avize de principiu privind asigurarea utilităților;
- 8.4 Acordul de mediu.





PRO-ARHIMED S.R.L.

CIF: 31086762; J40/1006/2016; TEL: 0720538138; arhimd@yahoo.ro

B. PIESE DESENATE

1) ARHITECTURA - PLANURI GENERALE SI DETALII

- A01 - Plan amplasament
- A02 - Plan de situație
- A03 - Plan general
- A04 - Desfășurata A- A'
- A05 - Desfășurata B- B'
- A06 - Desfășuratele C-C' / D- D'
- A07 - Obelisc- cruce
- A08 - Panouri informative
- A09 - Împrejmuire laterală și posterioară
- A10 - Balustrada



1.1 ARHITECTURA- RANDĂRI

2) REZISTENTA

- Memoriu tehnic. Piloți, perete de sprijin
- R01 - Detalii armare pilot
- R02 - Sprijinire mal H=13m
- R03- Plan armare și detalii de execuție
- Memoriu tehnic, Platforma
- R04- Plan rosturi platformă
- R05- Model profil transversal, detalii rosturi și rigolă de scurgere
- R06- Plan armare monument
- R07- Armare monument transversal
- R08- Secțiune 2-2; 3-3.
- R09- Secțiune 1-1 și detalii
- R10- Cuzinet steag

3) INSTALAȚII ELECTRICE

- Memoriu tehnic
- IE01 - Instalații electrice, Instalații de iluminat/ aparataj
- IE02 - Instalații electrice, Schemă monofilară TGB
- IE03 - Instalații electrice, Detaliu priză pământ C2



PRO-ARHIMED S.R.L.

CIF.31088782; J40/1006/2016; TEL.: 0720538138; arhimed@yahoo.ro

DOCUMENTATIE TEHNIC FAZA: STUDIU DE FEZABILITATE MEMORIU TEHNIC

NUMAR PROIECT:

266

S. F.

AMPLASAMENT:

JUD. GALAȚI, COM. COSMEȘTI, STR.
MAGNOLIEL, NR 27, NR CAD. 107187, C.F. 107159

OBIECTIV:

CONSTRUIRE MONUMENT EROI ÎN
LOCALITATEA COSMEȘTI, COMUNA COSMEȘTI,
JUDEȚUL GALAȚI

BENEFICIAR:

COMUNA COSMEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI

ADRESA BENEFICIAR:

STR. GENERAL DUMITRU DĂMĂCEANU, NR. 73,
LOCALITATEA COSMEȘTI, COMUNA COSMEȘTI,
JUD. GALAȚI, COD POSTAL 807085

PROIECT NR:

266

DATA REALIZĂRII
DOCUMENTAȚIEI:

AUGUST 2022



PREZENTUL DOCUMENT ESTE COPIA ORIGINALULUI SAU AL CĂRUI AUTOR ESTE PRO ARHIMED S.R.L. UTILIZAREA SA TOTALA SAU PARȚIALĂ, ASA CA ȘI ORICE REPRODUCERE SAU CEDARE CĂTRE TERȚI, VA NECESITA O AUTORIZARE ANTERIOARA EXPRESA DIN PARTEA AUTORILOR SAU, ASTFEL FIIND INTERZISA ORICE MODIFICARE UNILATERALA A ACESTUIA.

Autor:

PRO ARHIMED S.R.L.

ARH. DIMA GEORGIANA-MIRCEA - INA 6724



266 - S.F. - "CONSTRUIRE MONUMENT EROI ÎN LOCALITATEA COSMEȘTI, COMUNA COSMEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI"

Pagina 6 din 84



PRO-ARHIMED S.R.L.

CIF.31086762; J40/1006/2016; TEL: 0720538138; arhimd@yahoo.ro

CAPITOLUL 1. DATE GENERALE

1.1. Denumirea obiectivului investitiei

CONSTRUIRE MONUMENT EROI ÎN LOCALITATEA COSMEȘTI, COMUNA
COSMEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI

1.2. Amplasamentul investiției

Amplasamentul proiectului, inclusiv vecinatatile si adresa obiectivului :

JUD. GALAȚI, COM. COSMEȘTI, STR. MAGNOLIEI, NR 27, NR CAD.
107159, C.F. 107184

1.3. Beneficiarul investitiei

COMUNA COSMEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI

1.4. Titularul investitiei

COMUNA COSMEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI



1.5. Codul de identificare al proiectului la proiectant

266/ AUGUST 2022

1.6. Elaboratorul studiului.

PRO ARHIMED S.R.L.



CAPITOLUL 2. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

2.1. Situația actuală și informații despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului

Prezentarea succintă a localității

Cosmești este o comună în județul Galați, Moldova, România, formată din satele Băltăreți, Cosmești (reședința), Cosmeștii-Vale, Furcenii Noi, Furcenii Vechi și Satu Nou. Se află în Câmpia Tecuciului; lângă râul Siret; și la o altitudine de 81 m deasupra nivelului mării. Are o suprafață de 49,89 km². Populația este de 5.196 locuitori, determinată în 31 octombrie 2011, prin recensământ, pe criteriul de populație stabilă.

Comuna se află în extremitatea vestică a județului, la limita cu județul Vrancea, pe malurile Siretului, unde acesta formează lacul de acumulare Movileni. Este străbătută de șoseaua națională DN24/ Drumul European E581, care leagă Tecuciul de Mărășești. Lângă Băltăreți, acest drum se intersectează cu șoseaua județeană DJ252, care o leagă spre nord de Nicorești, Buciumeni, mai departe în județul Vrancea de Ploscuțeni, Homocea (unde se intersectează cu DN11A) apoi mai departe în județul Bacău de Huruiesti, Găiceana, Pâncești, Parincea, Ungureni și Buhoci (unde se termină în DN2F); și spre sud de Movileni și Barcea (unde se termină în DN25). Din acest drum, la Furcenii Noi se ramifică șoseaua județeană DJ252H care leagă satul de Tecuci (unde se termină tot în DN25). Prin comună trece și calea ferată Tecuci-Mărășești, care este deservită de stația Cosmești. Atât calea ferată, cât și DN24 traversează Siretul la Cosmești pe un pod etajat.





PRO-ARHIMED S.R.L.

CIF. 31086762, J40/1006/2016; TEL: 0720538138; arhimd@yahoo.ro

Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Cosmești se ridică la 5.196 de locuitori.

Din punct de vedere istoric, legenda spune că așezarea a fost întemeiată după bătălia de la Podul Înalt, când domnitorul Ștefan cel Mare a urmărit spre Tecuci trupele otomane, care se retrăgeau în debandadă peste Siret spre Dunăre, a înfrânt ariergarda otomană „în două ceasuri de luptă pe podișul Furcenilor. (...) După luptă a strâns oștirea în jurul său și le-a dat odihnă de trei zile și trei nopți. În acest timp a îngropat morții și a răsplătit pe vitejii săi căpitani, dându-le chiar de pe această movilă de pământ, cât văd cu ochii în toate părțile, că să le fie «ocină» pentru dânșii, familiile și urmașii lor. Între acești viteji au fost Nicoară, Cosma, Vezure, Negrilă, Dragoș, Munteanu, de la care se trag numele satelor Nicorești, Cosmești, Negrilești, Drăgănești, Munteni, etc”.¹

Prima atestare documentară a unei comunități existente și astăzi pe teritoriul acestei comune este cea a satului Furcenii Vechi. La data de 1637, 1(11) iulie, într-o mărturie de vânzare a jumătate din satul Mărcești, așezare care a se afla atunci pe teritoriul de astăzi al satului Furcenii Vechi, sunt menționați, pe lângă alți martori, Lazăr, Puia și Lascu (ginerile Goei Postelnicu) din Furceni.²

Cea de-a doua atestare documentară a fost cea a satului Cozmești, în timpul domniei lui Vasile Lupu în Moldova. Documentul a fost semnat de însuși domnitorul Vasile Lupu, în ziua de 29 septembrie 1646. Este vorba de un zapis întocmit la Tecuci în care Mărica, vorniceasa răposatului Gligori, vornic de gloată, a vândut lui Dumitrașcu stolnicul cu 70 de galbeni, doi „bătrâni”³ din satul Cozmești „pe unde a fost hotarul cel bătrân”.⁴

Datorită faptului că pe teritoriul acestei așezări râul Siret a avut o adâncime relativ mică, de până la 2.5 m și o mulțime de insule care au servit ca picioare de pod

¹ Simion T. Kirileanu, *Ștefan Vodă cel Mare și Sfânt*, Tipografia Mănăstirii Neamț, 1924, p.118.

² Acad. Ștefan Pascu și alții, *Documenta Romaniae Historica, Moldova, 1637-1638*, Editura Academiei Române, p.139. (În continuare se va cita: Ștefan Pascu, *Documenta: 1637-1638*.)

³ Teren moștenit de la strămoși.(DEX)

⁴ Acad. Ștefan Pascu, *Documenta Romaniae Historica. A. Moldova. Vol XXVIII, (1645-1646)*. Editura Academiei Române, București, 2006, p.39. (În continuare se va cita: Ștefan Pascu, *Documenta (1645-1646)*)



PRO-ARHIMED S.R.L.

CIF: 31086762, J40/1006/2016; TEL: 0720538138; arhimed@yahoo.ro

a făcut ca mai întâi satul Furceni, apoi Cosmești să devină localități de tranzit pe drumul ce ducea de la Iași, Vaslui, Bârlad, Tecuci Focșani, Târgoviște sau București și invers.

Aceasta a făcut ca teritoriul comunei Cosmești să fie tranzitat de personalități marcante ale istoriei naționale și europene, de mărfuri spre Constantinopol sau Viena, dar și de marile armate mai mult sau mai puțin prietene poporului nostru.

Un prim exemplu în acest caz este cel oferit de Axinte Uricariul care vorbește în *Cronica paralelă a Țării Românești și a Moldovei*, despre trecerea tătarilor pe la Furceni în drum spre cel de-al doilea asediu asupra Vienei:

„Pe acea vreme, când purcedea Duca Vodă la oaste, iată îi veni veste cum și Murat Gherei Hanul, cu toată puterea Crâmului și a Bugeacului, merge la Beci (numele vechi, oriental dat Vienei n.n.). Și trecând Prutul pe la Pagul, și luând Bârladul, au trecut Siretul pe la Furceni. Deci, nedându-i Duca Vodă pocloanele, pe unde au agiuns, pin Tutova, tot au prădat, numai căci n-au robî; iară ce au găsit pe la oameni, vaci, boi, iepe, căi și borfe, tot au luat.”⁵

Tot în acest sens putea aminti și de ziua de 10 iulie 1774 când s-a încheiat Pacea de la Kuciuc-Kainargi, în Dobrogea de sud, marcând începutul protectoratului rus în Principatele Române. Prin consulii de la București și Iași, Imperiul Rus avea să-și exercite controlul și amestecul continuu în toate afacerile Țărilor Române.⁶ Acest moment va marca începutul perindării trupelor ruse pe teritoriul comunei Cosmești, cu aceleași „tradiții” pe care le-au arătat și la „eliberarea” din anul 1944.

Anul 1869 a marcat introducerea satului Furceni în manualele de istorie militară, prin crearea de către domnitorul Carol a taberei permanente de instrucție din această localitate. Tabăra militară de la Furceni a fost prima și cea mai mare

⁵ Axinte Uricariul, *Cronica paralelă a Țării Românești și a Moldovei*, Ediție critică de Gabriel Ștrempel, Editura Minerva, București, 1994, p.172.

⁶ *Războiul ruso-turc din 1768-1774. Pacea de la Kuciuc-Kainargi (1768 - 1774)*, http://istoria.md/articol/134/R%C4%83zboiul_ruso_turc_din_1768_1774_Pacea_de_la_Kuciuc_Kainargi, accesat la 12.09.2019.



PRO-ARHIMED S.R.L.

CIF.31086762; J40/1006/2016; TEL: 0720538138; arhimd@yahoo.ro

tabără permanentă de instrucție din țară. Aceasta a avut un efectiv de 12000 de oameni, fiind alcătuită din regimente de infanterie, artilerie, vânători, geniu, cavalerie, miliție, călărași, dorobanți etc. În caz de necesitate, efectivul putea fi mărit până la 20000 de oameni. La Furceni au efectuat vizite de lucru sau exerciții militare cele mai importante personalități politice și militare ale vremii, dintre care amintim: Domnitorul și mai târziu Regele Carol I, Mihail Kogălniceanu, general Mihail Christodulo Cerchez, general Alexandru D. Macedonski, general Gheorghe Manu, Iorgu Eminovici (fratele poetului Mihai Eminescu), doctor Carol Davila, pr. Narcis Crețulescu (considerat ca fiind primul preot militar din România) și mulți alții. Această unitate de instrucție a funcționat până în ajunul începerii Războiului de Independență din 1877-1878, fiind o pepinieră de eroi a acestei conflagrații⁷.

Cel mai important episod din istoria comunei Cosmești a fost scris în timpul Primului Război Mondial, când frontul din Moldova s-a stabilizat pe linia Siretului. În iarna anului 1916, la Cosmești au fost instituite baraje pentru apărarea podului de la Cosmești, construit de inginerul Anghel Saligny în 1887. Odată cu începerea bătăliei de la Mărășești, în ziua de 6 august 17, flancul drept al Armatei 9 germane a avut misiunea de a cucerii acest pod de la Băltăreți, cu scopul de a se deplasa în direcția Tecuci și apoi spre Iași, unde se aflau Familia Regală și Guvernul României. După ce Divizia 34 Infanterie rusă a părăsit fără luptă și în debandadă pozițiile de la Ciușlea, Armata I română a dislocat pe teritoriul comunei Cosmești și în satul Doaga trupele eroicelor Divizii 5, 9, 13 și 14 Infanterie română, care au dus în doar două săptămâni de luptă la căderea acestui flanc de armată germană. Tot la Cosmești, generalul Eremia Grigorescu a înființat postul înaintat de comandă al Armatei I române⁸ și tot aici s-au aflat în mijlocul bombardamentelor inamice Regele Ferdinand, Regina Maria și Principele Carol, viitorul rege al României.

⁷ A se vedea pe larg Paul Aelenei, *Tabăra de la Furceni*, Ediția a doua revizuită și adăugită, Editura StudIS, Iași, 2022.

⁸ La acel moment, postul de comandă al Armatei I române era instalat în orașul Tecuci.



PRO-ARHIMED S.R.L.

CIF: 31086762; J40/1006/2016; TEL: 0720538138; arhimed@yahoo.ro

În timpul acestor bătălii, în comuna Cosmești au fost instalate mai multe posturi de comandă ale armatei române, puncte de observare și triaje pentru răniți.

De pe teritoriul Comunei Cosmești, din zona Delureni, a plecat la luptă traversând podul de fier peste Siret celebrul Regiment 32 Infanterie Mircea Vodă, cel ce a desfășurat „Atacul cămășilor albe” în regiunea Doaga, purtând una dintre cele mai eroice și uimitoare victorii din istoria armatei române.

Datorită faptului că din Valea Siretului artileria germană nu avea cum să cunoască pozițiile trupelor române de pe dealul din Cosmești a bombardat această localitate pe principiul obuz lângă obuz, transformând întreaga comună într-un morman de ruine fumegânde. În timpul acestor bombardamente a fost distrusă biserica din satul Furcenii Vechi, iar bisericile din Cosmești Vale, Cosmești Deal și Furcenii Noi au fost grav avariate. Tot atunci, fabrica de cherestea din Băltăreți a fost bombardată de două ori, și din această cauză a ars până la temelii. Luptele de la Cosmești au culminat în ziua de 2 august 1917, când, forțat de împrejurări, Comandamentul Corpului 3 armată român a ordonat dinamitarea „mărețului pod” din localitate, pentru a face imposibilă capturarea lui de către inamic.

În timpul acestor lupte, bombardamentele au ajuns la paroxism, zeci de soldați cosmeșteni aducându-și tributul de sânge pe altarul Patriei. Nu întâmplător generalul Eremia Grigorescu a spus: *„La Panciu, Mărășești și Cosmești s-a dezlănțuit cea mai măreață și groaznică bătălie ce a purtat vreodată țara românească. În luptele crâncene și vijelioase inamicul, întreit în număr, în pofta lui nesățioasă de a cuceri și restul din bogatul trup al scumpei noastre României, năpustindu-se furios, s-a izbit 12 zile și 12 nopți de vijelia noastră, ca de o stâncă neclintită. La Șușița și Siret ați năruit sforțările groaznice ale sălbaticului dușman, dovedind lumii odată mai mult că „Nici pe aici nu se trece!”⁹*

Cosmeștenii și-au adus jertfele pe câmpul de onoare și în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, când au luptat pe frontul de est până la Cotul Donului,

⁹ A se vedea pe larg Paul Aelenei, *Cosmeștii în timpul Primului Război Mondial*, Editura StudIS, Iași, 2021.



PRO-ARHIMED S.R.L.

CIF: 31086762; J40/1006/2016; TEL: 0720538138; arhimd@yahoo.ro

Odessa și Sevastopol, apoi pe frontul de vest ajungând în Ungaria, Cehoslovacia până în Munții Tatra. În urma acestor lupte, zeci de cosmeșteni nu s-au mai întors acasă niciodată, adăugându-se de pe câmpul de luptă la cetele îngerilor ce păzesc acum în neamul românesc. Numele a zeci de eroi cosmeșteni sunt zugrăvite pe pereții bisericilor din comună.

Mai adăugăm că, după actul de la 23 august 1944, în timpul retragerii germane, la noul pod de la Cosmești au avut loc lupte între soldații naziști și cei din armatele române și ruse pentru cucerirea acestui pod. În timpul acestor lupte, comuna a fost bombardată de mai multe ori de aviația și artileria germană, obiectivul principal fiind podul de la Băltăreți. Din fericire, de această dată podul a fost salvat.

Drept recunoștință pentru sacrificiul eroilor cosmeșteni și nu numai se dorește ridicarea acestui monument, pentru a păstra vie amintirea tuturor celor care au căzut în luptă pentru apărarea Patriei și a tradițiilor strămoșești.



PRO-ARHIMED S.R.L.

CIF.31086762; J40/1006/2016; TEL: 0720538138; arhimd@yahoo.ro

ANEXE

EROII DIN COSMEȘTI DEAL ȘI BĂLTĂREȚI CĂZUȚI ÎN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL

DĂMĂCEANU VASILE
GROZAVU VASILE
MOCANU MARIN
MANOLE TOADER
FLOROIU MARIN
ANGHELACHE GHEORGHE
STROI ION
BULANCEA CONSTANTIN
ROȘCA MIRON
CONSTANTIN PETREA
BÎRLĂDEANU ION
ROȘCA MITRIȚĂ
DAVID ION
IAMANDI ION
MIHALCEA MANOLE
MIHALCEA PETRACHE
FERU TOADER
NECULAI TOADER
PLĂCINTĂ NECULAI
LOVIN DUMITRU

CIOBOTARU V.CONSTANTIN
MIHALCEA TACHE
MUNTEANU IRINA
BULANCEA VASILE
POLOBOC IANCU
MANOLE NECULAI
NEACȘU PETRACHE
STROI ANDREI
ROȘCA ION
CONSTANTIN TACHE
GÎRLEANU ION
CIOT GHEORGHE
GRIGORE VASILE
MIHALCEA D. VASILE
FLOROIU I. ION
MIHALCEA I. VASILE
VOICAN TOADER
BÎRLĂDEANU TACHE
CIOT DUMITRU
SAVA GHEORGHE

EROII DIN COSMEȘTI VALE CĂZUȚI ÎN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL

DIACONU ION
FLOROIU NECULAI
SIMIONESCU VASILE
BANCOVICI ION
GOLEA TOADER
MUNTEANU ȘTEFAN
ZAHARIA VASILE
VULPOI VASILE
VULPOI GICĂ
MOCANU COSTICĂ
VICIU ALEXANDRU

CIOBOTARU PETRU
LICIU TACHE
MANOLE ȘTEFANACHE
TOCILĂ NECULAI
GALAȚIEANU GHEORGHE
MOCANU ILIE
GRIGORIU RADU
BUGA TUDOSE
FRĂȚILĂ ȘTEFAN
CHIRIȚĂ MIHALACHE



PRO-ARHIMED S.R.L.

CIF. 31086762; J40/1006/2016; TEL: 0720538138; arhimd@yahoo.ro

EROII DIN FURCENII VECHI ȘI FURCENII NOI CĂZUȚI ÎN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL

ENI I. ENI
STROI NECULAI
EPURE COSTACHE
CĂLIN GHEORGHE
DOMINTENU IOAN
CĂLIN ILIE
OBREJA M. VASILE
VRABIE ALEXANDRU
CĂLIN N. TOADER
ZAGRAIANU SANDU
CĂLIN VASILE
ORÎȚĂ NICOLAE
LOVIN DUMITRU
SÂRBU NICOLAE
OLOI IOAN
MACHIDON MARIN
VRABIE IOAN
OANCĂ VASILE
VAIDA ȘTEFAN
MARIN GHEORGHE
DOROȘIN SIMEON
PALADE MĂRGĂRIT
SERA MARIN
IOSEF NECULAI
UNGUREANU GHEORGHE
GACU TOADER
ȘENDREA TOADER
CIOCAN SAVA
SAVA PARASCHIV
DAVID GHEORGHE
HURJUI CONSTANTIN
EPURE V. CONSTANTIN
ROIBU IANCU
DUBĂU GHEORGHE
PODARU V. GHEORGHE

EM. V. APOSTOLEANU
MIHAI ALEXANDRU
GANCIU T. MARIN
SÂRBU C. DUMITRU
BEJAN IANCU
DOBRE N. NECULAI
HRIZU I. TEODOR
EPURE I. LAZĂR
DOBRE I. TANASACHE
EPURE NECULAI
MAXIM IOAN
PODARU Z. CONSTANTIN
KIȚU GHEORGHE
VOICAN TOADER
VRABIE COSTACHE
FERU TOADER
IVAN GHEORGHE
PODARU SANDU
ROȘCA CONSTANTIN
NACIU GHEORGHE
VRÂNCEANU IOAN
CIOBOTARU TOADER
DRĂGAN TOADER
UNGUREANU TOADER
BUZENCHI IOAN
PUIU MIHALACHE
NIȚU SAVA
LUPU ILIE
SAVA VASILE
NĂSTASE STAN
TOADER VASILE
ROBU RADU
CIOBOTARU GH. IOAN
AILENEI TACHE



PRO-ARHIMED S.R.L.

CIF.31086762; J40/1006/2016; TEL.: 0720538138; arhimd@yahoo.ro

EROII DIN COSMEȘTI DEAL ȘI BĂLTĂREȚI CĂZUȚI ÎN CEL DE-AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL

MUNTEANU ZAHARIA
BORȘ AUREL
BORȘ ION
STROI VASILE
STROI MIHAI
CHIRIȚĂ GR. GHEORGHE
GRIGORICĂ NECULAI
VOLOAGĂ ȘTEFAN
VOLOAGĂ NECULAI
CHIRIȚĂ C.GHEORGHE
MIHALCEA SPIRIDON
MIHALCEA NISTOR
BRANIȘTE IRIMIA
GEOGLAMAN COSTICĂ
RUMEGU DUMITRU
VULPOI GHEORGHE
TUDOR DUMITRU
ANTON GHIȚĂ
MOCANU ILIE
HURJUI VICU

DIACONU ION
MOCANU STOIAN
FERU SIMION
FLOROIU VASILE
FERU VASILE
VLAD ION
BUCIUMEANU CONSTANTIN
PÂRVU ALEXANDRU
MUNTEANU ION
SAVA PAVEL
OTROCOL ION
ALEXANDRU VASILE
POPA TOADER
ARGHIR PETRU
OLARU VASILE
GĂTEJ GHEORGHE
BURUIANĂ GHEORGHE
LAZĂR CONSTANTIN
GÂRLENU GHEORGHE
FERU TOADER



PRO-ARHIMED S.R.L.

CIF: 31086762; J40/1006/2016; TEL: 0720538138; arhimd@yahoo.ro

EROII DIN COSMEȘTI VALE CĂZUȚI ÎN CEL DE-AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL

CHIRIȚĂ VASILE
BÂRLADEANU TACHE
SORA I. GHEORGHE
MIHALACHE NECULAI
NEGOIȚĂ MIHALACHE
MUNTEANU GHEORGHE
FLOROIU MIRON
BUGA NECULAI
BUGA CARP
PLEȘCAN VASILE
PLEȘCAN IONIȚĂ
PLEȘCAN NECULAI
FLOROIU ALEXANDRU
IMANDI ANTON
MIHAI VASILE

PĂDURARU NIȚĂ
GÂRLENU ION
TONTU ȘTEFAN
CHIRIȚĂ NECULAI
GĂTEJ GHEORGHE
VULPOI VASILE
FLOROIU TOADER
CAZAN VASILE
DIACONU ION
GÂRNEAȚĂ IOAN
CĂLIMAN IONIȚĂ
MIHALACHE TOADER
ROȘCA I. IOAN
CIOBOTARU I. IOAN
RUCU HRISTACHE

EROII DIN FURCENII VECHI ȘI FURCENII NOI CĂZUȚI ÎN CEL DE-AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL

BALTAG DUMITRACHE
BALTAG TOADER
BEJAN SAVA
ROBU ION
GÂRLEANU GRIGORE
GÂRLEANU NECULAI
BORȘ ȘTEFAN
VOICAN GHEORGHE
AILENEI SANDU
DRAGĂN TOMA
CĂLIN ION
DOBRE ALEXANDRU
DOBRE GHEORGHE
VASILACHE NECULAI

ROȘCA MIU
SAVA COSTACHE
LOVIN DUMITRU
PODARU ENACHE
DINGA GRIGORE
AILENEI VASILE
ROȘCA ȘTEFAN
ROȘIORU VASILE
VRABIE GHEORGHE
MURGULEȚ ION
MOISE IANCU
OANCĂ ION
RÂPAN CONSTANTIN
CERNICA VASILE"

Material furnizat de doctorandul în istorie, domnul Paul Aelenei.



PRO-ARHIMED S.R.L.

CIF.31086762; J40/1006/2016; TEL: 0720538138; arhimd@yahoo.ro

În urma celor prezentate mai sus, dar mai ales datorită unui grup inimos cu o inițiativă salutară de a realiza un monument închinat eroilor din Primul Război Mondial, dar și pentru a comemora evenimentele prilejuite de „Marele Război”, totodată având în vedere faptul că de pe amplasamentul propus, există mărturii și dovezi că au fost conduse luptele de către conducerea armatei române, la care au participat și membri ai familiei regale române, Majestatea Sa Regina Maria, s-a adoptat inițiativa de a se edifica un monument, mai bine zis un ansamblu monumental, for public. Există documente și fotografii cu privire la evenimentele prilejuite de primul război mondial când în această zonă au fost desfășurate ample mișcări de trupe ale Armatei Române.

Prin urmare, acest grup de inițiativă a identificat fonduri din donații și sponsorizări provenite de la fiii ai localității, sau societăți comerciale, au stabilit o serie de cerințe pe care le-au aprobat la nivelul Consiliului Local al Comunei Cosmești și pentru care s-a decis întocmirea prezentului proiect.

Prin realizarea acestui ansamblu comemorativ, comuna Cosmești se va înscrie pe harta obiectivelor comemorative ale eroilor români care și-au jertfit viațile pentru apărarea patriei.

Realizarea sitului va crea un spațiu menit să desfășurării de activități oficiale, culturale, sociale legate de istoria comunei. Obeliscul în formă de cruce stilizată, prin înălțimea sa, va atrage turiștii aflați în zonă. Pe timpul nopții acesta va putea fi vizibil de la distanță foarte mare, astfel devenind un punct de reper în zonă. În cadrul ansamblului se vor realiza o serie de panouri informative imprimate pe care se vor prezenta informații legate de istoria comunei, a sitului și a evenimentelor desfășurate în zonă în decursul timpului. Pentru evocarea luptelor eroice desfășurate în perioada primului război mondial, se va construi un punct de belvedere cu un ecran din sticlă securizată și care prin intermediul acestuia, privitorul va putea înțelege însemnătatea promontoriului în timpul războiului, dar și dispunerea forțelor combatante în regiune.

Prin realizarea obiectivului, se vor putea organiza evenimente și comemorări ale eroilor, inclusiv vizite organizate ale claselor de la școlile din comună sau din localitățile învecinate.

Acest sit se dorește a deveni un magnet pentru atragerea turiștilor în zonă, ceea ce va duce la creșterea numărului de vizitatori în zonă.

Prin realizarea acestei investiții va crește afluența de turiști, Comuna Cosmești va deveni un reper socio cultural pentru zonă. Prin atragerea turiștilor în zonă, vor fi stimulați investitorii privați locali în dezvoltarea de mici afaceri care vor duce la creșterea nivelului de trai pentru locuitorii zonei. Mai trebuie avut în vedere faptul că amplasamentul se află în zona încărcată de istorie și repere comemorative: Mausoleul de la Mărășești, Parcul Memoriei Naționale Ro-Mândria, Linia defensivă Mărășești- Tișița-Cosmești, etc.



PRO-ARHIMED S.R.L.

CIF.31086762; J40/1006/2016; TEL: 0720538138; arhimd@yahoo.ro

Construirea sitului va contribui la menținerea memoriei colective cu privire la evenimentele desfășurate în zonă, a personalităților care au participat, etc. Amplasamentul are următoarele vecinătăți:

La Nord:	Proprietate privată Bostan Nicolae
La Sud:	Primăria Cosmești- teren viran sub formă de taluz
La Est:	Proprietate privată Nr. Cad. 107185
La Vest:	Primăria Cosmești- teren viran sub formă de taluz

2.2. Descrierea investiției

Prin proiectul nostru, "CONSTRUIRE MONUMENT EROI ÎN LOCALITATEA COSMEȘTI, COMUNA COSMEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI", se propune a se realiza o investiție care constă în construirea unui sit – monument de for public.

Valoarea și beneficiile spațiilor publice s-au pierdut în timp, modificându-se odată cu schimbarea valorilor sociale. Acest monument de for public contribuie la păstrarea memoriei colective, la bunăstarea oamenilor și a comunităților, la coeziunea socială, are beneficii turistice și economice și oferă oportunități educaționale. Parcurile și spațiile verzi sunt locuri în care oamenii se întâlnesc pentru a sărbători, pentru a plânge sau a reflecta, pentru a împărtăși succese cu prieteni sau pentru a face sport. Problema spațiilor de socializare trebuie tratată în temeni de relații între oameni și mediul înconjurător, având ca fundament presupuziția că nicio altă activitate de loisir (citit, vizionare tv, ascultat muzică,...) nu poate înlocui nevoia biologică și socială a omului de a interacționa cu mediul.

Ideea acestui obiectiv este mai amplă față de ceea ce va fi prezentat în prezentul memoriu, dar datorită constrângerilor financiare, obiectivul va fi realizat în două faze.

Prima fază care va fi tratată în continuare în prezentul memoriu, este format din obiectele:

- Obiectul 1. Consolidarea sitului prin cămășuirea taluzului vestic.
- Obiectul 2. Împrejmuirea obiectivului.
- Obiectul 3. Realizarea de platformelor din beton amprentat.
- Obiectul 4. Obelisc în formă de cruce stilizată, inclusiv soclu.
- Obiectul 5. Panouri informative.
- Obiectul 6. Parcare pentru vizitatori.
- Obiectul 7. Amenajare postamente pentru obuziere.
- Obiectul 8. Obuziere.
- Obiectul 9. Iluminat.
- Obiectul 10. Branșamente.



PRO-ARHIMED S.R.L.

CIF. 31086762; J40/1006/2016; TEL: 0720538138; arhimd@yahoo.ro

Cea de a doua fază, care vine în completarea și continuarea celei dintâi va avea următoarele obiecte:

Obiectul 11. Dispunere grup sanitar unisex, adaptat.

Obiectul 12. Dispunere mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi)

Obiectul 13. Digitalizarea sitului prin amplasarea de coduri QR și proiectoare holografice de imagine și sunet. Acest obiect de investiție va oferi un grad de interacțiune a vizitatorilor cu informațiile documentare prezentate, astfel încât să poată fi realizate holograme cu diferite momente sau persoane (personalități) legate de evenimentele comemorate sau de localitate. Prin intermediul unor coduri QR, la o simplă scanare, pot fi furnizate informații documentare direct pe dispozitivele inteligente folosite de vizitatori. Pentru o și mai bună punere în rol, se pot implementa sisteme audio care să reproducă atmosfera de luptă, narațiuni regizate, coloane sonore muzicale... etc.

Această fază ulterioară nu este bugetată în prezenta notă conceptuală, urmând a face obiectul altei investiții.

Descrierea obiectelor din prima fază:

Obiectul 1. **Consolidarea sitului prin cămășuirea taluzului vestic.** În urma realizării studiului geotehnic se va stabili dacă vor fi necesare lucrări de consolidare a dealului pe versantul vestic. Lucrările propuse vor consta în cămășuirea dealului și torcretarea cu beton proiectat, care ulterior va avea aspectul de piatră. Suprafața propusă pentru a fi consolidată este de aproximativ 420 mp.

Obiectul 2. **Împrejmuirea obiectivului.** Se propune a se realiza pe latura nordică și estică din panouri din panouri metalice bordurate cu înălțimea de 1,2 m și lungime de 119,62 m, dublată de gard viu, iar pe latura vestică, cu o balustradă cu baluștri în lungime totală de 52,0 m, care să împiedice posibila avansare a vizitatorilor până la marginea dealului.

Obiectul 3. **Realizarea platformelor din beton amprentat.** Se propune realizarea unei platforme generale din beton amprentat pe un terasament din piatră tasată, conform studiului geotehnic. Platformă din beton amprentat- 467,50 mp, cale de acces către parcare: 359,50 mp, parcare- 282,00 mp.

Obiectul 4. **Obelisc în formă de cruce stilizată, inclusiv soclu.** Baza obeliscului va fi înălțată la 0,87 m și se va accede pe aceasta prin intermediul a 5 trepte. Soclul obeliscului va avea o înălțime de 1,5 m, și un volum total de 30,0 mc și va fi realizat din beton armat, astfel încât să poată prelua sarcinile și încărcările date de obeliscul propriu- zis. Pe fețele soclului vor fi dispuse o serie de plăci pe care vor fi înscrise numele eroilor și bătăliile la care au participat. Tot pe acest soclu, vor fi dispuse niste cârlige pentru a putea fi montate coroanele sau jerbele care vor fi aduse în timpul ceremoniilor. Obeliscul propriu-zis va avea înălțimea proprie de 11,10 m



PRO-ARHIMED S.R.L.

CIF.31086762; J40/1006/2016; TEL: 0720538138; arhimd@yahoo.ro

cu un volum de beton armat de cca. 27,86 mc și va da o înălțime maximă a întregului ansamblu de circa 13,80 m, peste care se va monta o baliză de semnalizare pentru semnalizarea obstacolului în traseele aeriene.

Obiectul 5. Panouri informative. Panourile informative vor avea o lungime totală de 27 metri cu o înălțime de circa 2,4 metri. Pe fața interioară acestea vor fi placate cu o serie de litouri imprimate pentru exterior, prin intermediul cărora se va putea realiza o documentare a vizitatorilor. Suprafață totală pentru expunere este de aproximativ 54,0 mp.

Obiectul 6. Parcare pentru vizitatori. Se prevede realizarea unei parcări pentru 10 locuri de parcare, din care 1 va fi adaptat pentru persoane cu invaliditate. Suprafața totală parcare, fără calea de rulare este de 282,0 mp.

Obiectul 7. Amenajare postamente pentru obuziere. Obuzierele vor fi amplasate în poziție de tragere, pe niște postamente cu dimensiunile de 4x 6m cu înălțimea de 35 cm. Postamentele vor fi împrejmuite cu un sistem de obuze stilizate, legate între ele cu un lanț, astfel încât să limiteze trecerea, dar să nu incomodeze vizionarea acestora. Pe obuzele stilizate vor fi inscripționate numele toponimice și datele desfășurării luptelor la care au participat eroii comunei Cosmești.

Obiectul 8. Obuziere. Obuzierele vor fi preluate de la Ministerul Apărării Naționale după ce vor fi blintuite și dezafectate, astfel încât să nu mai poată fi folosite pentru trageri, ci doar ca exponat de muzeu.

Obiectul 9. Iluminat. Se propune realizarea iluminării prin intermediul mai multor circuite, după cum urmează:

- realizarea unui iluminat ambiental al întregului sit;
- iluminarea panourilor informative;
- iluminarea muticoloră a obeliscului și a celor două obuziere, astfel

încât să poată fi vizibile de la distanță foarte mare.

Obiectul 10. Branșamente. Situl va fi branșat la rețeaua de curent electric din zonă.



PRO-ARHIMED S.R.L.

CIF. 31086762; J40/1006/2016; TEL: 0720538138; arhimd@yahoo.ro

a) *Concluziile studiului de fezabilitate sau ale planului detaliat de investiții pe termen lung în cazul în care au fost elaborate în prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării investiției, precum și scenariul tehnico-economic selectat;*

Pentru investiția prezentă nu a fost întocmit un studiu de fezabilitate.

România se confruntă cu o discrepanță majoră între mediul rural și mediul urban în ceea ce privește infrastructura socială și fizică. Pregătirea și menținerea la un nivel adecvat a infrastructurii este fundamentală pentru dezvoltarea economică, socială și generală, echilibrată la nivel regional.

Infrastructura fizică de bază slab dezvoltată în majoritatea comunelor este una dintre cauzele care limitează dezvoltarea serviciilor de bază în spațiul rural (facilitățile culturale, recreative, de îngrijire a copiilor și a bătrânilor, servicii de transport public etc.).

În majoritatea comunelor și satelor, acestea sunt slab dezvoltate sau, în unele cazuri, aproape inexistente.

Este nevoie de o infrastructură corespunzătoare pentru ca zonele rurale să atragă investiții și să rămână competitive pentru crearea de noi întreprinderi. De asemenea, acestea ar putea contribui la dezvoltarea unor localități mai atractive, a unor locuri de muncă și a unor condiții de trai mai bune în zonele rurale.

Dezvoltarea unei astfel de infrastructuri se poate realiza prin acțiunile administrației publice locale care coordonează și întocmește strategiile de dezvoltare locală, întocmește și implementează proiecte europene, finanțări prin programe naționale sau din donații și sponsorizări, cum este și cazul prezentului proiect.

În cadrul analizei efectuate s-a constatat că situația actuală a serviciilor și a infrastructurii afectează puternic calitatea vieții din spațiul rural și constituie o piedică pentru dezvoltarea activităților economice. Prin urmare, este necesară poziționarea nevoilor și luarea unor măsuri de intervenție în zonă, astfel încât implementarea de proiecte realiste să ducă la o calitate a vieții îmbunătățită pentru locuitorii spațiului rural.

Analiza SWOT scoate în evidență tocmai aspectele prezentate mai sus cu privire la degradarea mediului cultural al României;

PUNCTE TARI	PUNCTE SLABE	OPORTUNITATI	AMENINTARI
-Ponderea ridicată a zonelor rurale -Moștenirea rurală bogată (tradiții, repere istorice, cadru	-Infrastructura Rurala de baza slab dezvoltată (drumuri, apa/tratarea apei Reziduale, energie si gaze);	-Puncte de sinergie între programele actuale de dezvoltare rurală; -Existența unei imagini în conștiința colectivă cu privire la	-Depopularea zonelor rurale; -Calamități naturale; -Disparitia patrimoniului și a tradițiilor



PRO-ARHIMED S.R.L.

CIF. 31086762; J40/1006/2016; TEL: 0720538138; arhimed@yahoo.ro

PUNCTE TARI	PUNCTE SLABE	OPORTUNITATI	AMENINTARI
natural, arhitectură tradițională); -Identitate istorică, rurală/stil de viata tradițional;	-Acces limitat la serviciile de bază (facilități pentru copii, vârstnici; activități recreative si spații recreaționale); -Degradarea accentuată a așezărilor/satelor cu valoare culturală ridicată a sărăciei în satele situate în zone mai puțin accesibile;	istoria locului; -Bogăția patrimoniului și a tradițiilor rurale; -Abordări integrate pentru acoperirea simultană a mai multor zone de interes ale proiectului, care au legătură între ele;	rurale;

O infrastructură modernă reprezintă punctul de pornire cheie în transformarea zonelor rurale în zone atractive în care cetățenii să-și desfășoare activitatea economică și să trăiască.

Principalele domenii care necesită atenție sunt;

- Infrastructura fizică de bază – străzile /drumurile comunale; rețelele de alimentare cu apă și de canalizare/tratare a apelor reziduale; infrastructura de alimentare cu energie electrică/ termică și gaze;
- Serviciile comunitare de bază – facilități pentru copii și vârstnici; servicii de transport public; facilități de petrecere a timpului liber și de sport etc; centre comunitare, cămine culturale și alte facilități culturale; renovarea clădirilor publice (ex. Primării) și amenajări de parcuri, piețe, spații pentru organizarea de tâguri etc.
- Păstrarea și conservarea patrimoniului istoric, rural și a identității culturale, a tradițiilor și a obiceiurilor.

Renovarea și dezvoltarea satelor și mai ales îmbunătățirea infrastructurii, ameliorarea calității aerului și a apei nu sunt doar o cerință esențială pentru îmbunătățirea calității vieții și pentru creșterea atractivității zonelor rurale, ci și un element foarte important pentru dezvoltarea activităților economice și pentru protecția mediului.

Satele și zonele rurale trebuie să ajungă în situația de a putea concura eficient pentru atragerea de investiții în paralel cu asigurarea unor servicii adecvate pentru comunitate și a altor servicii sociale aferente pentru populația locală.

Investiția "CONSTRUIRE MONUMENT EROI ÎN LOCALITATEA COSMEȘTI, COMUNA COSMEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI" urmărește crearea și dezvoltarea serviciilor de bază pentru populația rurală, fiind esențială pentru asigurarea unui



PRO-ARHIMED S.R.L.

CIF.31086762; J40/1006/2016; TEL: 0720538138; arhimd@yahoo.ro

nivel de trai decent, pentru creșterea gradului de confort material și psihologic aducând beneficii sociale și de mediu considerabile.

Proiectul privind investiția de amenajare a unui ansamblu comemorativ, dorește să aducă un plus de înfrumusețare spațiului public și să ofere șansa unei interacțiuni de calitate în interiorul comunității.

Scopul intervenției este legat de:

- Crearea unui spațiu care va putea găzdui diferite ceremonii laice sau religioase la care să poată participa și publicul larg. Prin dispunerea panourilor informative, se va păstra caracterul documentar și educativ cu privire la evenimentele petrecute în sit, dar și asupra memoriei istorice a participanților. Folosirea celor două obuziere, pe lângă crearea atmosferei militare, vor avea și rolul de exponate de muzeu. Postamentele pe care vor fi dispuse obuzierele în poziție de tragere, vor fi împrejmuite cu un sistem de obuze stilizate, legate între ele cu un lant, astfel încât să limiteze trecerea, dar să nu incomodeze vizionarea acestora. Pe obuzele stilizate vor fi inscripționate numele toponimice și datele desfășurării luptelor la care au participat eroii comunei Cosmești. Pe latura Sud-vestică, pe marginea promontoriului se va amplasa un punct de belvedere prin intermediul căruia vizitatorii vor avea posibilitatea să înțeleagă mai bine desfășurarea luptelor de la Cosmești, dispunerea unităților tactice, desfășurarea luptelor, cât și traiectoria proiectilelor de artilerie. Punctul de belvedere va fi dotat cu un binoclu care va ghida perspectiva privitorului.

- Facilitarea interacțiunii interumane și creșterea capitalului social în spațiul public;

- Rezolvarea problemelor ambientale și de mediu ale comunităților rurale;

- Realizarea unei dezvoltări durabile prin implicarea populației încă de la vârste tinere în susținerea respectului față de comunitate și de natură.

Prin proiect se va reabilita și amenaja o suprafață în prezent relativ degradată din intravilan și în același timp se va realiza amenajarea unui spațiu public destinat activităților de comemorare a istoriei și a înaintașilor, de agrement și socializare.

Elaborarea studiului de fezabilitate a fost efectuată respectând următoarele acte legislative:

1. Legea 242 din 23 iulie 2009 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;
2. Legea 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, cu modificările și completările ulterioare;



PRO-ARHIMED S.R.L.

CIF.31086762; J40/1006/2016; TEL: 0720538138; arhimd@yahoo.ro

4. Norme metodologice din 12 octombrie 2009 pentru aplicarea Legii 50 din 1991 privind autorizarea executării construcțiilor;
5. Ordonanța de Urgență nr.164 din 19 noiembrie 2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului;
6. Legea 184 din 12 aprilie 2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect –Republicare;
7. Ordinul Ministrului administrației și internelor nr. 602 din 2 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor privind avizarea pe linie de protecție civilă a documentațiilor de investiții în construcții;
8. Hotărâre nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;
9. Legea nr.199 din 17 noiembrie 1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985;

b) Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiții pot fi atinse:

- scenariul recomandat de către elaborator, împreună cu beneficiarul;
- avantajele scenariului recomandat;

Pornind de la solicitările beneficiarului și corelându-le pe acestea cu modalitățile tehnice de rezolvare a problemelor semnalate, a rezultat un scenariu tehnico- economic posibil care răspunde la tema de proiectare „AMENAJARE SPATII DE AGREMENT, PARC ȘI LOC DE JOACĂ PENTRU COPII, COMUNA COSMEȘTI, JUD. GALAȚI”.

Bunele practici recomandă întocmirea a trei variante posibile pentru a putea ajunge la varianta optimă:

- 1) Varianta de „a face minimum”. Această variantă nu se exclude de la sine în cazul acestui proiect, dar infrastructura propusă a se realiza nu ar fi funcțională fără toate elementele propuse sau doar prin simpla realizare parțială a fiecărei componente.
- 2) Varianta de „a implementa proiectul” – de aceasta dată se poate analiza oportunitatea implementării proiectului la nivel național/ regional în comparație cu alte proiecte similare. Pentru continuarea analizei multicriteriale, din punct de vedere tehnico- economic, se vor identifica pentru fiecare obiectiv al investiției alternative la soluția constructivă, urmată de punctaj pentru apreciere.
- 3) Varianta de „a nu face nimic” – caz în care avem de a face cu păstrarea situației existente în prezent în zona luată în discuție și chiar o



PRO-ARHIMED S.R.L.

CIF: 31086762; J40/1009/2016; TEL: 0720538138; arhimd@yahoo.ro

deteriorare a situației generale. Acest lucru ar însemna perpetuarea stării actuale în care nu există un spațiu consacrat eroilor localității, pierderea oportunitatea de a înscrie localitatea pe harta zonală a monumentelor consacrate primului război mondial.

În cazul de față, se va realiza analiza multicriterială pentru variantele „cu proiect” în varianta tehnică prezentată și de „a face minimum”, prin aplicarea unor corecții minimale care să justifice efortul investițional. În cel de doilea caz, nu se poate realiza o analiză fundamentată atât timp cât nivelul minim este perceput în mod diferit, iar finalitatea efortului investițional de cele mai multe ori nu este vizibilă, chiar este o pierdere financiară pe termen lung din cauza costurilor mari de întreținere în exploatare.

În acest mod, pornind de la singura alternativă viabilă și durabilă de „a se implementa proiectul” se va realiza în continuare analiza multicriterială a soluției tehnico-economice a investiției.

Propunerea înaintată este considerată optimă din următoarele considerente:

- Este varianta optimă având în vedere că spațiile destinate ceremonialului vor atrage locuitorii comunei, dar și locuitori din afara acesteia, datorită festivităților la care vor participa efective de militari, având în vedere că în lumea cazonă, încă se păstrează foarte bine evidențiat cultul eroilor, comemorarea acestora etc. Toate acestea vor contribui la socializare între locuitorii comunei, locul va deveni un punct de referință și de interes, inclusiv de petrecere a timpului liber, spații organizate fără a genera alte cheltuieli suplimentare de deplasare pentru beneficiarii direcți și aici ne referim atât la cheltuieli financiare, cât și de timp.

La alegerea variantei optime propuse prin acest proiect, au fost avute în vedere următoarele ipoteze de lucru:

- Realizarea unui proiect cu impact financiar, social și economic deosebit asupra localității, printr-o investiție cu costuri cât mai reduse;
- Costurile materialelor, a energiei, a utilajelor și a echipamentelor tehnologice nu se vor modifica considerabil în perioada de preimplementare sau de implementare; informațiile furnizate au fost luate în calcul la nivelul anului 2022;
- Menținerea legislației de mediu la nivelul perioadei de realizare a prezentei documentații, având în vedere respectarea directivelor de mediu impuse de Consiliul Europei;
- Toate investițiile vor rămâne în posesia comunei Cosmești și vor fi gestionate și întreținute eficient;

Pentru evaluarea variantelor studiate au fost considerate următoarele criterii:

- Amplasamentul existent se află în proprietatea comunei Cosmești;
- Costuri investiționale reduse;



PRO-ARHIMED S.R.L.

CIF: 31086762; J40/1006/2016; TEL: 0720538138; arhimd@yahoo.ro

- Încadrarea în Planul Urbanistic General;
- Costuri minime de întreținere în perioada de operare.

De asemenea pentru varianta „a se implementa proiectul” au fost elaborate două scenarii tehnico- economice.

Scenarii propuse (minimum două).

Se propun două variante de realizare a investiției:

Scenariul 1: Pentru realizarea investiției în termeni optimi, astfel încât să respecte toate criteriile și să se asigure o cât mai eficientă funcționare, se prevăd următoarele categorii de lucrări:

1. Amenajarea unui sistem de alei cu îmbrăcăminte din beton amprentat pe un suport de beton armat, având în vedere că terenul este accidentat și că ulterior ar putea apărea eventuale tasări, ceea ce ar duce la deteriorarea acestuia;
2. Realizarea unor platouri din beton amprentat, pentru amplasarea celor două obuziere și a punctului de belvedere, la fel ca treptele din jurul obeliscului care pot servi pentru reuniuni, activități sociale, jocul copiilor de vârste mai mari, cât și oferirea posibilității realizării de sărbători specifice care provin din tradiția militară, populară sau religioasă;
3. Spații verzi organizate din punct de vedere estetic, cât și funcțional, împrejurimi cu arbuști și arbori ornamentali.
4. Ambientarea sitului cu un sistem de iluminat, atât pentru iluminatul pietonal, cât și pentru iluminatul artistic, arhitectural al obeliscului, al obuzierelor, al panourilor informative sau al înscrisului ”Cosmești” de pe versantul dealului.

Scenariul 2: Pentru realizarea investiției astfel încât aceasta să respecte toate criteriile care îi asigură o funcționare eficientă, se prevăd următoarele categorii de lucrări:

1. Amenajarea unui sistem de alei din placaje de piatră naturală fățuită.
2. Realizarea platourilor cu placaje de granit, travertin cu inserții metalice.
3. Spații verzi.
4. Realizarea de grupuri sanitare pe sexe la care se va adăuga și cabină pentru persoane cu mobilitate redusă.
5. Iluminat personalizat etc.

Scenariul propus de autor:

Proiectantul recomandă adoptarea scenariului 1.

Avantajele scenariului recomandat:

Prin adoptarea variantei 1, din punct de vedere economic, investiția este mai avantajoasă.



PRO-ARHIMED S.R.L.

CIF: 31086762; J40/1006/2016; TEL: 0720538138; arhimd@yahoo.ro

c) Descrierea constructivă, funcțională

Zonele rurale din România reprezintă o importanță deosebită din punct de vedere economic, social, dar și din perspectiva dimensiunii, a diversității, a resurselor naturale și umane pe care le dețin.

Investiția constă în realizarea unei amenajări a spațiilor publice de recreere pentru populația rurală, constând în crearea de **facilități de petrecere a timpului liber**: lucrări de arhitectură monumentală / spații verzi, alei pietonale, platouri/ spațiu evenimente.

Amplasarea acestora pe teren se va face conform planului de situație.

Investiția constă în realizarea următoarelor obiective:

➤ *Lucrări de arhitectură peisageră: - 33,40 mp.*

Plantarea de arbuști și arbori ornamentali, flori perene și de sezon, însămânțarea cu gazon, dispunerea de pietre ornamentale.

➤ *Amenajarea de spații de odihnă: - 5 bănci.*

Se dispun bănci din lemn paralel cu aleea care ajunge până la parcare.

➤ *Amenajare alei și căi de acces cu îmbrăcăminte din beton amprentat– Alei 2,40 m lățime, pe o lungime de 280 ml și o suprafață de 672,00mp*

Îmbrăcăminte din beton amprentat, turnat peste un strat suport din beton armat. Stratul de uzură, va fi tratat cu lacuri de exterior și pigmenți de culoare.

➤ *Platouri pentru evenimente, 1322,00 mp, Øplatou 1=28,00m; Øplatou 2= 30,00m*

Îmbrăcăminte din piatră naturală pe strat suport de B.A. 250 de 10 cm, dispus pe un pat de nisip de 3 c, peste un strat de 10 cm de piatră spartă compactată.

Branșamente și alte instalații:

- iluminat public în interiorul obiectivului;
- iluminat arhitectural al obeliscului și al panourilor informative;
- iluminat al literelor cu denumirea localității.




PRO-ARHIMED S.R.L.


CIF. 31086762; J40/1006/2016; TEL: 0720538138; arhimed@yahoo.ro

Infrastructura


Amplasamentul se află în zona cu adâncimi de îngheț de 0,80 – 0,90 m – STAS 6054/77, a se vedea harta zonării teritoriale după adâncimea de îngheț:

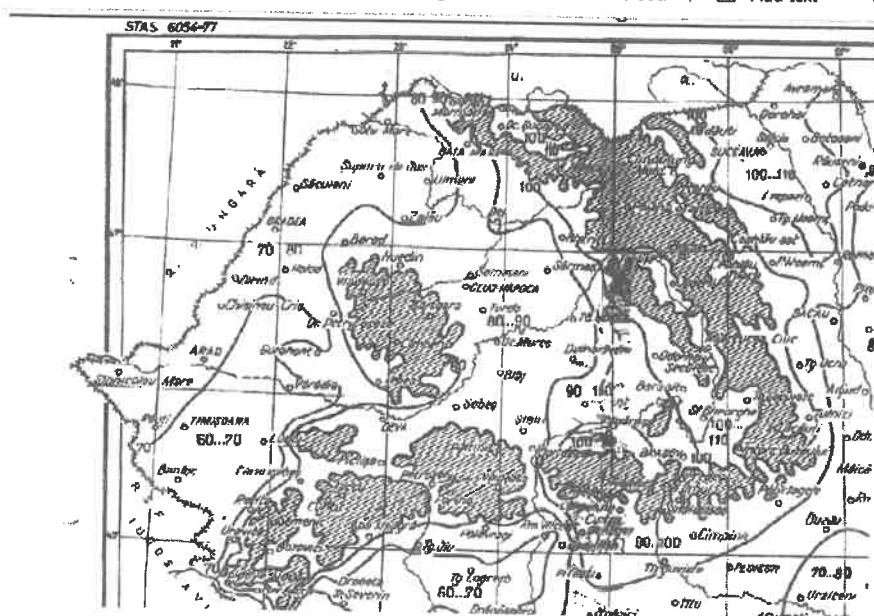

Conform Normativului P100/2013 amplasamentul se află în zona cu perioada de colț $T_c=1,0$ sec și valoarea de vârf a accelerației $a_g=0,35$ cu $IMR = 225$ ani și 20% probabilitate de depășire în 50 de ani:

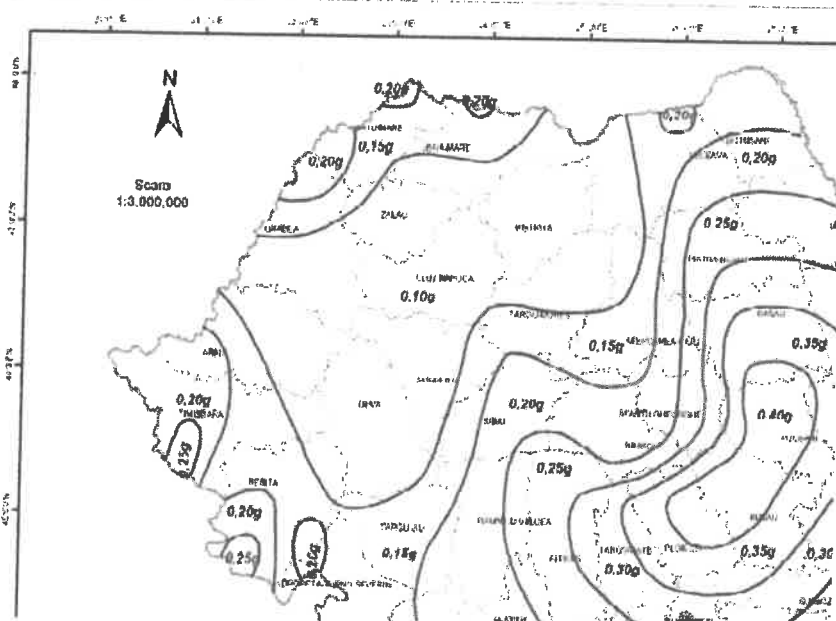


Harta zonării în termeni de valori de vârf ale accelerației terenului a_g cu $IMR=225$ ani și 20% probabilitate de depășire în 50 de ani.

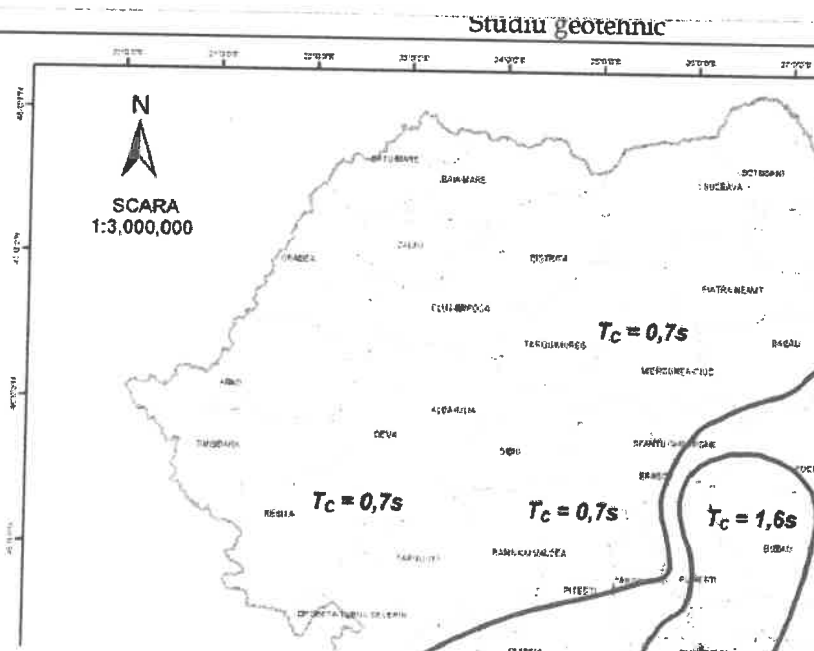

Harta zonării în termeni de perioada de control (colț), T_c a spectrului de raspuns.


Conform STAS 11100/1/93 – terenul se încadrează în zona cu gradul 8 de seismicitate:

Conform STAS 11100/1/93 – terenul se încadrează în zona cu gradul 8 de seismicitate(fig 6).

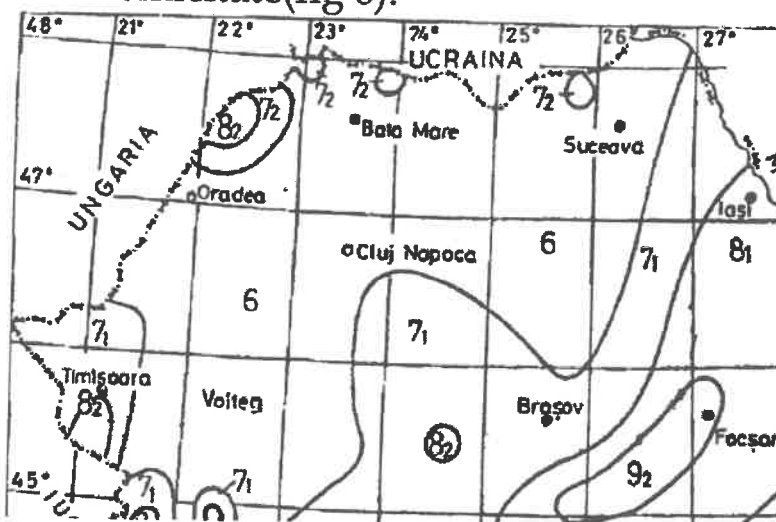

Harta zonării după gradul de intensitate al cutremurelor

Încărcările date de zăpadă conf Codului de Proiectare: Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor, indicativ CR 1-1-3/2012, având IMR 50 ani, are valori de 2,5 KN/mp:

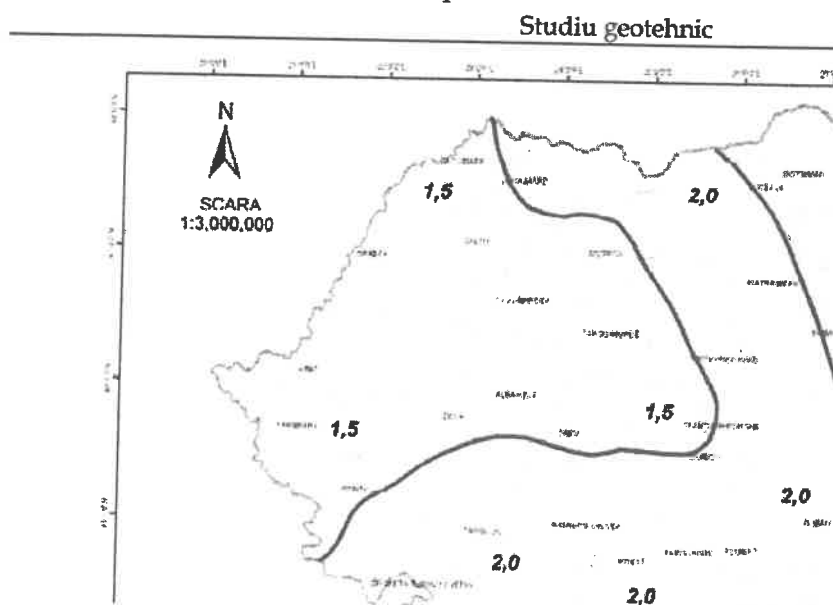

Zonarea valorilor caracteristice din zăpada pe sol s_k , in kN/m^2 , pentru altitudini $A=1000$




PRO-ARHIMED S.R.L.

CIF.31085762; J40/1006/2016; TEL: 0720538138; arhimd@yahoo.ro

Presiunea de referință a vântului conf. "Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor", indicativ CR 1-1-4/2012 pe interval de recurență de 50 ani, este de 0,6 kPa:

interval de recurență de 50 ani este de 0,6 kPa:

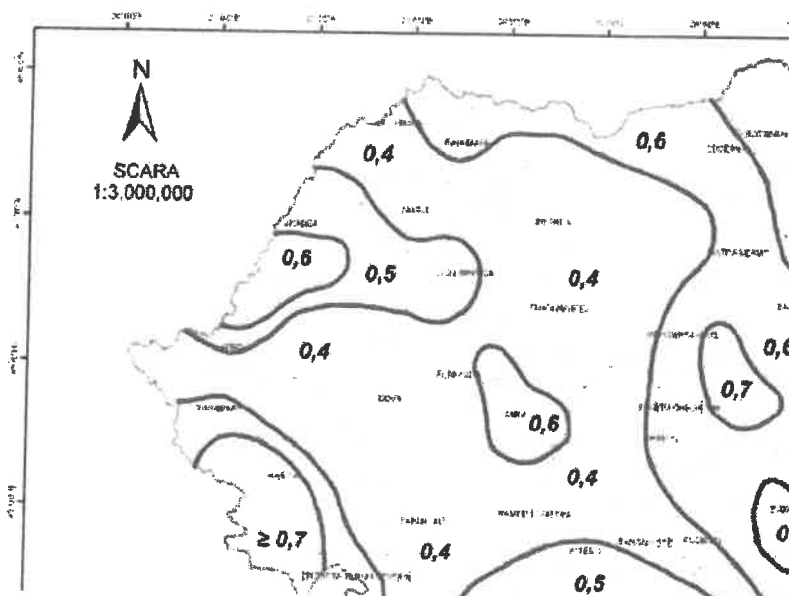

Zonarea valorilor de referință ale presiunii dinamice a vântului în kPa, având IMR=50 ani.

Stabilirea categoriei geotehnice

Încadrarea în categoria geotehnică se face în conformitate cu Normativul NP 074/2014 "Normativ privind principiile, exigențele și metodele cercetării geotehnice a terenului de fundare". Categoria geotehnică a sistemului construcție – teren indică riscul geotehnic la realizarea unei construcții.

Riscul geotehnic depinde de 2 grupe de factori: - factori legați de teren – condiții de teren și apă subterană- factori legați de structura și vecinătățile acestora.

Factori avuți în vedere:

1 Condiții de teren:	teren mediu	3 puncte
2 Apă subterană:	fără epuizmente	1 punct
3 Grad de importanță a construcției:	reduc	2 puncte
4 Vecinătăți fără riscuri:		1 punct
5 Zona seismică de calcul $a_g > 0,25$		3 puncte

Total punctaj 10 puncte

Categoria geotehnică II (Risc moderat)



PRO-ARHIMED S.R.L.

CIF.31086762; J40/1006/2016; TEL.: 0720538138; arhimd@yahoo.ro

Încadrarea în zone de risc natural

Încadrarea în zonele de risc natural la nivel de macrozonare, a ariei pe care se găsește zona de amplasament a drumului, se face în conformitate cu Monitorul Oficial al României – Legea nr.575/ noiembrie 2001, lege privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului național – secțiunea V-a zone de risc natural.

Riscul este o estimare matematică a probabilității producerii de pierderi umane și materiale pe o perioadă de referință viitoare și într-o zonă dată pentru un anumit tip de dezastru.

Factorii de risc avuți în vedere sunt :

1. Cutremurele de pământ – zona cu intensitate seismică 8 (M.S.K.) cu o perioadă de revenire la 50 ani.
2. Alunecări de teren - aria studiată se încadrează în zone cu potențial de producere a alunecărilor scăzut, fără risc de alunecare.

Cercetarea terenului

În vederea întocmirii studiului, am executat un foraj de 4" la adâncimea de 5,00m, am efectuat cartarea versantului văii de la partea sudică și de asemenea am consultat diferite studii întocmite pentru construcții din zona: sala de sport, biserica, locuințe.

În urma corelării datelor obținute rezultă următoarele :

Stratificație: Pe toată adâncimea forajului a fost identificat praf, praf argilos și praf nisipos uscat la suprafață, tare și plastic vârtos către adâncime.

Din determinările de laborator rezultă că terenul este sensibil la umezire gupa A, conform NP 125/2010.

Din cartarea versantului rezultă că litologia terenului păstrează până la 15-20m unde apare nisip cu pietriș.

Nu apare apa subterană în foraj.

Caracteristicile fizico-mecanice au valori de:

Nr	Denumire	Simbol	UM	Valori de calcul
1	Granulometrie			
	Argilă	A	%	21
	Praf	P	%	64
	Nisip	N	%	15
2	Limita de curgere	W_L	%	30
3	Limita de frământare	W_P	%	17
4	Indice de plasticitate	I_p	%	13
5	Indice de consistență	I_c	-	1
6	Umiditate	W	%	10- 11
7	Greutate vol. manual	γ_w	KN/m ³	16,5



PRO-ARHIMED S.R.L.

CIF. 31086762; J40/1006/2016; TEL: 0720538138; arhimd@yahoo.ro

8	Porozitate	N	%	44
9	Indice de porozitate	E	-	0,79
10	Greutate vol. uscată	γ_u	KN/m ³	15
11	Modul de def. edometric	M ₂₋₃	daN/m ³	70
12	Tasare specific la 2daN	e _{p2}	cm/m	3
13	Tasare suplimentară la umezire	i _{m3}	cm/m	3-5

Concluzii și recomandări:

Amplasamentul pe care urmează să se amplaseze monumentul este ușor înclinat, mărginit la partea sudică de peretele văii, la est de teren agricol, la nord de locuință și la sud de drumul de acces.

Adâncimea de fundare a monumentului va fi de minimum 1,50m față de cota terenului natural, cu condiția depășirii stratului de umpluturi și sol vegetal.

Presiunea convențională de calcul conf. STAS 3300/2/85 și Normativului NP112/2014 pentru adâncimea de -2,00 m și o lățime a fundațiilor de 1,00m, pe stratul de praf nisipos galben, este de:

200 kPa pentru încărcări fundamentale centrice

Pentru alte adâncimi și lățimi ale fundațiilor se aplică corecțiile din STAS 3300/2/85 și anume:

$$p_{conv} = p_{conv} + C_D + C_B \quad \text{kPa}$$

$$C_D = p_{conv} \cdot (D_f - 2) / 4 \quad \text{kPa}$$

$$C_B = p_{conv} \cdot k_1 (B_f - 1) \quad \text{kPa}$$

unde,

D_f – adâncimea de fundare

B_f - lățimea fundației

C_D – corecție de adâncime

C_B – corecția de lățime

Pentru amplasarea terenului sistematizat va fi necesară nivelarea terenului și posibil ridicarea cotei terenului prin amenajarea unei platforme de pământ compactat. Ø

În funcție de cotele fundațiilor, va fi stabilită grosimea umpluturilor (perna de pământ).

Pământul (praf argilos galben) va fi adus dintr-o groapă de împrumut.

Platforma statiei nu se va apropia cu mai mult de 15m de baza malului.

Pentru realizarea platformei, pământul adus pentru compactare va fi așternut în straturi de 25 cm.

Compactarea se va face cu cilindrul compactor de 10-12 t cu 8-10 treceri pe unitatea de suprafață.

Gradul de compactare a pământului compactat va fi de 97-98%, respectiv 16-16,5 kN/m³ față de determinarea Proktor.



PRO-ARHIMED S.R.L.

CIF.31086762; J40/1006/2016; TEL: 0720538138; arhimed@yahoo.ro

Umiditatea materialului va fi de 16-18%. Ø Vor fi realizate probe pentru verificarea gradului de compactare.

Capacitatea portantă a pernei va fi de 150 kPa. La proiectare, execuție și exploatare vor fi respectate următoarele măsuri generale:

După ridicarea construcției la cota $\pm 0,00$ se vor executa trotuare etanșe de 1,00m lățime, cu pantă 5% către exterior.

Distanța minimă a fundațiilor construcției față de rețelele montate în canale de protecție este de 1,50m.

Nu se va permite stagnarea apelor pe amplasament și nici în săpăturile pentru fundații.

Ultimul strat de cca. 20cm la săpături va fi excavat pe porțiuni eșalonate în măsura posibilităților de execuție a fundațiilor în ziua respectivă și imediat înaintea turnării betonului în fundații.

Imediat după decofrarea elevațiilor, golurile rămase în jurul fundațiilor și în interior vor fi umplute cu pământ, compactat în strate de 20-30 cm grosime la un grad de compactare $D_{min}=95\%$.

Nu se va întrerupe execuția decât după terminarea infrastructurii acoperite și realizarea umpluturilor în jurul fundațiilor.

În proiectare și execuție se vor respecta prevederile normativelor C.169/88 privind executarea lucrărilor de terasamente, C.29/85 privind îmbunătățirea terenurilor de fundare slabe, prin procedee mecanice, C.56/85 privind verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții și instalații aferente.

Pe tot parcursul executării săpăturilor vor fi respectate Normele de protecție a muncii pentru astfel de lucrări.

La deschiderea săpăturilor pentru fundații și înainte de turnarea betoanelor se va chema pe șantier întocmitorul prezentului studiu geotehnic pentru recepționarea terenului de fundare și avizarea turnării betonului. Confirmarea terenului de fundare și avizarea favorabilă pentru turnarea betoanelor se va face prin semnarea procesului verbal de recepție a naturii și a calității terenului de fundare. Lipsa acestui proces verbal disculpă geotehnicianul de orice răspundere privind construcția nou proiectată.

Prezentul studiu geotehnic este valabil numai pentru perimetrul de teren descis mai sus, orice altă modificare de amplasament impunând efectuarea unui nou studiu geotehnic.

De asemenea, nu răspundem în cazul producerii unor avarii cauzate obiectivelor de calamități naturale sau de nerespectarea recomandărilor menționate în studiu.

Fundul săpăturii va fi compactat nu maiul mecanic de mana.



PRO-ARHIMED S.R.L.

CIF.31086762; J40/1006/2016; TEL: 0720538138; arhimd@yahoo.ro

Recomandăm, de asemenea, următoarele:

- Este indicat ca betoanele să se toarne aderent la pereții săpăturii; dacă acest lucru nu este posibil din motive tehnice, umpluturile de pe lângă fundații se vor realiza imediat după turnarea betoanelor, din argila curată rezultată din săpătură, în straturi de 0.15-0.20 [m] grosime fiecare, compactate cu maiul mecanic la o stare uscată de 1.60 – 1.65[kN/mc];
- Fundațiile se vor rigidiza prin centuri armate;
- Sistematizarea verticală va asigura evacuarea rapidă a apelor din precipitații de pe amplasament;
- Pe perioada execuției săpăturilor de fundare se vor lua măsuri de evacuare rapidă a apelor din precipitații: pompe de epuismen, drenuri etc;
- Este obligatorie verificarea naturii terenului de fundare de către specialistul geotehnician înaintea turnării betoanelor în fundații;
- Verificarea calității umpluturilor de pe lângă fundații și din sistematizarea verticală revine laboratorului de șantier al constructorului și se va efectua conform prevederilor Normativului C 56/85 privind calitatea lucrărilor de construcții și instalații aferente;
- Atât în proiectare, cât și în execuție se vor aplica prevederile Normativului P 125/2010 privind fundarea clădirilor pe terenuri loessoide sensibile la umezire;
- După realizarea săpăturilor care se pot executa și mecanizat, până la o cotă superioară celei din proiect cu 15-20 cm, se va chema proiectantul și geotehnicianul, pentru a analiza condițiile de fundare reale (urmând ca aducerea la cota de fundare din proiect să se realizeze în ziua turnării fundațiilor).

Pentru specificațiile de rezistență, se va consulta proiectul de rezistență- parte componentă a acestui proiect.

La calculul și alcătuirea structurii clădirii s-a urmărit respectarea condițiilor impuse de normativele în vigoare în ceea ce privește asigurarea condițiilor de rezistență, rigiditate, durabilitate și stabilitate concomitent cu obținerea unor soluții constructive simple, economice care să asigure o execuție de calitate.

Planșele prezentului proiect sunt prezentate în borderoul de piese desenate.

Pentru modificări la alcătuirea elementelor structurii de rezistență sau ale materialelor de construcție folosite, se va cere acordul proiectantului și al beneficiarului.

Abaterile de execuție vor trebui să se înscrie în limitele admise de normele în vigoare în țara noastră.

Normative utilizate

Acest material a fost conceput pe baza legilor, normelor și standardelor în vigoare, dintre care amintim:

- Legea 10/1995, modificată în anul 2001, privind calitatea lucrărilor de construcții;



PRO-ARHIMED S.R.L.

CIF. 31086762; J40/1006/2016; TEL: 0720538138; arhimd@yahoo.ro

- Ordonanța guvernului nr. 20/1994, privind punerea în siguranță a fondului construit;
- HG nr. 26/1994- Regulament privind urmărirea comportării în exploatare, intervențiile în timp și post-utilizare a construcțiilor;
- Ordinul 77/N/1996 al MLPAT – Îndrumător de aplicare a prevederilor Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor și execuției lucrărilor de construcții;
- Ordinul 77/N/1996 – Completarea și modificarea cap. 11 și 12 din normativul P100.
- P100-1/2006 Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcțiilor de locuințe, social culturale, agrozootehnice și industriale.
- CR1-1-3-2012 Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor;
- CR0-2012 Bazele proiectării structurilor în construcții;
- NP007-1997 Normativ pentru proiectarea structurilor în cadre din beton armat;
- CR2-1-1.1 Cod de proiectare a construcțiilor cu pereți structurali de beton armat;
- C169-88 Normativ pentru executarea lucrărilor de terasamente pentru realizarea fundațiilor construcțiilor civile și industriale;
- STAS 8924/1-87 Măsurători terestre. Trasarea pe teren a construcțiilor civile, industriale și agrozootehnice;
- NP112-04 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă.
- P133-99 Instrucțiuni tehnice pentru urmărirea comportării în timp a construcțiilor;
- NP-082-2012 Cod de proiectare. Bazele proiectării și acțiuni asupra construcțiilor. Acțiunea vântului.
- C 56 – 85 Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții și instalații aferente.
- NE 012/1-07 -Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat și beton precomprimat;
- NE 012/2-2010 - Normativ pentru producerea și executarea lucrărilor din beton, beton armat și beton precomprimat. Partea 2: Executarea lucrărilor din beton;
- NP 005-2003 Construcții din lemn;
- SR EN 1992: 2006 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton;

Precizări conform legii nr. 10/95

Clădirea se încadrează în clasa de importanță III conform P100/2006.

Categoria de importanță a construcției este „D”, aplicând criteriile de clasificare din HGR. nr. 766.1997.

Gradul de rezistență la foc- II.



PRO-ARHIMED S.R.L.

CIF: 31086762; J40/1006/2016; TEL: 0720538138; arhimd@yahoo.ro

ÎN ATENȚIA BENEFICIARULUI ȘI A CONSTRUCTORULUI

La execuția lucrărilor de construcții și arhitectură se vor folosi numai materiale (betoane, armături, mortare, cărămizi etc.) însoțite de certificate de calitate care să ateste gradul de calitate cerut prin proiect și de normativele în vigoare.

De asemenea, înainte de turnarea betoanelor, pentru fiecare etapă în parte, se vor întocmi procese-verbale de lucrări ascunse sau procese-verbale de recepție calitativă semnate de beneficiar și de constructor, acte ce vor sta la baza întocmirii cărții construcției.

De menționat că pentru beneficiar, va urmări lucrările și va semna procesele-verbale un diriginte de șantier autorizat de Inspectoratul de Stat în Construcții (condiție obligatorie).

Dacă beneficiarul dorește ca proiectantul lucrării să participe la recepția unor etape ale execuției, acesta va fi anunțat cu cel puțin 3 zile înainte.

În cazul în care proiectantul nu este chemat să participe la recepții, se consideră că beneficiarul și constructorul își asumă integral răspunderea pentru execuția lucrărilor.

O atenție deosebită se va acorda monitorizării tasărilor. Pentru aceasta la faza DTDE, beneficiarul va cere întocmirea unui proiect de urmărire în timp a construcției, atât urmărire în timpul execuției, cât și monitorizare periodică pe parcursul existenței construcției.

Toate defecțiunile semnalizate vor fi consemnate în cartea construcției, înscrind-se data (ora, ziua, luna, anul) când au fost semnalate, cine și când s-a sesizat întreprinderea de reparații, când s-au făcut remedierile (data), de către cine și ce calitate avea persoana în cauză.

Protecția muncii

La execuția lucrărilor de construcții aferente prezentului studiu, constructorul va lua toate măsurile necesare pentru respectarea normelor actuale de protecție și securitate a muncii pentru acest gen de lucrare.

Lucrările cuprinse în prezenta documentație nu se vor executa decât după obținerea Autorizației de construire.

Date privind funcționalitatea ansamblului

Din punct de vedere funcțional, proiectul cuprinde următoarele:

- Funcțiune cu caracter comemorativ și ceremonial pentru eroii primului război mondial, a evenimentelor din acea epocă și de informare asupra acestora.
- Funcțiune cu caracter social – spații libere pentru odihnă și recreere, într-un context plăcut și relaxant unde va fi încurajată și facilitată socializarea între toți cetățenii, din toate categoriile de vârstă, venituri, apartenență etnică, ocupație.



PRO-ARHIMED S.R.L.

CIF. 31086762; J40/1006/2016; TEL: 0720538138; arhimed@yahoo.ro

- Funcțiune de spațiu pentru relaxare, petrecere a timpului liber – aici își vor putea petrece timpul liber atât copii cât și adulții.

- Funcțiune cu caracter estetic – de pe promontoriu, se va putea observa întreaga panoramă a văii Siretului, spațiile formate în cadrul ansamblului prin natura materialelor folosite la finisaje; prin textură, acestea vor crea un aspect plăcut astfel încât să pună în valoare arhitectura parcului.

- Funcțiunea cu caracter educațional – materialul și informațiile prezentate pe panourile informative vor fi un excelent ghid pentru școlari, dar și pentru alte persoane interesate de a cunoaște istoria locului, legende militare, date și fapte despre istoria evenimentelor din primul război mondial. Un alt punct forte va fi punctul de belvedere care va ajuta și mai mult la înțelegerea evenimentelor militare, prin marcarea locurilor de dispunere a trupelor participante la conflagrație, marcarea traseelor de atac, traiectorii ale munițiilor.

Spațiile sociale și de recreere nou create prin proiect vor fi folosite de toți locuitorii comunei Cosmești, precum și de către vizitatori și turiști, fără discriminări legate de sex, naționalitate, religie, vârstă, venituri, încurajând astfel socializarea și construirea identității comunitare și naționale.

Sistemul constructiv / structural al obeliscului- cruce, este din beton armat monolit.

Fundațiile sunt pilotate la adâncimea menționată în proiectul de rezistență și sunt dimensionate în funcție de tipul de structură, adâncimea de îngheț și tipul solului.

Finisajul exterior este cu un aspect de beton aparent cu pigment.

Finisaje

- Beton amprentat, tratat diferit în funcție de destinație (cale de acces și parcare/ platou de ceremonial, platformă pentru amplasare obuziere;
- Beton proiectat pe versantul dealului în vederea consolidării și hidroizolării pentru a se evita eventuale eroziuni de la apele meteorice;
- Balustradă perimetrală- se recomandă a fi din elemente de beton, cu vopsitorii albe, cu vopsea reflectorizantă.

Siguranța în exploatare

a) Circulația pietonală exterioară

- circulația interioară sitului este pietonală, excepție făcând calea de rulare și parcare unde se va intra și cu autoturisme cu MMA 3,5t.

-intrarea în incintă va fi prevăzută în legătură și la nivel cu trotuarul existent;



PRO-ARHIMED S.R.L.

CIF.31086762; J40/1006/2016; TEL.: 0720538138; arhimed@yahoo.ro

- stratul de uzură al căilor pietonale va fi din materiale antiderapante (nealunecoase umede sau uscate), cu coeficientul de frecare min. 0.4
- denivelările prevăzute pe circulațiile pietonale vor fi de max.2.5cm; în realizarea proiectului se are în vedere eliminarea barierelor arhitectonice.

b) Iluminatul artificial

Se va asigura iluminatul normal în întreg obiectivul.

c) Igiena, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului

- se va asigura iluminat electric conf. proiectelor pe specialități;
- finisajele utilizate nu sunt generatoare de praf, mirosuri și alte noxe;
- evacuarea gunoaielor se va face prin depozitarea acestora conform principiului de colectare selectivă, în pubele și preluarea lor de către firme specializate, fiind transportate la groapa de gunoi a localității.

Instalația electrică va fi realizată conform normelor în vigoare și se va realiza conform proiectului de specialitate.

d) Măsuri P.S.I.

Construcția se încadrează în **gradul III de rezistență la foc**.
Riscul de incendiu este mic.

e) Caracteristici tehnico-spatiale

- Regimul de înălțime : PARTER
- Suprafața construită la sol este de 119,45 mp.
- Suprafața constr. desfășurată 119,45 mp.
- H max = 13,77m (față de CTA)
- Categoria de importanță a clădirii „D” conf. HGR 766/97
- Gradul de rezistență la foc : III
- Risc de incendiu: mic
- Clasa de importanță: IV

2.3 Date tehnice ale investiției:

a) Zona și amplasamentul;

Comuna Cosmești, Teritoriul Administrativ al comunei Cosmești, județul Galați

Terenul, în suprafață totală de 1.031,77 mp, este situat în intravilanul comunei Cosmești, sat Cosmești, str. Magnoliei, nr.27, județ GALAȚI și este format din terenul în suprafață de 780,00 mp, cu Număr Cadastral/Carte Funciară 107159 și o suprafață de aproximativ 251,77 mp din finalul străzii Magnoliei, care, în prezent, nu este amenajată, fiind teren arabil, în continuarea terenului cu CF 107159. Această



PRO-ARHIMED S.R.L.

CIF: 31086762; J40/1006/2016; TEL: 0720538138; arhimed@yahoo.ro

extensie, face parte din domeniul public al comunei. Extinderea sitului până la marginea promontoriului este necesară din condiții de vizibilitate și pentru că, în realitate, punctul de observare al evenimentelor se afla pe marginea dealului.

Terenul are acces din strada Magnoliei și aparține domeniului public al comunei Cosmești. Parcul este delimitat pe celelalte laturi de proprietățile cetățenilor din comună.

La Nord:	Proprietate privată, Bostan Nicolae, pe o lungime de 40,64 ml
La Sud:	Primăria Cosmești- teren viran sub formă de taluz, pe o lungime de 33,16 ml
La Est:	Proprietate privată Nr. Cad. 107185, pe o lungime de 27,04 ml
La Vest:	Primăria Cosmești- teren viran sub formă de taluz, pe o lungime de 28,12 ml

b) Statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat este acela de: „curți construcții”.

Terenul, în suprafață totală de 1.031,77 mp, este situat în intravilanul comunei Cosmești, str. Magnoliei, nr. 29, județ GALAȚI.

Regimul juridic al terenului

Terenul este liber de construcții, aparține domeniului public și la solicitarea beneficiarului, prin tema de proiectare, se dorește construirea unui sit de for public format dintr-un monument comemorativ, platou ceremonial, panouri informative și o zonă de belvedere. Terenul în suprafață de 780,00 mp, cu Număr Cadastral/Carte Funciară 107159, este o donație din partea familiei Bârlădeanu. Suprafața în completare, de aproximativ 251,77 mp din finalul străzii Magnoliei, care în prezent, nu este amenajată, fiind teren arabil în continuarea terenului cu CF 107159, se află în domeniul public al comunei Cosmești. Extinderea sitului până la marginea promontoriului este necesară din condiții de vizibilitate și pentru că, în realitate, punctul de observare al evenimentelor se afla pe marginea dealului.

Regimul economic al terenului

- **Folosința actuală:** teren liber de construcții
- **Propunere și solicitare Autorizație de Construire pentru:**
„CONSTRUIRE MONUMENT EROI ÎN LOCALITATEA COSMEȘTI,
COMUNA COSMEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI”
- **Regimul tehnic al proiectului**



PRO-ARHIMED S.R.L.

CIF: 31086762; J40/1006/2016; TEL: 0720538138; arhimd@yahoo.ro

Lucrările de construire se încadrează în:

- Clasa IV de importanță, cf. codului P100-2006.
- Categoria de importanță **D**, conform HG 766 / 1994.
- Gradul III rezistență la foc, conform P118 / 1999.
- Risc mic de incendiu, conform P118 / 1999.

La amplasarea obiectivului, se au în vedere:

- Asigurarea unei circulații fluente;
- Respectarea codului civil;
- Respectarea normelor de igienă;
- Respectarea normelor de protecție a mediului.

c) Situația ocupărilor definitive de teren: suprafața totală, reprezentând terenuri din intravilan /extravilan

Situația ocupării definitive de teren va rezulta în urma construirii și amenajării investiției cu dotările prevăzute conform planului de situație propus.

- **S teren= 1.031,77 mp**
- **S ocupată definitiv = 119,45 mp.**
- **Regimul de înălțime : PARTER**
- **Suprafața constr. desfășurată 119,45 mp.**
- **H max = 13,77m (față de CTA)**

Din care:

- **Lucrări de arhitectură peisageră: 35,00mp.**
Plantarea de arbuști și arbori ornamentali pentru dublarea gardului posterior, însămânțarea cu gazon;
- **Amenajarea de spații de odihnă: 4 bănci.**
Se dispun bănci din lemn paralel cu aleea care conectează parcare.
- **Amenajare alei platouri pentru ceremonii, 519,10 mp.**
Îmbrăcăminte din beton amprentat pe un strat suport din beton, conform detaliilor anexate.
- **Obelisc în formă de cruce, 119,45 mp.**
Realizat din beton armat monolit, pe o fundație de piloți, conform proiectului de rezistență; soclul se va realiza din beton armat monolit cu umplutură de pământ compactat în straturi. În partea superioară se va realiza un planșeu din beton slab armat direct pe umplutură. Soclul se va placi cu granit negru.
- **Platouri pentru dispunerea obuzierelor și platou belvedere, 64,00 mp.**
Realizate din beton armat monolit, cu umplutură de pământ compactat în straturi. În partea superioară, se va realiza un planșeu din beton slab armat direct pe umplutură. Întregul soclu se va placi cu granit negru.



PRO-ARHIMED S.R.L.

CIF. 31086762; J40/1006/2016; TEL: 0720538138; arhimed@yahoo.ro

➤ **Balustradă cu baluștri ornamentali, 53,20 m.**

Realizate din beton armat, cu vopsitorii albe de exterior. La inflexiuni sau la fiecare 2,5 metri se vor amplasa stâlpi pentru susținerea și rigidizarea balustradei. Soclul va avea fundație conform planurilor de rezistență.

➤ **Panouri informative, 64,00 mp.**

Realizate din zidărie de cărămidă cu centuri și stâlpișori din beton armat monolit. Se propune un finisaj de tencuială simplă decorativă. Ulterior se vor fixa informațiile imprimate pe suport plastic, pentru acestea urmând a fi creat design-ul în funcție de volumul de informație care se dorește a se prezenta.

d) Studii de teren

Caracteristicile fizico – mecanice

- Studiile topografice cuprind planuri topografice cu amplasamentul reperelor, listele cu reperi în sistem de referință național - s-a întocmit o ridicare topografică, inclusiv a versantului asupra căruia se va interveni în vederea consolidării și căptușirii cu beton proiectat pentru împiedicarea pătrunderii apelor meteorice.
- Studiul geotehnic cuprinzând fișele complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare.
- Alte studii de specialitate necesare, după caz - nu s-au întocmit

Rezultatele din studiul geotehnic întocmit de S.C. GEOSTAR PROCONS S.R.L. în luna aprilie, anul curent:

Factorii de risc avuți în vedere sunt:

1. Cutremurele de pământ – zona cu intensitate seismică 8 (M.S.K.), cu o perioadă de revenire la 50 ani.
2. Alunecări de teren- aria studiată se încadrează în zone cu potențial de producere a alunecărilor scăzut, fără risc de alunecare.

În vederea întocmirii studiului, am executat un foraj de 4" la adâncimea de 5,00m, am efectuat cartarea versantului văii de la partea sudică și de asemenea, am consultat diferite studii întocmite pentru construcții din zonă: Sala de sport, Biserica, Locuinte.

În urma corelării datelor obținute, rezultă următoarele : Stratificație: Pe toată adâncimea forajului a fost identificat praf, praf argilos și praf nisipos uscat la suprafață, tare și plastic vârtos către adâncime.

Din determinările de laborator rezultă că terenul este sensibil la umezire-gupa A, conform NP 125/2010.

Din cartarea versantului rezultă că litologia terenului păstrează până la 15-20m, unde apare nisip cu pietriș.

Nu apare apa subterană în foraj.



PRO-ARHIMED S.R.L.

CIF.31086762; J40/1006/2016; TEL.: 0720538138; arhimd@yahoo.ro

Principalele caracteristici fizico-mecanice ale prafului nisipos argilos macroporic de culoare galbuie care constituie terenul de fundare sunt următoarele:

- umiditatea naturală $W = 10-11 \%$;
- limita de frământare $WP = 17$;
- limita de curgere $WL = 30$;
- plasticitate medie $IP = 17 - 21\%$;
- indicele de consistență $IC = 1$ (consistență plastic vârtoasă);
- greutatea volumetrică în stare naturală $\rho_s = 16,5 \text{ KN/mc}$
- greutatea volumetrică în stare uscată $\rho_a = 15,0 \text{ KN/mc}$
- porozitatea $n = 44 \%$;
- indicele de porozitate $e = 0.79$;
- modulul de deformare liniară $M_{2-3} = 70 \text{ daN/cm}^2$
- coeziunea $c = 0.12 - 0.14 \text{ [daN/cmp]}$;
- tasarea specifică $E_{p2} = 3.0 \text{ [cm/m]}$;
- tasarea suplimentară la inundare 3.5 [cm/m] ;

Aceste caracteristici indică un teren normal de fundare, compresibilitate medie în condiții obișnuite (precipitații scăzute, vreme uscată etc.); compresibilitatea acestui teren crește totuși în condiții nefavorabile către medie-mare, fără a avea însă o sensibilitate deosebită la umezire.

Prin programul de lucrări adoptat, executantul este obligat să prevadă scenarii de intervenție în caz de avarii înregistrate, prin care să limiteze consecințele unor accidente tehnologice cu efecte grave asupra construcției de bază sau asupra construcțiilor amplasate în zona de influență a lucrărilor.

După realizarea săpăturilor care se pot executa și mecanizat până la o cotă superioară celei din proiect cu 15-20 cm, se va chema proiectantul și geotehnicianul pentru a analiza condițiile de fundare reale (urmând ca aducerea la cota de fundare din proiect să se realizeze în ziua turnării fundațiilor).

Înainte de a se turna fundațiile, se va realiza montarea instalațiilor de apă și canalizare.

e) Caracteristicile principale ale construcțiilor din cadrul obiectivului de investiții

Soluțiile propuse prin prezentul studiu urmăresc respectarea următoarelor criterii:

- realizarea unei tehnologii moderne, performante de mare fiabilitate, care să permită o exploatare comodă;
- respectarea normelor, a standardelor și a legislației în vigoare cu privire la calitate, protecția mediului, sănătate, tehnica securității muncii, protecție la foc, cutremure, exploatare;



PRO-ARHIMED S.R.L.

CIF. 31086762; J40/1006/2016; TEL: 0720538138; arhimd@yahoo.ro

- respectarea specificului arhitectural local.

f) Situația utilităților și analiza de consum INSTALAȚII ELECTRICE

• SOLUȚIA TEHNICĂ PROIECTATĂ

Instalațiile electrice interioare se vor dimensiona pentru tensiunea de 230V ; 50Hz

Obiectul – Realizare iluminat incintă

Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții a legalizat constituirea în România a sistemului calității în construcții. Prin acest sistem se urmărește ca realizarea și exploatarea construcțiilor și a instalațiilor aferente, să aibă o calitate adecvată, în scopul îmbunătățirii condițiilor de confort și de siguranță a utilizatorilor și a protejării mediului înconjurător.

Au devenit obligatorii următoarele cerințe de calitate pentru realizarea și menținerea pe toată durata de existență a construcției:

- rezistență mecanică și stabilitate;
- securitate la incendiu;
- igienă, sănătate și mediu înconjurător;
- siguranță și accesibilitate în exploatare;
- protecție împotriva zgomotului;
- economie de energie și izolare termică;
- utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Aceste obligații revin proiectanților, verficatorilor de proiecte, executanților, responsabililor cu execuția și exploatarea, beneficiarilor, producătorilor de echipamente.

Soluțiile tehnice prevăzute prin prezentul proiect asigură instalațiilor electrice cel puțin primele cinci cerințe de calitate, astfel:

I- Rezistență mecanică și stabilitate

Elementele instalației electrice s-au ales astfel încât aparatele electrice de comutație, tablourile electrice, corpurile de iluminat și dispozitivele de susținere, tuburile de protecție, conductoarele și cablurile să fie corespunzătoare modului de utilizare specific condițiilor din spațiile de amplasare, în ceea ce privește:

- ✓ Rezistența organelor de manevră și a învelișurilor de protecție împotriva loviturilor;
- ✓ Fixarea cu dispozitive care să asigure rezistența la încovoiere și tracțiune;
- ✓ Numărul de manevre mecanice și electrice ;
- ✓ Montarea pe materiale care suportă temperaturile de funcționare;



PRO-ARHIMED S.R.L.

CIF: 31086762; J40/1006/2016; TEL: 0720538138; arhimd@yahoo.ro

- ✓ Asigurarea secțiunii conductoarelor, în vederea evitării creșterii temperaturii peste limita admisă care să producă deteriorări ale izolației proprii, tubulaturii de protecție, a suportilor de prindere ori asupra părților active ale aparatelor;
- ✓ Traversările elementelor de construcții se fac prin zone/locuri special practicate.

II- Securitate la incendiu

Soluțiile tehnice alese pentru rezolvarea temei s-au ales astfel încât să nu favorizeze declanșarea sau extinderea incendiilor datorate instalațiilor electrice, astfel:

- ✓ Instalațiile s-au adaptat la gradul de rezistență la foc al elementelor de construcție și la categoria de incendiu a clădirilor, încât să fie eliminat riscul de izbucnire a unui incendiu din cauza instalației electrice;
- ✓ Tablourile electrice, corpurile de iluminat și aparatele de conectare vor avea carcasele și elementele componente din materiale incombustibile;
- ✓ Pentru limitarea incendiilor de origine internă, la instalațiile electrice se folosesc dispozitive automate de protecție pentru fiecare circuit;
- ✓ Elementele calibrate ale dispozitivelor de protecție se vor înlocui în caz de defect cu altele similare. Nu se vor modifica curenții de declanșare ai întreruptoarelor automate.

III- Igienă, sănătate și mediu înconjurător

- ✓ Iluminatul este asigurat în funcție de destinație și va asigura cerințele cantitative (nivel de iluminare) și calitative (distribuție, culoare, grad de protecție, etc.), în conformitate cu prevederile standardelor în vigoare;
- ✓ Tablourile electrice vor avea grad de protecție corespunzător mediului de lucru și vor fi asigurate împotriva deschiderilor de către persoane neautorizate ori necalificate, vor avea carcasele incombustibile.

IV- Protecția împotriva zgomotului se realizează prin asigurarea confortului acustic în zona echipamentelor electrice ce pot emite zgomote pe perioade scurte de timp;

V- Siguranța și accesibilitatea în exploatare

- ✓ Obiectivul va fi prevăzut cu racord electric asigurat din rețele de joasă tensiune existente în zonă, gradul de asigurare fiind dat de caracteristica rețelei;
- ✓ Consumatorii s-au distribuit pe circuite separate în vederea remedierii rapide a defectelor, fără a fi necesară deconectarea întregii instalații;



PRO-ARHIMED S.R.L.

CIF. 31088762; J40/1006/2016; TEL: 0720538138; arhimed@yahoo.ro

- ✓ Continuitatea electrică a conductoarelor de cupru în doze se va realiza prin cositorire (lipire) sau cleme cu șuruburi, iar la aparate și tablouri electrice, prin șuruburi;
- ✓ Aparatele de conectare, corpurile de iluminat, tablourile electrice, conductoarele și cablurile vor avea gradul de protecție corespunzător locului de montaj, în vederea asigurării protecției utilizatorului împotriva șocurilor electrice;
- ✓ Protecția împotriva supracurenților datorată suprasarcinilor sau scurtcircuitelor care ar putea provoca deteriorarea componentelor instalațiilor electrice se face cu dispozitive automate, mai precis cu întreruptoare automate monobloc, cât și prin protecție diferențială.

VI- Economie de energie și izolare termică

- ✓ Asigurarea protecției la pătrunderea apei în echipamentele electrice se realizează prin utilizarea aparatelor de conectare, corpuri de iluminat, tablouri electrice care au gradul de protecție corespunzător influențelor externe ale mediului înconjurător în care se montează;
- ✓ Economia de energie se face datorită dimensionării corecte a secțiunii conductoarelor circuitelor încât să fie asigurate valorile prescrise ale pierderilor de tensiune pentru receptorul cel mai îndepărtat (dezavantajos) amplasat față de punctul de primire al energiei electrice (pentru iluminat 3%, pentru forță 5%).

VII- Utilizarea sustenabilă a resurselor naturale

- ✓ îndepărtarea obstacolelor pentru valorificarea potențialului tehnologiilor curate în protejarea mediului, în timp ce contribuie la competitivitate și creșterea economică;
- ✓ asigurarea dezvoltării și aplicării tehnologiilor curate;
- ✓ combinarea utilizării durabile a resurselor naturale și a modelelor durabile de producție și consum, ținând cont de creșterea bunăstării și de reducerea impactul asupra mediului asociat acestor acțiuni;
- ✓ stabilirea de obiective și măsuri specifice privind utilizarea resurselor naturale și eficiența energetică;
- ✓ adoptarea de măsuri care să țină cont de parcursul întregului „ciclu de viață” al resurselor și facilitarea schimbului de bune practici și informații în acest sens;

Se propune realizarea unui sistem de iluminat de incintă, precum și un iluminat decorativ pentru evidențierea exponatelor din incintă (cruce, obuziere, catarge și panouri informative).



PRO-ARHIMED S.R.L.

CIF. 31086762; J40/1006/2016; TEL: 0720538138; arhimd@yahoo.ro

Instalația se va dimensiona pentru tensiunea de 230V ; 50Hz

Proiectul va cuprinde următoarele tipuri de instalații:

- alimentarea cu energie electrică;
- instalații electrice de iluminat de incintă;
- instalații pentru protecția contra tensiunilor accidentale de atingere;
- instalații de protecție împotriva electrocutării prin legare la pământ;

Alimentarea cu energie electrică

În prezent incinta nu este alimentată cu energie electrică din rețeaua furnizorului.

Alimentarea cu energie electrică va trebui să satisfacă următorii parametri privind furnizarea energiei electrice:

- puterea instalată totală $P_{it} = 9.5 \text{ kW}$
- puterea simultan absorbită calculată $P_a = 6.5 \text{ kW}$
- tensiunea de alimentare $U_n = 230 \text{ V}$
- frecvența $f = 50 \text{ Hz}$

Din tabloul electric general T.G.D. propus, vor fi alimentate circuitele electrice de iluminat din incintă și cele aferente pentru digitalizare.

Tabloul electric va fi realizat în cutie metalică și PVC cu presetupe de intrare/ieșire, cu grad de protecție IP 65, alimentat de la firida de bransament a furnizorului de energie electrică. Tabloul de distribuție se va prevedea cu cheie și panou de protecție având decupări pentru acționarea protecțiilor pe circuite și pentru citirea diverselor aparate de măsură.

Tabloul electric va fi echipat cu aparataj modern, întrerupătoare automate cu protecție la scurtcircuit și suprasarcină și suplimentar cu protecție diferențială (sensibilă la un curent rezidual de 30mA), după caz.

Se vor prevedea descărcătoare de supratensiuni, pentru protecția receptoarelor electrice cu componente electronice, la supratensiuni apărute accidental pe rețea.

Schema de distribuție a energiei electrice va fi de tip TN-S, separarea nulului de protecție de nulul de lucru realizându-se în tabloul general.

Iluminatul de incintă se va realiza prin intermediul stâlpilor din fontă, în concordanță cu destinația, dotați cu lămpi de tip LED, având înălțimea de 3.5-4m, echipați cu trei brațe.

Instalația de iluminat de incintă se va realiza conform normativului NP 062 – 2002 – Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier. Clasa sistemului de iluminat exterior la care s-a proiectat sistemul de iluminat este P2 cu următoarele caracteristici:

- Iluminare orizontală medie – 10lx;
- Iluminare orizontală minimă – 3 lx;



PRO-ARHIMED S.R.L.

CIF. 31086762; J40/1006/2016; TEL: 0720538138; arhimed@yahoo.ro

- Iluminare semi-cilindrică minimă – 2 lx.

Sistemul de iluminat este format din 4 stâlpi de iluminat cu înălțimea de 3.5-4m, amplasați corespunzător pentru a satisface cerințele luminotehnice specifice, conform planșelor desenate, având câte trei corpuri de iluminat cu puteri de 15 W fiecare, comandați prin intermediul senzorilor de lumină și mișcare și manual de la nivelul T.G.D.. Aceștia se vor monta la o distanță de 0.2-1.00 m de marginea platformelor carosabile, iar montajul acestora se va realiza prin încastrarea acestora în postamente de beton, în fundații izolate din beton simplu, în care se inglobează buloanele de fixare. Distanța între stâlpi de iluminat de 4m va fi de maximum 15m.

Alimentarea corpurilor de iluminat perimetral se realizează din T.G.D.. nou propus pe amplasament, subteran cu cablu CYABY, montat în tub HDPE și cu cablu protejat de tip N2XH 3x 1,5 mmp în interiorul stâlpilor, aprinderea acestora făcându-se cu ajutorul senzorilor crepusculari sau manual, de la nivelul tabloului.

Pentru fiecare stâlp de iluminat se va realiza o priză de pământ a cărei rezistență de dispersie va fi mai mică de 1 ohm, conform RE IP 30 /2004 - Indreptar de proiectare și execuție a instalațiilor de legare la pământ precum și a specificației tehnice ST 42 /2010. Astfel se va realiza o priză de pământ tip C2, formată din platbandă OLZn 40x4mm și 2 țărusi de împământare de 1.5m, distanțați între ei la 1.5m. Platbanda și țăruii se vor poza la o adâncime de îngropare de 0.8m, iar la exterior se va conecta la stâlpul metalic prin intermediul unui bulon de prindere.

Iluminatul decorativ se propune pentru a crea un efect deosebit pe fațada monumentului și a celorlalte exponate exterioare și se va realiza cu proiectoare cu LED-uri, cu lumină albă-rece, cu montaj încastrat/fixat în sol.

Proiectoarele alese trebuie să aibă un grad ridicat de etanșeitate (IP 66), pentru a menține performanța fotometrică inițială pe parcursul duratei lor de viață, iar puterea electrică a acestora va varia în funcție de utilizare, între 5-12 W. Alimentarea proiectoarelor se realizează din T.G.D. nou propus pe amplasament, subteran cu cablu CYABY, montat în tub HDPE, aprinderea acestora făcându-se cu ajutorul senzorilor crepusculari sau manual, de la nivelul tabloului. Se va propune un sistem care să se integreze în iluminatul de incintă și adiacent, astfel încât să nu interfereze cu iluminatul rutier din zonă.

Reclama luminoasă (panoul informativ) exterioară se va proiecta respectându-se pe lângă prevederile I7/2011, recomandările normei SR EN 50107 (standard pe părți) și prevederile instrucțiunilor tehnice ale producătorului. Materialele din care se execută reclama luminoasă trebuie să fie omologate din punctul de vedere al reacției la foc. Distanța de la părțile sub tensiune ale reclamei luminoase amplasată în exterior, până la sol și respectiv până la elemente ale construcțiilor, trebuie să fie de cel puțin:

- 3,0 m până la sol (trotuare etc.);
- 1,5 m până la balcoane, terase, ferestre;
- 3,0 m până la acoperișuri accesibile în mod normal;
- 1,0 m până la acoperișuri inaccesibile în mod normal;



PRO-ARHIMED S.R.L.

CIF. 31086762; J40/1006/2016; TEL: 0720538138; arhimed@yahoo.ro

În cazul în care aceste distanțe nu pot fi respectate, construcția reclamelor luminoase se realizează în așa fel încât să nu permită accesul direct la niciuna dintre părțile ei sub tensiune.

Circuitele de alimentare se execută cu conductoare sau cabluri cu întârziere la propagarea flăcării, iar secțiunea minimă admisă pentru conductoarele de cupru este de $2,5 \text{ mm}^2$. În cazul în care aceste circuite se pozează la exterior, ele trebuie protejate în tuburi metalice etanșe. Circuitele pentru alimentarea firmelor și reclamelor luminoase trebuie prevăzute cu dispozitive de protecție și comandă amplasate în loc accesibil.

Rețeaua electrică propusă va fi montată în șanțuri conform NTE 007, între două straturi de nisip cu o grosime de circa 10 cm fiecare. Peste al doilea strat de nisip se va pune o bandă avertizoare din folie PVC. Adâncimea de pozare pe partea necarosabilă va fi de 0.8 m, iar pe partea carosabilă de 1.2 m și cablul va fi protejat în tub HDPE.

Traseul parcursului în tub (lungimea, schimbările de direcție, razele de curbura) nu trebuie să conducă la solicitări de tracțiune dăunătoare cablului în timpul tragerii. La dispunerea tuburilor se respectă următoarele prevederi: racordarea tuburilor între ele trebuie să fie realizată fără bavuri sau asperități care să conducă la deteriorarea cablului, în cazul subtraversării căilor de circulație, trebuie să se asigure rezistența mecanică și stabilitatea necesară, extremitățile tuburilor se obturează.

Se vor respecta distanțele de siguranță ale cablurilor pozate în pământ față de diverse rețele, construcții sau obiecte, conform normativului NTE 007.

Pentru cablurile afectate de săpături în timpul lucrărilor sau cele care vor fi trase prin noua canalizație se va ține cont ca accesoriile cablurilor, manșoanele și cutiile terminale trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- să nu difere din punct de vedere electric și mecanic de cablul pe care sunt folosite;
- să asigure protecția cablurilor împotriva pătrunderii umezelii și a altor substanțe cu acțiune nocivă sau corozivă din mediul înconjurător;
- să reziste la tensiunile de încercare prescrise pentru cabluri.
 - Manșoanele trebuie să asigure :
 - continuitate perfectă a conductoarelor din cabluri;
 - continuitatea electrică a mantalei electrice;
 - continuitatea electrică a benzilor metalice de armare și a ecranelor metalice;
 - nivelul de izolație;
 - protecție mecanică similară cu cea a cablului;
- la execuția manșonului se va avea în vedere o rezervă de cabluri necesară pentru refacerea de două ori a manșonului;

La cutiile terminale se va lăsa o rezervă de cablu suficientă pentru refacerea o singură dată a cutiei terminale respective;

- La pozarea cablurilor se va prevedea o rezervă de cablu pentru compensarea deformărilor;



PRO-ARHIMED S.R.L.

CIF. 31086762; J40/1006/2016; TEL: 0720538138; arhimd@yahoo.ro

- La pozarea cablurilor trebuie respectate razele minime de curbura admise, date de fabricantul cablului. In lipsa acestor indicații razele de curbura vor fi în conformitate cu NTE 007/08/00.

Pentru protecția împotriva șocurilor electrice prin *atingeri directe*, toate elementele conductoare de curent ale instalațiilor electrice, aflate în mod normal sub tensiune, vor fi inaccesibile unei atingeri întâmplătoare prin alegerea unui aparataj electric cu carcase având grad de protecție adecvat.

Pentru protecția împotriva șocurilor electrice prin atingeri directe s-a prevăzut legarea la pământ a stâlpilor metalici.

Toate părțile metalice ale reclamei luminoase care nu sunt sub tensiune trebuie conectate la instalația de legare la pământ comună a clădirii.

Obiectul – RACORD ELECTRIC JOASĂ TENSIUNE

Alimentarea pavilionului se propune a se realiza din firida de branșament nouă cu cabluri armate de tip CYAbY.

Soluția de alimentare cu energie electrică va fi stabilită de către furnizorul local de energie electrică, conform Avizului Tehnic de Racordar, iar alimentarea cu energie electrică se va realiza prin proiectarea și executarea unei firide de branșament, amplasată la limita de proprietate cu acces din domeniul public.

Se vor respecta normativele în vigoare privind distanțele de montare a cablurilor electrice de joasă tensiune față de alte rețele de utilități din incintă.

Traseele în exterior a cablurilor de tip armat, cu conductoare de Cu, se vor realiza:

- în profil de șanț direct în pământ în zonele înierbate, între 2 straturi de nisip de 0,10 m grosime, la o adâncime de 0,8 m față de cota terenului și semnalizat cu folie de avertizare;
- la traversarea aleilor carosabile, în profil de șanț, în tub PVC greu, montat în strat de beton de 0,30 m grosime, la o adâncime de 1,25 m față de cota terenului și semnalizat cu folie de avertizare.

La intersecții se vor prevedea cămine de tragere pentru cabluri.

INSTALAȚII SANITARE

În această fază a proiectului nu s-au prevăzut instalații sanitare. Beneficiarul va lua decizia dacă pe amplasament va dispune o cabina socială mobilă din PVC, care va fi schimbată și igienizată în baza unui contract cu un operator privat, sau va lua decizia de a construi un grup sanitar cu o fosă septică vidanjabilă.



PRO-ARHIMED S.R.L.

CIF: 31086762; J40/1006/2016; TEL: 0720538138; arhimd@yahoo.ro

f.2.3. INSTALAȚIILE DE CANALIZARE MENAJERĂ

Nu este cazul de ape menajere.

Apele pluviale vor fi ghidate de pe suprafața de beton amprentat printr-o serie de rigole sau pante către marginea versantului.

Protecția apelor și a ecosistemelor acvatice:

Poluanții care pot afecta ecosistemele terestre și acvatice sunt cei rezultați în cazul unor accidente la depozitarea și manipularea combustibililor.

Toate lucrările au fost dimensionate conform legislației în vigoare, în conformitate cu prevederile reglementarilor de mediu.

Protecția atmosferei

Pe toată perioada de proiectare- execuție-întreținere este recomandabil ca factorii locali să urmărească:

- reducerea emisiei diverselor noxe de eșapament sau a uzurii mașinilor, ceea ce va avea un efect pozitiv;
- manipularea materialelor în cadrul proceselor tehnologice reprezintă o altă sursă posibilă de poluare a aerului, în urma căreia pot rezulta pulberi în suspensie;
- utilizarea de utilaje și tehnologii care să nu implice măsuri sociale pentru protecția fonică a surselor generatoare de zgomot și de vibrații;
- respectarea reglementărilor privind protecția atmosferei, inclusiv, adoptarea, după caz, de măsuri tehnologice pentru reținerea și neutralizarea poluanților atmosferici.

Se concluzionează că nu există surse de poluare majoră a aerului în zonele de depozitare a materialelor și în zonele de lucru.

Protecția solului, subsolului și a ecosistemelor terestre

Lucrările de construcție, exploatare și întreținere din mediul rural propuse a se executa prin prezentul studiu de fezabilitate contribuie la îmbunătățirea calității solului, nemaifiind posibile dezechilibre ale ecosistemelor sau modificări ale habitatelor.

Totuși posibile surse care ar putea influența negativ indicatorii de calitate ai solului ca urmare a desfășurării activităților ce se vor realiza pe amplasamentul investiției, sunt următoarele:

- depozitarea necorespunzătoare a solului vegetal rezultat din operațiile de decopertare a gropii de împrumut pentru umpluturi la terasamente și amenajarea necorespunzătoare a gropii de împrumut după finalizarea lucrărilor;
- scurgerile accidentale de carburanți și lubrefianți de la autoturismele vizitatorilor care vor vizita situl.



PRO-ARHIMED S.R.L.

CIF. 31086762; J40/1006/2016; TEL: 0720538138; arhimed@yahoo.ro

Protecția solului, subsolului și a ecosistemelor terestre

Lucrările de construcție, exploatare și întreținere din mediul rural care vor fi clasate ca deșeuri, sunt materiale rezultate din decapări și din săpături. În activitatea de construcție și întreținere, se va ține seama de reglementările în vigoare privind colectarea, transportul, depozitarea și reciclarea deșeurilor.

Obligațiile care rezultă din prevederile Legii nr. 137/1995 sunt următoarele:

- se vor recicla deșeuri re folosibile, prin integrarea lor, în măsura posibilităților, în lucrările de construcții, în conformitate cu încercările de laborator;
- se vor respecta condițiile de refacere a cadrului natural în zonele de depozitare, prevăzute în acordul și/sau în autorizația de mediu;
- întreținerea utilajelor și a vehiculelor folosite în activitatea de construcție și întreținere, se efectuează doar în locuri special amenajate, pentru a evita contaminarea mediului.

Protecția așezărilor umane și a oamenilor

Soluția tehnică proiectată nu prevede utilizarea sau manipularea de substanțe toxice periculoase pe parcursul execuției sau întreținerii ulterioare a construcției.

Beneficii ce vor rezulta în urma realizării investiției propuse

Măsuri de protecție a mediului propuse

În urma evaluării potențialilor factori de risc pentru mediu, menționați mai sus, propunem urmărirea respectării, pe durata realizării și a exploatarei lucrării, a următoarelor măsuri:

Calitatea aerului se menține:

- prin stropirea cu apă a straturilor de pământ la compactarea terasamentelor;
- autovehiculelor ce vor transporta nisip, li se va impune circulația cu viteză redusă în interiorul comunei;
- beneficiarul nu va accepta utilizarea de utilaje, vehicule sau echipamente ce emană fum; în acest caz, va înștiința constructorul și va urmări îndepărtarea acestora din șantier;

Eroziunea solului se previne:

- prin lucrări de înierbare a zonelor afectate, pentru stoparea eroziunii terenului;
- terasamentele se vor acoperi cu solul vegetal decopertat de pe amplasament;
- Contaminarea solului cu lubrefianți sau combustibili se previne prin:
- combustibilul folosit pe șantier se va depozita la cel puțin 100 de metri de sursele de apă sau fântâni;



PRO-ARHIMED S.R.L.

CIF.31086762; J40/1006/2016; TEL: 0720538138; arhimd@yahoo.ro

- Întreținerea vehiculelor și a utilajelor, încât pierderile de ulei sau de combustibil să nu contamineze solul;
- spălarea autovehiculelor și a utilajelor folosite în timpul procesului tehnologic se va face într-un loc special desemnat de beneficiar, departe de sursele de apă sau de fântâni.

Protecția la zgomot

- se va urmări ca activitățile zgomotoase din timpul lucrărilor de construire să se realizeze în afara orelor de odihnă ale cetățenilor din vecinătate.

SOLUTII PRIVIND ASIGURAREA EXIGENTELOR MINIME DE CALITATE

A.REZISTENȚA ȘI STABILITATEA LA SARCINI STATICE, DINAMICE ȘI SEISMICE

Avându-se în vedere prevederile din Regulamentul privind urmărirea comportării în exploatare, a intervențiilor în timp și postutilizarea construcțiilor, deciziile privind intervențiile din etapa de postutilizare se vor lua de către beneficiar în baza unei documentații tehnice.

În baza prevederilor legislației în vigoare, beneficiarul va trebui să asigure finanțarea proiectării și execuției de către persoane autorizate a lucrărilor de intervenții din perioada postutilizare a construcției, precum și obținerea avizelor și autorizației necesare.

B. SIGURANȚA ÎN EXPLOATARE

La proiectarea lucrărilor de execuție se vor avea în vedere normativele și reglementările naționale și internaționale în vigoare referitoare la siguranța utilizatorilor construcției în exploatare. Astfel, măsurile ce se vor lua, vor trebui să asigure siguranța circulației pedestre a utilizatorilor indiferent de vârstă sau handicap, împotriva riscului de accidentare în timpul deplasării în interiorul, cât și în exteriorul sitului, atât pe orizontală cât și pe verticală (pe căi pietonale, rampe, trepte, scări). Schimbările de nivel se vor marca pentru avertizarea utilizatorilor, evitându-se denivelările accentuate.

Se va asigura siguranța utilizării electrice, în sensul evitării riscurilor de accidentare prin electrocutare, descărcări electrice, explozie.

Prin măsurile de securitatea la intruziune și efracție se vor proteja bunurile împotriva actelor de hoție, vandalism, violență, pătrundere forțată.



PRO-ARHIMED S.R.L.

CIF: 31086762; J40/1006/2016; TEL: 0720538138; arhimd@yahoo.ro

C. SIGURANȚA LA FOC

În general, atât pe parcursul proiectării, cât și în timpul execuției și ulterior în exploatare, se va urmări limitarea izbucnirii și a propagării focului, a fumului și a gazelor fierbinți la construcțiile învecinate.

D. SĂNĂTATEA OAMENILOR ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

Aceste exigențe sunt asigurate prin:

- folosirea materialelor de construcție nepoluante și netoxice;
- alegerea soluțiilor tehnice care să elimine riscul degajării de gaze toxice, particule poluante, radiații periculoase, poluarea sau contaminarea apei, aerului, solului, defectiuni în evacuarea apelor reziduale, a deșeurilor solide sau a fumului.

2.4 Durata de realizare și etapele principale, graficul de realizare a investiției (Anexa 1)

Proiectul propus, așa cum a fost el conceput, a fost descris doar din punct de vedere constructiv, în contextul relației dintre evaluările pe obiecte și devizul general, respectiv cu o durată de execuție de 6 luni. Pentru a descrie etapizat cum se va realiza efectiv, se va prezenta în continuare strategia de contractare, respectiv maniera prin care activitățile proiectului se pregătesc, se realizează și se încheie în contextul duratei și al bugetului disponibil.

Se menționează de asemenea că estimarea duratei de implementare a diferitelor activități ale proiectului (ex. Achiziția publică pentru atribuirea contractului de servicii privind întocmirea proiectului tehnic, achiziția publică pentru atribuirea contractului de lucrări, de supervizare a lucrărilor etc.) trebuie să se justifice prin următoarele considerente:

- Regulile de achiziție publică în conformitate cu legislația română în vigoare pentru acordarea de către beneficiar a unor contracte de achiziție publică de bunuri, servicii și lucrări - se vor respecta cerințele legale în vigoare la momentul achiziției.
- Bunele practici în privința succesiunii unor activități identificate pe drumul critic al proiectului;
- Încadrarea în limitele permise de fondurile programate.

Etapa 1. Realizarea Studiului de Fezabilitate conform H.G. 28/2008 și întocmirea studiilor de teren.

Activitatea 1.1. Atribuirea serviciilor de proiectare pentru realizarea Studiului de Fezabilitate și realizarea studiului de piață pentru întocmirea studiului geotehnic și a măsurătorilor cadastrale.

Descrierea activității:



PRO-ARHIMED S.R.L.

CIF.31086762; J40/1006/2016; TEL: 0720538138; arhimd@yahoo.ro

1. Identificarea nevoilor și realizarea documentației descriptive cu privire la serviciile proiectate solicitate- Întocmirea Notei Conceptuale și a Temei de proiectare;
2. Realizarea unui studiu de piață cu privire la furnizorii serviciilor de proiectare;
3. Cererea de oferte din partea furnizorilor de servicii de proiectare și evaluarea ofertelor;
4. Selectarea firmelor de proiectare câștigătoare;
5. Negocierea, semnarea contractului și realizarea comenzii de incepere a lucrărilor de proiectare.

Responsabil: Primărie localitate Cosmești

Activitatea 1.2. Elaborarea Studiului de Fezabilitate și a Studiului Geotehnic și a documentației topo

Descrierea activității:

1. Realizarea Studiului Geotehnic, documentației topo;
2. Realizarea scenariilor tehnico-economice prin care obiectivele de investiție pot fi atinse și selectarea soluției tehnice optime;
3. Întocmirea analizei cost-beneficiu;
4. Obținerea avizelor și a acordurilor de principiu (Certificat de Urbanism, Acord de Mediu)
5. Recepția Studiului de Fezabilitate;

Responsabil: firma de proiectare contractată și Primăria localității Cosmești

Etapa 2. Realizarea Proiectului tehnic și a detaliilor de execuție a proiectului.

Activitatea 2.1. Organizarea cererii de oferte pentru realizarea Proiectului Tehnic.

Descrierea activității:

1. Elaborarea documentației de atribuire (caiet de sarcini, fișa de date a achiziției, formulare și clauze contractuale obligatorii);
2. Publicarea anunțului de participare la procedura de cerere de oferte;
3. Numirea comisiei de evaluare;
4. Primirea ofertelor;
5. Deschiderea ofertelor și întocmirea procesului verbal de deschidere;
6. Verificarea și evaluarea ofertelor, stabilirea ofertei câștigătoare;
7. Notificarea privind rezultatul aplicării procedurii;
8. Perioada legală de așteptare;
9. Semnarea contractului;
10. Publicarea anunțului de atribuire;

Responsabil: Primăria localității Cosmești

Activitatea 2.2. Întocmirea Proiectului Tehnic și a Documentației Tehnice pentru obținerea autorizației de construire:

Descrierea activității:



PRO-ARHIMED S.R.L.

CIF: 31086762; J40/1006/2016; TEL: 0720538138; arhimd@yahoo.ro

1. Elaborarea Proiectului Tehnic, a listelor cu cantitățile de lucrări pentru ofertanți; Elaborarea detaliilor de execuție, a pieselor scrise și a pieselor desenate, precum și a altor documente necesare realizării proiectului;
 2. Elaborarea caietului de sarcini pentru execuția lucrărilor (documentația standard pentru organizarea licitației de lucrări);
 3. Întâlniri de verificare între membrii echipei de proiect;
 4. Recepția proiectului tehnic;
 5. Obținerea avizelor de construire și a altor documente specificate în cadrul Certificatului de Urbanism;
- Responsabil: firma de proiectare contractată și Primărie localitate Cosmești

Etapă 3: Realizarea lucrărilor de construcții și instalații

Activitatea 3.1. Organizarea licitației pentru atribuirea contractului de execuție a lucrărilor

Descrierea activității:

2. Elaborarea documentației de atribuire - caiet de sarcini, fișa de date a achiziției, formulare și clauze contractuale obligatorii;
3. Publicarea anunțului de participare la procedura de licitație deschisă;
4. Numirea comisiei de evaluare;
5. Primirea ofertelor;
6. Deschiderea ofertelor și întocmirea procesului verbal de deschidere;
7. Verificarea și evaluarea ofertelor, stabilirea ofertei câștigătoare;
8. Notificarea privind rezultatul aplicării procedurii;
9. Perioada de așteptare;
10. Semnarea contractului;
11. Publicarea anunțului de atribuire.

Responsabil: Primăria localității Cosmești

Activitatea 3.2. Organizarea de șantier

Descrierea activității:

1. Organizarea de șantier aferentă lucrărilor de construcții- înainte și paralel cu începerea lucrărilor;

Responsabil: furnizorul de lucrări - societatea de construcții contractată și Primărie localitate Cosmești.

Activitatea 3.3. Realizarea lucrărilor de construcții

Descrierea activității:

1. Execuția lucrărilor de construcții;
2. Monitorizarea lucrărilor de construcții pe toată perioada execuției lucrărilor;
3. Recepția lucrărilor realizate.

Responsabil: firma de execuție contractată și Primăria localității Cosmești.



PRO-ARHIMED S.R.L.

CIF: 31086762; J40/1006/2016; TEL: 0720538138; arhimd@yahoo.ro

Activitatea 3.4. Realizarea lucrărilor de instalații electrice.

Descrierea activității:

1. Execuția lucrărilor de instalații;
2. Monitorizarea lucrărilor de instalații pe toată perioada execuției lucrărilor;
3. Recepția lucrărilor realizate.

Responsabil: firma de execuție contractată și Primăria localității Cosmești.

Activitatea 3.5. Monitorizarea lucrărilor de construcții și instalații

Descrierea activității:

1. Realizarea supervizării lucrărilor de construcții și instalații de către un diriginte de șantier contractat de beneficiar;
2. Asistența tehnică din partea proiectantului;

Durata estimată: pe întreaga perioadă de derulare a lucrărilor de execuție;

Responsabil: Primăria localității Cosmești, dirigințele de șantier și firma de proiectare.

Etapa 4: Monitorizarea proiectului

Activitatea 4.1. Realizarea raportărilor tehnice și financiare intermediare și finale.

Descrierea activității:

1. Întocmirea Rapoartelor tehnice: monitorizarea progresului activităților în raport cu graficul inițial al proiectului; urmărirea rezultatelor obținute în paralel cu monitorizarea derulării activităților; urmărirea evoluției alocării resurselor pe activități; menționarea principalelor probleme survenite și prezentarea modului de rezolvare a acestora; procentul de compatibilitate cu estimările inițiale ale proiectului.
2. Întocmirea Rapoartelor financiare: menționarea cheltuielilor efectuate în perioada de raportare stabilită; urmărirea încadrării în bugetul inițial al proiectului; procentul de cheltuire a sumelor pe capitole bugetare; rectificări bugetare în perioada de derulare a proiectului și efectele acestora; realizarea cererilor de plată.

Responsabil: Primăria localității Cosmești, echipa de proiect și firma de consultanță

Activitatea 4.2. Organizarea unor întâlniri lunare de progres.

Descrierea activității:

1. Întâlniri ale echipei de proiect în vederea analizării stadiului proiectului;
2. Identificarea riscurilor apărute în implementare și măsuri de reducere a acestora.

Durata estimată

Responsabil: Primăria localității Cosmești, echipa de proiect și firma de consultanță.

Etapa 5: Darea în exploatare a obiectivului de investiții.

Activitatea 5. Organizarea recepției finale a obiectivului de investiții



PRO-ARHIMED S.R.L.

CIF. 31086762; J40/1006/2016; TEL: 0720538138; arhimd@yahoo.ro

Descrierea activității:

1. Organizarea unei întâlniri formale cu factorii de interes implicați în derularea proiectului (beneficiar, finanțator, proiectant, firma de construcții);
2. Recepția obiectivului de investiții la terminarea lucrărilor;
3. Realizarea procesului verbal de recepție a obiectivului de investiții.

Responsabil: Primăria localității Cosmești, echipa de proiect și firma de consultanță.
Graficul de realizare a proiectului, cuprinzând perioada de la semnarea notei justificative și până la finalizarea proiectului (fără etapele de pregătire a proiectului), este prezentat în Anexa nr. 1 la prezentul Studiul de Fezabilitate.



PRO-ARHIMED S.R.L.

CIF: 31086762; J40/1006/2016; TEL: 0720538138; arhimo@yahoo.ro

CAPITOLUL 3. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI

3.1 Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general;

Devizul general estimativ, pentru prezentul obiectiv de investiții, s-a întocmit conform HGR nr.28/2008 privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții.

La baza estimării cheltuielilor necesare realizării lucrărilor prevăzute au stat evaluările cantităților de lucrări și a prețurilor unitare, precum și estimările pe bază de indici ale cotelor cheltuielilor aferente implementării proiectului.

Acest capitol include:

Devizul general, conform HG28/2008

Valoarea categoriilor de lucrări s-a stabilit estimativ, pe baza cantităților de lucrări și a prețului acestora în Lei și Euro, exclusiv TVA. La valoarea totală s-a aplicat TVA de 19%.

Devizul general este structurat pe capitole și subcapitole de cheltuieli. Costurile totale estimate în devizele pe obiect, sunt exprimate în devizul general, în mii lei fara TVA și inclusiv TVA și în mii euro, fara TVA și inclusiv TVA.

La TOTAL și TOTAL CHELTUIELI din devizul general este precizată parte de cheltuieli care reprezintă construcții – montaj (C + M).

Devizul general și studiul de fezabilitate se actualizează după încheierea contractelor de achiziție de lucrări, pe baza cheltuielilor legal efectuate până la acea dată și a valorilor rezultate în urma aplicării procedurilor de achiziție de lucrări și servicii, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiție.

Valoarea totală a investiției este de: 680,987 mii lei (valoare cu TVA), reprezentând 138,271 mii Euro, din care construcții-montaj (C+M): 558,960 mii lei (valoare cu TVA), reprezentând 113,494 mii Euro.

Cursul de schimb valutar de referință al BCE din 09.08.2022 este de 4,9250 ron/euro.



PRO-ARHIMED S.R.L.

CIF.31086762; J40/1006/2016; TEL: 0720538138; arhimd@yahoo.ro


Beneficiar: **COMUNA COSMEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI**

Executant:

Proiectant: **PRO ARHIMED S.R.L.**

Obiectivul: **266- CONSTRUIRE MONUMENT EROI ÎN LOCALITATEA COSMEȘTI, COMUNA COSMEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI**

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării



In lei/euro la cursul **4,925** LEI/EURO DIN DATA 09.08.2022

Nr.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (cu TVA)	
		Lei	Euro	Lei	Lei	Euro
1	2	3	4	5	6	7

CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului						
1.1	Obținerea terenului	-	-	-	-	-
1.2	Amenajarea terenului	-	-	-	-	-
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și pentru aducerea terenului la starea inițială	5.000,00	1.015,23	950,00	5.950,00	1.208,12
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	-	-	-	-	-
TOTAL CAPITOL 1		5.000,00	1.015,23	950,00	5.950,00	1.208,12

CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii						
2.1	Obiectul 10. Bransamente.	5.000,00	1.015,23	950,00	5.950,00	1.208,12
TOTAL CAPITOL 2		5000,00	1015,23	950,00	5950,00	1208,12

CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica						
3.1	Studii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	Studii de teren	-	-	-	-	-
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	-	-	-	-	-
3.1.3	Alte studii specifice	-	-	-	-	-
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	-	-	-	-	-
3.3	Expertizare tehnica	-	-	-	-	-
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	-	-	-	-	-
3.5	Proiectare	52.500,00	10.659,90	9.975,00	62.475,00	12.685,28
3.5.1	Tema de proiectare	-	-	-	-	-
3.5.2	Studiu de fezabilitate	-	-	-	-	-
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrarilor de intervenții si deviz general	35.000,00	7.106,60	6.650,00	41.650,00	8.456,85



PRO-ARHIMED S.R.L.

CIF.31086762; J40/1006/2016; TEL: 0720538138; arhimd@yahoo.ro

3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	8.500,00	1.725,89	1.615,00	10.115,00	2.053,81
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	2.500,00	507,61	475,00	2.975,00	604,06
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	6.500,00	1.319,80	1.235,00	7.735,00	1.570,56
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	-	-	-	-	-
3.7	Consultanță	-	-	-	-	-
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	-	-	-	-	-
3.7.2	Auditul financiar	-	-	-	-	-
3.8	Asistență	24.500,00	5.076,14	4.750,00	29.750,00	6.040,61
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	2.000,00	507,61	475,00	2.975,00	604,06
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	2.500,00	507,61	475,00	2.975,00	604,06
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	-	-	-	-	-
3.8.2	Dirigenție de șantier	20.000,00	4.060,91	3.800,00	23.800,00	4.832,49
TOTAL CAPITOL 3		77.000,00	15.736,04	14.725,00	92.225,00	18.725,89

CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază						
4.1	Construcții și instalații	461.214,51	93.647,62	87.630,76	548.845,26	111.440,66
4.1.1	Obiectul 1. Consolidarea sitului prin cămășuirea taluzului vestic.	79.936,60	16.230,78	15.187,95	95.124,55	19.314,63
4.1.2	Obiectul 2. Împrejmuirea obiectivului, (inclusiv balustrada cu baluștri).	45.723,47	9.283,95	8.687,46	54.410,93	11.047,90
4.1.3	Obiectul 3. Realizarea platformelor din beton amprentat.	85.132,40	17.285,77	16.175,16	101.307,56	20.570,06
4.1.4	Obiectul 4. Obelisc în formă de cruce stilizată, inclusiv soclu.	53.170,00	10.795,94	10.102,30	63.272,30	12.847,17
4.1.5	Obiectul 5. Panouri informative.	7.758,00	1.575,23	1.474,02	9.232,02	1.874,52
4.1.6	Obiectul 6. Parcare pentru vizitatori, (inclusiv alee).	17.939,04	3.642,44	3.408,42	21.347,46	4.334,51
4.1.7	Obiectul 7. Amenajare postamente pentru obuziere.	12.960,00	2.631,47	2.462,40	15.422,40	3.131,45
4.1.8	Obiectul 8. Obuziere.	0,00	0,00	-	0,00	0,00
4.1.9	Obiectul 9. Iluminat.	158.595,00	32.202,03	30.133,05	188.728,05	38.320,42
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	-	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	-	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	-	0,00	0,00
4.5	Dotări	3.500,00	710,66	665,00	4.165,00	845,69
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	-	0,00	0,00



PRO-ARHIMED S.R.L.

CIF.31086762; J40/1006/2016; TEL: 0720538138; arhimd@yahoo.ro

TOTAL CAPITOL 4	464.714,51	94.358,28	88.295,76	553.010,26	112.286,35
------------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------

CAPITOL 5 Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de şantier	2.000,00	1.015,23	950,00	5.950,00	1.208,12
5.1.1	Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier	0,00	0,00	-	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării şantierului	5.000,00	1.015,23	950,00	5.950,00	1.208,12
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	10.166,86	2.064,34	0,00	10.166,86	2.064,34
5.2.1	Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare	0,00	0,00	-	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii	2.348,57	476,87	-	2.348,57	476,87
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii	469,71	95,37	-	469,71	95,37
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	2.348,57	476,87	-	2.348,57	476,87
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare	5.000,00	1.015,23	-	5.000,00	1.015,23
5.3	Cheltuieli diverse şi neprevăzute	5.000,00	1.015,23	950,00	5.950,00	1.208,12
5.4	Cheltuieli pentru informare şi publicitate	0,00	0,00	-	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 5		17.166,86	4.094,79	1.900,00	22.066,86	4.480,58


CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste						
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	-	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice şi teste	1.500,00	304,57	285,00	1.785,00	362,44
TOTAL CAPITOL 6		1500,00	304,57	285,00	1785,00	362,44

TOTAL	570.381,37	116.524,14	107.105,76	680.987,12	138.271,50
TOTAL Construcţii+Montaj	469.714,51	95.373,50	89.245,76	558.960,26	113.494,47

Beneficiar
COMUNA COSMEŞTI, JUDEŢUL GALAŢI

Şef proiect
Arh. Dimă G. Mircea
TNA

Ofertant





3.2 Eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției.

Graficul de realizare a investiției este prezentat în Anexa nr.1 la Studiul de Fezabilitate.

CAPITOLUL 4. ANALIZA COST-BENEFICIU

4.1 Identificarea investiției și definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referință

Prin proiectul nostru, *"CONSTRUIRE MONUMENT EROI ÎN LOCALITATEA COSMEȘTI, COMUNA COSMEȘTI, JUDEȚUL GALATI"*, se propune a se realiza o investiție în realizarea unui sit de for public.

Proiectul se încadrează în obiectivele Administrației locale, având o contribuție majoră pentru îmbunătățirea condițiilor de viață ale locuitorilor comunei Cosmești.

Valoarea și beneficiile parcurilor publice s-au pierdut în timp, schimbându-se odată cu schimbarea valorilor sociale. **Parcurile contribuie la bunăstarea oamenilor și a comunităților**, la coeziunea socială, au beneficii turistice și economice și oferă oportunități educaționale. Parcurile și spațiile verzi sunt locuri în care oamenii se întâlnesc pentru a sărbători, pentru a plânge sau a reflecta, pentru a împărtăși succese cu prieteni sau pentru relaxare.

Investiția respectivă urmărește crearea și dezvoltarea serviciilor de bază pentru populația rurală, fiind esențială pentru asigurarea unui nivel de trai decent, pentru creșterea gradului de confort material și psihologic, aducând beneficii sociale și de mediu considerabile.

Obiectivele specifice avute în vedere sunt:

- Dezvoltarea de activități recreative în spații publice;
- Creșterea numărului de locuitori din comună care beneficiază de un spațiu public înfrumusețat.

Oportunitatea investiției este raportată la o perioadă medie de referință de cca. 10 ani.

O infrastructură modernă reprezintă punctul de pornire cheie în transformarea zonelor rurale în zonele atractive în care cetățenii să-și desfășoare activitatea economică și să trăiască.

Principalele domenii care necesită atenție sunt:

- Infrastructura fizică de bază — străzile drumurile comunale; rețelele de alimentare cu apă și de canalizare/tratare a apelor reziduale; infrastructura de alimentare cu energie electrică, termică și gaze;
- Serviciile comunitare de bază — facilități pentru copii și vârstnici; servicii de transport public; facilități de petrecere a timpului liber și sport etc; centre comunitare, cămine culturale și alte facilități culturale; renovarea clădirilor



PRO-ARHIMED S.R.L.

CIF.31086762; J40/1006/2016; TEL: 0720538138; arhimd@yahoo.ro

publice (ex. primării) și amenajări de parcuri, piețe, spații pentru organizarea de târguri etc.)

- Păstrarea și conservarea patrimoniului rural și a identității culturale, a tradițiilor și a obiceiurilor.

Renovarea și dezvoltarea satelor și mai ales îmbunătățirea infrastructurii, ameliorarea calității aerului și a apei nu sunt doar o cerință esențială pentru îmbunătățirea calității vieții și creșterea atractivității zonelor rurale, ci și un element foarte important pentru dezvoltarea activităților economice și pentru protecția mediului.

Satele și zonele rurale trebuie să ajungă în situația de a putea concura eficient pentru atragerea de investiții în paralel cu asigurarea unor servicii adecvate pentru comunitate și a altor servicii sociale aferente pentru populația locală.

Astfel se vor crea noi locuri de muncă, iar personalul care va fi angajat va lucra în condiții conform normativelor în vigoare.

Perioada de referință luată în calcul este de 25 ani.

4.2 Analiza opțiunilor:

1. Varianta „de a face minimum”. Această variantă nu se exclude de la sine în cazul acestui proiect, dar infrastructura propusă a fi realizată nu poate fi făcută funcțională dacă nu se ajunge la caracteristicile tehnice și de exploatare care să corespundă în totalitate normelor tehnice în vigoare în Uniunea Europeană.

2. Varianta „de a implementa proiectul”. Pentru această alternativă se poate aprecia oportunitatea proiectului într-un context regional/ național, respectiv prin comparație cu proiecte similare.

3. Varianta „de a nu face nimic”. În acest caz infrastructura fizică de bază slab dezvoltată în comună este una dintre cauzele care limitează dezvoltarea serviciilor de bază în spațiul rural (facilitățile culturale, recreative, de îngrijire a copiilor și bătrânilor, servicii de transport public etc.). Situația actuală a serviciilor și a infrastructurii afectează puternic calitatea vieții din spațiul rural și constituie o piedică pentru dezvoltarea activităților economice. Prin urmare, este necesară prioritizarea nevoilor și luarea unor măsuri de intervenție în zona, astfel încât implementarea de proiecte realiste să conducă la o calitate a vieții îmbunătățită pentru locuitorii spațiului rural.

Pentru acest tip de proiect s-a efectuat analiza multicriterială pentru variante „cu proiect” în varianta tehnică prezentă și „a se face minimum”, prin aplicarea unor corecții minimale care să justifice efortul investițional. În cel de-al doilea caz totuși nu se poate efectua o analiză fundamentată atât timp cât nivelul minim este perceput în mod diferit, iar finalitatea efortului investițional de multe ori nu este vizibilă, fiind chiar o pierdere financiară pe termen lung, din cauza costurilor mari de întreținere și exploatare.



PRO-ARHIMED S.R.L.

CIF.31086762; J40/1006/2016; TEL: 0720538138; arhimed@yahoo.ro

Pornind de la singura alternativă de perspectivă și totodată durabilă, „de a se implementa proiectul”, în continuare se va efectua analiza multicriterială a soluției tehnico-economice pentru investiție.

La alegerea variantei optime pentru lucrările propuse prin acest proiect au fost considerate și următoarele ipoteze de lucru:

- Realizarea unui proiect cu impact deosebit financiar, social, cultural și economic asupra zonei, printr-o investiție la nivele de costuri cât mai reduse;
- Se va asigura o campanie de informare a populației privind proiectul urmărindu-se conștientizarea beneficiilor;
- Toate lucrările proiectate vor rămâne în proprietatea comunei Cosmești și vor fi gestionate eficient de către operator;
- Finanțarea proiectului este asigurată din donații și sponsorizări.

Pentru evaluarea variantelor studiate au fost considerate următoarele criterii:

- Amplasament existent aflat în proprietatea publică;
- Costuri de investiție reduse;
- Cheltuieli de întreținere mici;
- Refacerea cadrului natural;
- Încadrarea în planul urbanistic general;
- Consumuri minime de materii și materiale în perioada de operare.

Proiectul propus va genera atât cheltuieli, cât și venituri pentru solicitant. Analiza financiară își propune o comparație a cheltuielilor și veniturilor, în situația proiectului.

Perioada de implementare a proiectului este de circa 6 luni. În cazul realizării investiției propuse, proiectul va genera atât costuri, cât și beneficii.

Cheltuielile previzionate după implementarea proiectului sunt de mai multe categorii:

- cheltuieli pentru asigurarea utilităților;
- cheltuieli cu întreținerea curentă;

Proiectul va genera venituri din închirieri.

Cheltuielile de operare vor fi suportate de către beneficiar, veniturile fiind încasate de asemenea de către beneficiar.

4.3 Analiza financiară

Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu sunt realizate ținând cont de elemente principale și anume:

Valoarea totală a investiției este de 680.987,12 mii lei (valoare inclusiv TVA), reprezentând 138.271,50 mii Euro, din care:



PRO-ARHIMED S.R.L.

CIF. 31086762; J40/1006/2016; TEL: 0720538138; arhimd@yahoo.ro

- Construcții-montaj (C+M): 558.960,26 mii lei (valoare inclusiv TVA), reprezentând 113.494,47 mii Euro;
- Orizontul de timp pentru care s-a realizat prognoza este de 10 ani;
- Rata de actualizare folosită pentru calcularea VNA este de 8%;
- Analiza financiară este realizată din punct de vedere al proprietarului infrastructurii;

Datele economice prognozate de către Comisia Națională de Prognoză:

indicator/an	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
inflația(%)	4,7	3,4	2,7	2,5	2,3	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
creșterea preturilor(%)	4,7	3,4	2,7	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
creștere salarială (%)	8,9	8,1	8,2	7,6	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7

indicator/an	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
inflația(%)	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
creșterea preturilor(%)	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
creștere salarială (%)	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7

4.3.1. Cheltuieli

Cheltuielile previzionate după implementarea proiectului se împart în următoarele categorii:

- cheltuieli pentru asigurarea utilităților;
- cheltuieli cu întreținerea utilităților;
- cheltuieli de personal.

Cheltuielile cu utilitățile se referă la asigurarea cu energie electrică. Se previzionează că acestea vor ajunge la aproximativ **25.000 lei/an**.

Cheltuielile cu utilitățile vor crește o dată cu creșterea prețurilor.

Cheltuielile cu întreținerea utilitatilor se estimeaza la **3.000 lei/an**.

Cheltuielile cu plata personalului se referă la cheltuieli din salarii. Aceste cheltuieli vor fi de aproximativ **1.000 lei/luna** în medie și vor crește anual odată cu creșterea prețurilor pieței.

Cheltuielile înregistrate în varianta realizării proiectului sunt prezentate în Anexa nr. 2 la prezentul studiu.



PRO-ARHIMED S.R.L.

CIF.31086762; J40/1006/2016; TEL: 0720538138; arhimed@yahoo.ro

4.3.2. Venituri

Veniturile generate de proiect vor fi:

1. venituri din închirierea unor spații pentru automate de servire (cafea, răcoritoare, sandvișuri).

Veniturile din închirierea acestor spații vor fi de cca **1.000 lei/an.**

Veniturile previzionate vor crește în fiecare an cu 5 % față de anul anterior, datorită creșterii cererii pentru astfel de activități.

Veniturile înregistrate datorită realizării proiectului sunt prezentate în Anexa nr. 3 la prezentul studiu.

4.4 Analiza economica

Analiza economică evaluează contribuția proiectului la bunăstarea economică a comunității locale. Aceasta este efectuată în numele întregii comunități și nu în numele proprietarului infrastructurii ca și în cazul analizei financiare. Analiza cost-beneficiu definește evaluarea costurilor și a beneficiilor sociale. Baza calculului acestei analize este analiza financiară. Există mai multe categorii de costuri și beneficii care vor fi prezentate în cadrul analizei economice.

Investiția respectivă urmărește crearea și dezvoltarea serviciilor de bază pentru populația rurală, fiind esențială pentru asigurarea unui nivel de trai decent, aducând beneficii sociale și de mediu considerabile.

Implementarea investiției creează două tipuri de beneficii:

1. directe
2. indirecte

Beneficiile directe sunt acele beneficii de care profită membrii comunității locale. Acestea includ:

- beneficii sociale prin pentru creșterea gradului de confort material și psihologic;
- beneficii de mediu prin valorificarea resurselor locale;
- crearea și dezvoltarea serviciilor de bază pentru populația rurală, fiind esențială pentru asigurarea unui nivel de trai decent.

Beneficiile indirecte sunt acelea care nu influențează direct locuitorii comunității, însă au un impact mai larg.

- Obiectivul general îl constituie îmbunătățirea condițiilor de viață pentru populație și a relațiilor interumane de calitate prin facilitarea interacțiunilor în spațiul public.

Datorită faptului că investiția nu are scop de profitabilitate, menționarea beneficiilor de natura socială este esențială pentru descrierea impactului proiectului asupra comunității beneficiare. Scopul proiectului este legat de:

- Facilitarea interacțiunii interumane și creșterea capitalului social în spațiul public;



PRO-ARHIMED S.R.L.

CIF. 31086762; J40/1006/2016; TEL: 0720538138; arhimd@yahoo.ro

- Rezolvarea problemelor ambientale și de mediu ale comunităților rurale;
- Realizarea unei dezvoltări durabile prin implicarea populației încă de la vârste tinere în susținerea respectului față de comunitate și de natură;
- Crearea unei imagini vibrante asupra trecutului și a istoriei locului.

4.5 Analiza de senzitivitate

În cadrul analizei de senzitivitate s-a analizat cum varianta indicatorului „creșterea prețurilor” poate influența indicatorii calculați în cadrul analizei financiare.

S-a presupus ca indicatorul „creșterea prețurilor” previzionat de Instituțiile Naționale de statistică și prognoza va crește cu 0,5% mai mult față de previziunile efectuate la nivel național. În acest caz se vor modifica atât veniturile, cât și cheltuielile prevăzute după realizarea proiectului.

Indicatorul „creșterea prețurilor” previzionat va fi de 3,5% în fiecare an de referință. Analiza de senzitivitate în varianta realizării proiectului, cu variația indicatorului „creșterea prețurilor” este prezentată în Anexa nr. 4 la prezentul studiu.

Cheltuielile previzionate după implementarea proiectului vor fi mai mari decât cele previzionate inițial în analiza financiară, deoarece acestea cresc odată cu creșterea prețurilor.

Veniturile generate de proiect vor rămâne neschimbate pentru ca acestea nu sunt influențate de creșterea prețurilor.

Contul de venituri și cheltuieli va fi diferit față de varianta inițială, diferențele provenind din cheltuielile mai mari decât cele prevăzute inițial.

Cash Flow-ul din implementarea proiectului nu este influențat de creșterea prețurilor, aceasta fiind luată în calcul începând cu anul doi de după implementarea proiectului.

Cash Flow-ul post-implementare va fi mai mic dacă prețurile vor crește mai mult decât previziunile efectuate la nivel național, dar acesta rămâne pozitiv în fiecare an de referință.

Indicatorii financiari ai investiției în varianta creșterii prețurilor mai mult decât previziunile efectuate, se încadrează în următoarele limite:

- Valoarea actualizată netă (VAN) este 680,987 mii lei (valoare inclusiv TVA).
- Rata Internă de Rentabilitate (RIR) este cu aproximativ 0,01% în fiecare an de previziune față de varianta inițială.
- Fluxul de numerar cumulat (Cash flow net) este mai mic dar rămâne pozitiv în fiecare an de referință (atât în perioada de implementare a proiectului cât și după implementarea acestuia).



PRO-ARHIMED S.R.L.

CIF: 31086762; J40/1006/2016; TEL: 0720538138; arhimed@yahoo.ro

- Raportul cost/beneficii este mai mare decât cel calculat în analiza financiară.

4.6 Analiza de risc

Analiza de risc cuprinde următoarele etape principale:

1. Identificarea riscurilor.

Identificarea riscurilor se va realiza în cadrul ședințelor lunare de progres de către membrii echipei de proiect. Identificarea riscurilor trebuie să includă riscuri care pot apărea pe parcursul întregului proiect: financiare, tehnice, organizaționale, cu privire la resursele umane implicate, precum și riscuri externe (politice, de mediu, legislative).

Identificarea riscurilor trebuie actualizată la fiecare ședință lunară.

2. Evaluarea probabilității de apariție a riscului. Riscurile identificate vor fi caracterizate în funcție de probabilitatea lor de apariție și impactul acestora asupra proiectului.

3. Identificarea măsurilor de reducere sau evitare a riscurilor

Risc	Probabilitate de apariție	Măsuri
Riscuri tehnice:		
Potențiale de modificare ale soluției tehnice	Scăzut	- asistența tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției proiectului; - acoperirea cheltuielilor cu noua soluție tehnică din sumele cuprinse la cheltuielile diverse și neprevăzute.
Întârziere a lucrărilor datorită alocărilor defectuoase de resurse din partea executantului	Scăzut	- prevederea în caietul de sarcini a unor cerințe care să asigure performanța tehnică și financiară a firmei contractante (personal suficient, lucrările similare realizate etc.); - impunerea unor clauze contractuale preventive în contractul de lucrări: penalizări, garanții de bună execuție etc.
Nerespectarea clauzelor contractuale ale unor contractanți sau subcontractanți	Scăzut	- stipularea de garanții de bună execuție și penalități în contractele comerciale încheiate cu societăți contractante.
Riscuri organizatorice		
Neasumarea unor sarcini și responsabilități în cadrul consiliului local	Scăzut	- stabilirea responsabilităților echipei de proiect de către reprezentantul legal;



PRO-ARHIMED S.R.L.

CIF. 31086762; J40/1006/2016; TEL: 0720538138; arhimed@yahoo.ro

Risc	Probabilitate de apariție	Măsuri
Neasumarea unor sarcini și responsabilități în cadrul echipei de proiect	Scăzut	- stabilirea responsabilităților membrilor echipei de proiect prin realizarea unor fișe de post; - numirea în echipa de proiect a unor persoane cu experiență în implementarea unor proiecte similare; - motivarea personalului cuprins în echipa de proiect.
Riscuri financiare și economice		
Capacitatea insuficientă de finanțare și cofinanțare la timp a investiției	Scăzut	- alocarea și rezervarea bugetului integral necesar realizării proiectului în bugetul consiliului local.
Creșterea inflației	Mediu	- realizarea bugetului în funcție de prețurile existente pe piață; - cheltuielile generate de creșterea inflației vor fi suportate de către beneficiar din bugetul propriu.
Riscuri externe		
Riscuri de mediu -condițiile de climă și temperatură nefavorabile efectuării unor categorii de lucrări	Mediu	-alegerea unor soluții de execuție care să țină cont cu prioritate de condițiile climatice
Riscuri politice: -schimbarea conducerii Consiliului local ca urmare a începerii unui nou mandat și lipsa de implicare a persoanelor nou alese în implementarea proiectului	Scăzut	Proiectul devine obligație contractuală din momentul semnării contractului. Nerespectarea acestuia este sancționată conform legii.

Proiectul nu cunoaște riscuri majore care ar putea întrerupe realizarea acestuia. Planificarea corectă a etapelor proiectului încă din faza de elaborare a acestuia, precum și monitorizarea continuă pe parcursul implementării asigură evitarea riscurilor care pot influența major proiectul.



PRO-ARHIMED S.R.L.

CIF.31086762; J40/1006/2016; TEL: 0720538138; arhimd@yahoo.ro

CAPITOLUL 5. SURSELE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI

Proiectul va fi finanțat din donații și sponsorizări.

CAPITOLUL 6. ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCĂ OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI

6.1 Număr de locuri de muncă nou create în faza de execuție.

În faza de execuție nu vor fi create noi locuri de muncă, având în vedere faptul că se vor folosi servicii subcontractate și se vor folosi resursele umane existente ale contractorilor.

Astfel proiectul va contribui la menținerea locurilor de muncă deja existente.

Societatea care va executa lucrarea poate oferi locuri de muncă pe perioada de execuție a lucrărilor.

6.2 Număr de locuri de munca create în faza de operare

În faza de operare se va crea un loc de munca nou, cu orar parțial, personalul care va opera și utiliza infrastructura va fi personal de întreținere.

CAPITOLUL 7. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

7.1 Valoarea totală a investiției

Valoarea totală a investiției este:

Valoare investiție	MII LEI	MII EURO
Valoare fără TVA	570,381	116,524
Valoare TVA	107,105	21,747
Valoare cu TVA	680,987	138,271
Valoare C+M fără TVA	469,714	95,373
TVA pentru Valoare C+M	89,245	18,120
Valoare C+M TVA	558,960	113,494

Valorile au fost calculate la Cursul de schimb valutar de referință al BCE din 09.08.2022 de 4,9250 ron/euro.



PRO-ARHIMED S.R.L.

CIF. 31086762; J40/1006/2016; TEL: 0720538138; arhimed@yahoo.ro

7.2 Eșalonarea investiției

Graficul de eșalonare a investiției:

Valoare investiție pe luni	Luni					
	1	2	3	4	5	6
Procentaj lunar, %	21,95	14,57	16,30	18,41	14,39	14,38
Valoare, mii lei (fără TVA)	125,20	83,10	93,00	105,00	82,05	82,03
Valoare, mii lei (cu TVA)	149,48	99,21	111,03	125,36	97,96	97,94

Valorile au fost calculate la Cursul de schimb valutar de referință al BCE din 09.08.2022 este de 4,9250 ron/euro.

7.3 Durata de realizare

Durata de realizare a investiției este estimată la 6 luni.

7.4 Capacități

În unități fizice:

- Construcții: rezistență (fundații, structura de rezistență) și arhitectură (finisaje)
- Instalații electrice
- Amenajări exterioare și pentru protecția mediului
- Lucrări de arhitectură peisageră: **34,00 mp.**

Plantarea de arbuști și arbori ornamentali, însămânțarea cu gazon.

- Amenajarea de spații de odihnă: **4 bănci.**

Se dispun bănci din lemn paralel cu alea spre parcare și în lateralul catargelor.

- Amenajare alee auto și parcare- **393,40 mp;**

Îmbrăcăminte din beton amprentat, tratat pentru exterior, montat pe un strat suport din Beton Armat cu grosimea de 20 cm;

- Platouri pentru ceremonii, **519,10 mp;**

Îmbrăcăminte din beton amprentat, tratat pentru exterior, montat pe un strat suport din Beton Armat cu grosimea de 12 cm, acesta nu va realiza pentru trecerea autovehiculelor;

În unități valorice:

- Lucrări de construcții:
- 553,010 mii lei, respectiv 112,286 mii euro (valori cu TVA)

Valorile au fost calculate la Cursul de schimb valutar de referință al BCE din 09.08.2022 este de 4,9250 ron/euro.



PRO-ARHIMED S.R.L.

CIF.31086762; J40/1006/2016; TEL: 0720538138; arhimed@yahoo.ro

7.5 Antemăsurătoare Arhitectură

Nr crt	Denumire lucrare	Cantitate
1	Lucrări de arhitectură peisageră:	34,00mp
2	Amenajarea de spații de odihnă:	4 bănci
3	Amenajere alee auto și parcare-	393,40 mp
4	Amenajere alei platouri pentru ceremonii	519,10 mp
5	Obelisc în formă de cruce,	119,45 mp
6	Platouri pentru dispunerea obuzierelor și platou belvedere	64,00 mp
7	Balustradă cu baluștri ornamentali	53,20 m
8	Panouri informative	64,00 mp

Rezistență

Nr crt	Denumire lucrare	Cantitate
Lucrari platforma si zid de sprijin		
8	Decopertare	256 mc
9	Sapatura utilaj	960 mc
10	Transport cu basculanta	1.216 mc
11	Umplutura pamant stabilizat	128 mc
12	Strat balast	256 mc
13	Piatra sparta	192 mc
14	Nisip	25,6 mc
15	BcR4.0	256 mc
16	beton zid de sprijin	486 mc
17	armatura zid sprijin	3.499,2 kg
Lucrari platforma si zid de sprijin		
18	Decopertare	56 mc
19	Sapatura manuală	308 mc
20	Transport cu basculanta	364 mc
21	Umplutura	112 mc
22	Foraj	6,2 mc
23	Turnare beton nearmat în fundații	56 mc
24	Turnare beton armat în fundații	16,72 mc
25	Armare	524
26	Cofrare	150 mp
27	Turnare beton monument	27,95 mc
28	Armare	3.500 kg



PRO-ARHIMED S.R.L.

CIF.31086762; J40/1006/2016; TEL: 0720538138; arhimd@yahoo.ro

Instalații electrice.

Nr crt	Denumire lucrare	Cantitate
29	Stalpi iluminat cu 3 brate	10 buc
30	Sapatura	80 mc
31	Transport	80 mc
32	Umplutura balastru	80 mc
33	Nisip	15,00 mc
34	Cablu CYAbY 5x6 mmp	50 m
35	Cablu CYAbY 5x2.5 mmp	450 m
36	Tub HDPE	220 m
37	Banda avertizore PVC	30 buc
38	Corpuri de iluminat stalpi	25 buc
39	Reflector iluminat decorativ	10 buc
40	Priza de pamant	10 buc
42	Tablou electric	1 buc
43	Iluminat denumire localitate pe taluz	1 buc

CAPITOLUL 8. AVIZE ȘI ACORDURI DE PRINCIPIU

- 8.1 Avizul beneficiarului de investiție privind necesitatea și oportunitatea investiției
- 8.2 Certificatul de urbanism
- 8.3 Avize de principiu privind asigurarea utilităților- se vor obține în faza de întocmire a D.T.A.C.
- 8.4 Acordul de mediu -se va obține în faza de întocmire a D.T.A.C.



PRO-ARHIMED S.R.L.

CIF: 51085762; J40/1006/2016; TEL: 0720538138; arhimed@yahoo.ro

Anexa 1

Grafic de realizare a investiției

Nr crt	Denumire activitate	Anul 1					Anul 2									
		5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	
Etapa 1. Realizarea S. F. și întocmirea studiilor de teren.																
1.1	Atribuirea serviciilor de proiectare pt. S.F.	5														
1.2	Elaborarea S.F., a Studiului Geo si documentației topo.		6	7	8											
Etapa 2. Realizarea Proiectului tehnic și a detaliilor de execuție și a realizării lucrărilor construcției și instalații:																
2.1	Organizarea licitației pt. contractul de proiectare și execuție					9										
2.2	Întocmirea Proiectului Tehnic															
2.3	Obținerea avizelor, acordurilor și A. C.									11	12					
2.4	Organizarea de șantier															
2.5	Realizarea lucrărilor de construcții										1					
2.6	Realizarea lucrărilor de instalații											2	3	4	5 6	
2.7	Monitorizarea lucrărilor de construcții și instalații											2	3	4	5 6	
Etapa 4: Monitorizarea proiectului																
4.1	Realizarea raportărilor tehnice și financiare															
4.2	Organizarea unor întâlniri lunare de studiu lucrări											2	3	4	5 6	
Etapa 5: Darea în exploatare a obiectivului de investiții.																
5.1	Organizarea recepției finale a obiectivului de investiție											2	3	4	5 6	
															6	

Prognoză cheltuieli										
valorile sunt in mii lei										
categoria	Total an 2022	Total an 2023	Total an 2024	Total an 2025	Total an 2026	Total an 2027	Total an 2028	Total an 2029	Total an 2030	Total an 2031
	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei
Cheltuieli										
1 Utilități	25.00	26.86	28.85	30.99	33.42	36.03	38.85	41.89	45.17	48.71
2 Întreținere	3.00	3.22	3.46	3.72	4.01	4.32	4.66	5.03	5.42	5.84
total	28.00	30.08	32.32	34.71	37.43	40.36	43.52	46.92	50.59	54.55
1 de funcționare.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
de personal	12.00	12.70	13.62	14.62	15.68	16.89	18.19	19.59	21.10	22.73
bunuri, servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
altele	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 amortizări	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 rambursări	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 altele	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CHELTUIELI	40.00	42.78	45.94	49.33	53.11	57.25	61.71	66.51	71.69	77.28



PRO-ARHIMED S.R.L.

CIF: 31086762, J40/1006/2016, TEL: 0720538138, arhimed@yahoo.ro

Anexa 3

Proгноză venituri											
categoria	Total an 2032 mii lei	Total an 2033 mii lei	Total an 2034 mii lei	Total an 2035 mii lei	Total an 2036 mii lei	Total an 2037 mii lei	Total an 2038 mii lei	Total an 2039 mii lei	Total an 2040 mii lei	Total an 2041 mii lei	Total an 2041 mii lei
Venituri											
1 închirieri	12.00	12.42	12.79	13.11	13.41	13.72	14.04	14.36	14.69	15.03	15.03
total	12.00	12.42	12.79	13.11	13.41	13.72	14.04	14.36	14.69	15.03	15.03
1 venituri proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
curente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 împrumuturi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 din subvenții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 amortizări	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 altele	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL VENITURI	12.00	12.42	12.79	13.11	13.41	13.72	14.04	14.36	14.69	15.03	15.03

Anexa 4

Analiza financiară

valorile sunt în mii lei

Prognoză cheltuieli

categoria	Anul I				Anul II				Total an 1	Total an 2	Total an 3	Total an 4	Total an 5	Total an 6	Total an 7	Total an 8	Total an 9	Total an 10
	Tr1	Tr2	Tr3	Tr4	Tr1	Tr2	Tr3	Tr4										
Cheltuieli																		
1 Utilități	6.25	6.25	6.25	6.25	6.71	6.71	6.71	6.71	25.00	26.86	28.85	30.99	33.42	36.03	38.85	41.89	45.17	48.71
2 Întreținere	0.75	0.75	0.75	0.75	0.81	0.81	0.81	0.81	3.00	3.22	3.46	3.72	4.01	4.32	4.66	5.03	5.42	5.84
Total	7.00	7.00	7.00	7.00	7.52	7.52	7.52	7.52	28.00	30.08	32.32	34.71	37.43	40.36	43.52	46.92	50.59	54.55
1 de funct.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
de personal	3.00	3.00	3.00	3.00	3.17	3.17	3.17	3.17	12.00	12.70	13.62	14.62	15.68	16.89	18.19	19.59	21.10	22.73
bunuri, servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
altele	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 amortizări	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 rambursări	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 altele	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CHELTUIELI	10.00	10.00	10.00	10.00	10.69	10.69	10.69	10.69	40.00	42.78	45.94	49.33	53.11	57.25	61.71	66.51	71.69	77.28



PRO-ARHIMED S.R.L.

CIF: 31086762, J40/1006/2016, TEL: 0720538138, arhimed@yahoo.ro

Proгноză venituri																		
categoria	Anul I				Anul II				Total an 1	Total an 2	Total an 3	Total an 4	Total an 5	Total an 6	Total an 7	Total an 8	Total an 9	Total an 10
	Tr1	Tr2	Tr3	Tr4	Tr1	Tr2	Tr3	Tr4										
Venituri																		
1	închirieri	3.00	3.00	3.00	3.11	3.11	3.11	3.11	12.00	12.42	12.79	13.11	13.41	13.72	14.04	14.36	14.69	15.03
total		3.00	3.00	3.00	3.11	3.11	3.11	3.11	12.00	12.42	12.79	13.11	13.41	13.72	14.04	14.36	14.69	15.03
1	venituri proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	curente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	împrumuturi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	din subvenții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	amortizări	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	altele	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL venituri		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRO-ARHIMED S.R.L.



Mun. Bucuresti, Sect.4, Aleea Ornamentului, Nr.4, Bl.E8, Ap.36, CP 041805, CIF:31086762, J40/1006/2016; TEL: 07203538138; arhimed@yahoo.ro www.arhimed.ro

Beneficiar: COMUNA COSMEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI

PRO ARHIMED S.R.L.

Executant:
Proiectant:
Obiectivul:

266- CONSTRUIRE MONUMENT EROI ÎN LOCALITATEA COSMEȘTI, COMUNA COSMEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării

TVA=

19%

În lei/euro la cursul

4,9250 LEI/EURO DIN DATA 09.08.2022

Nr.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	1		2		3		4		5		6		7	
		Lei	Euro	Lei	Euro	Lei	Euro	Lei	Euro	Lei	Euro	Lei	Euro	Lei	Euro
	Valoare (fara TVA)														
	TVA														
	Valoare (cu TVA)														

CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului															
1.1	Obținerea terenului	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Amenajarea terenului	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și pentru aducerea terenului la starea inițială	5.000,00	1.015,23	950,00	5.950,00	1.208,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CAPITOL 1		5.000,00	1.015,23	950,00	5.950,00	1.208,12									

CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii															
2.1	Obiectul 10. Branșamente.	5.000,00	1.015,23	950,00	5.950,00	1.208,12									
TOTAL CAPITOL 2		5.000,00	1.015,23	950,00	5.950,00	1.208,12									

CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistența tehnică															
3.1	Studii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
3.1.1	Studii de teren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	-	-	-	-	-									
3.1.3	Alte studii specifice	-	-	-	-	-									
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	-	-	-	-	-									
3.3	Expertizare tehnică	-	-	-	-	-									
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	-	-	-	-	-									
3.5.1	Proiectare	52.500,00	10.659,90	9.975,00	62.475,00	12.685,28									
3.5.1	Tema de proiectare	-	-	-	-	-									
3.5.2	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	35.000,00	7.106,60	6.650,00	41.650,00	8.456,85									

PRO-ARHIMED S.R.L.



Mun. Bucuresti, Sect.4, Aleea Ornamentului, Nr.4, Bl.E8, Ap.36, CP 041805. CIF.31086762; J40/1006/2016; TEL: 0720538138; arhimd@yahoo.ro www.arhimd.ro

3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	8.500,00	1.725,89	1.615,00	10.115,00	2.053,81
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	2.500,00	507,61	475,00	2.975,00	604,06
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	6.500,00	1.319,80	1.235,00	7.735,00	1.570,56
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	-	-	-	-	-
3.7	Consultanță	-	-	-	-	-
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	-	-	-	-	-
3.7.2	Auditul financiar	-	-	-	-	-
3.8	Asistență	24.500,00	5.076,14	4.750,00	29.750,00	6.040,61
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	2.000,00	507,61	475,00	2.975,00	604,06
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	2.500,00	507,61	475,00	2.975,00	604,06
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	-	-	-	-	-
3.8.2	Dirigenție de șantier	20.000,00	4.060,91	3.800,00	23.800,00	4.832,49
TOTAL CAPITOL 3		77.000,00	15.736,04	14.725,00	92.225,00	18.725,89

CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1	Construcții și instalații	461.214,51	93.647,62	87.630,76	548.845,26	111.440,66
4.1.1	Obiectul 1. Consolidarea sitului prin cămășuirea taluzului vestic.	79.936,60	16.230,78	15.187,95	95.124,55	19.314,63
4.1.2	Obiectul 2. Împrejmuirea obiectivului, (inclusiv balustrada cu baluștri).	45.723,47	9.283,95	8.687,46	54.410,93	11.047,90
4.1.3	Obiectul 3. Realizarea platformelor din beton amprentat.	85.132,40	17.285,77	16.175,16	101.307,56	20.570,06
4.1.4	Obiectul 4. Obelisc în formă de cruce stilizată, inclusiv soclu.	53.170,00	10.795,94	10.102,30	63.272,30	12.847,17
4.1.5	Obiectul 5. Panouri informative.	7.758,00	1.575,23	1.474,02	9.232,02	1.874,52
4.1.6	Obiectul 6. Parcare pentru vizitatori, (inclusiv alee).	17.939,04	3.642,44	3.408,42	21.347,46	4.334,51
4.1.7	Obiectul 7. Amenajare postamente pentru obuziere.	12.960,00	2.631,47	2.462,40	15.422,40	3.131,45
4.1.8	Obiectul 8. Obuziere.	0,00	0,00	-	0,00	0,00
4.1.9	Obiectul 9. Iluminat.	158.595,00	32.202,03	30.133,05	188.728,05	38.320,42
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	-	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	-	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	-	0,00	0,00
4.5	Dotări	3.500,00	710,66	665,00	4.165,00	845,69

Ordinul
Arhitecților
din
România

PRO-ARHIMED S.R.L.

Mun. Bucuresti, Sect.4, Aleea Ornamentului, Nr.4, Bl.E6. Ap.36, CP 041805. CIF.31086762; J40/1006/2016; TEL: 0720536138; arhimd@yahoo.ro www.arhimd.ro



4.6	Active necorporale	0,00	0,00	-	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4		464.714,51	94.358,28	88.295,76	553.010,26	112.286,35

CAPITOL 5 Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de şantier	2.000,00	1.015,23	950,00	5.950,00	1.208,12
5.1.1	Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier	0,00	0,00	-	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării şantierului	5.000,00	1.015,23	950,00	5.950,00	1.208,12
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	10.166,86	2.064,34	0,00	10.166,86	2.064,34
5.2.1	Comisiunile şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare	0,00	0,00	-	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii	2.348,57	476,87	-	2.348,57	476,87
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii	469,71	95,37	-	469,71	95,37
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	2.348,57	476,87	-	2.348,57	476,87
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare	5.000,00	1.015,23	-	5.000,00	1.015,23
5.3	Cheltuieli diverse şi neprevăzute	5.000,00	1.015,23	950,00	5.950,00	1.208,12
5.4	Cheltuieli pentru informare şi publicitate	0,00	0,00	-	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 5		17.166,86	4.094,79	1.900,00	22.066,86	4.480,58


CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste						
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	-	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice şi teste	1.500,00	304,57	285,00	1.785,00	362,44
TOTAL CAPITOL 6		1500,00	304,57	285,00	1785,00	362,44

TOTAL	570.381,37	116.524,14	107.105,76	680.987,12	138.271,50
TOTAL Construcţii+Montaj	469.714,51	95.373,50	89.245,76	558.960,26	113.494,47

Beneficiar
COMUNA COSMEŞTI, JUDEȚUL GALAȚI

Şef proiect
Arh. Dima G. Mircea

Ofertant



PRO-ARHIMED S.R.L.



Mun. Bucuresti, Sect.4, Aleea Ornamentului, Nr.4, Bl.E8, Ap.36, CP 041805, CIF.31086762; J40/1006/2016; TEL: 0720538138; arhimd@yahoo.ro www.arhimd.ro

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

Privind: **266- CONSTRUIRE MONUMENT EROI ÎN LOCALITATEA COSMEȘTI, COMUNA COSMEȘTI, JUDEȚUL GALATI**

1) **Valoare totală a investiției (cu TVA)= 680,987 mii lei**

- Din care - C+M = 558,960 mii lei

- Alte cheltuieli = 5,0 mii lei

2) **Eșalonarea investiției:**

- AN 1 – 680,987 mii lei

3) **Capacități:**


Obiectul 1. Consolidarea sitului prin cămășuirea taluzului vestic.	95,124	mii lei
Obiectul 2. Împrejmuirea obiectivului, (inclusiv balustrada cu baluștri).	54,410	mii lei
Obiectul 3. Realizarea platformelor din beton amprentat.	101,307	mii lei
Obiectul 4. Obelisc în formă de cruce stilizată, inclusiv soclu.	63,272	mii lei
Obiectul 5. Panouri informative.	9,232	mii lei
Obiectul 6. Parcare pentru vizitatori, (inclusiv alee).	21,347	mii lei
Obiectul 7. Amenajare postamente pentru obuziere.	15,422	mii lei
Obiectul 8. Obuziere.	0,00	mii lei
Obiectul 9. Iluminat.	188,728	mii lei
Amenajarea terenului	0,0	mii lei
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților	5,0	mii lei

4) **Durata de realizare a investiției este estimată la 6 luni**

Intocmit,
PRO ARHIMED S.R.L.
ARH. TNA 6724
DIMA MURCEA



Ordinul
Arhitecților
din
România



PRO-ARHIMED S.R.L.

Mun. Bucuresti, Sect.4, Aleea Ornamentului, Nr.4, Bl.E8, Ap.36, CP 041805. CIF.31086762; J40/1006/2016; TEL: 0720538138; arhimd@yahoo.ro www.arhimd.ro



DOCUMENTATIE TEHNIC FAZA: STUDIU DE FEZABILITATE RANDĂRI

NUMAR PROIECT:

266

S. F.

AMPLASAMENT:

JUD. GALAȚI, COM. COSMEȘTI, STR.
MAGNOLIEI, NR 27, NR CAD. 1071⁸⁷, C.F. :

OBIECTIV:

CONSTRUIRE MONUMENT EROI ÎN
LOCALITATEA COSMEȘTI, COMUNA COSMEȘTI,
JUDEȚUL GALAȚI

BENEFICIAR:

COMUNA COSMEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI

ADRESA BENEFICIAR:


STR. GENERAL DUMITRU DĂMĂCEANU, NR. 73,
LOCALITATEA COSMEȘTI, COMUNA COSMEȘTI,
JUD. GALAȚI, COD POSTAL 807085

PROIECT NR:

266

DATA REALIZĂRII
DOCUMENTAȚIEI:

AUGUST 2022

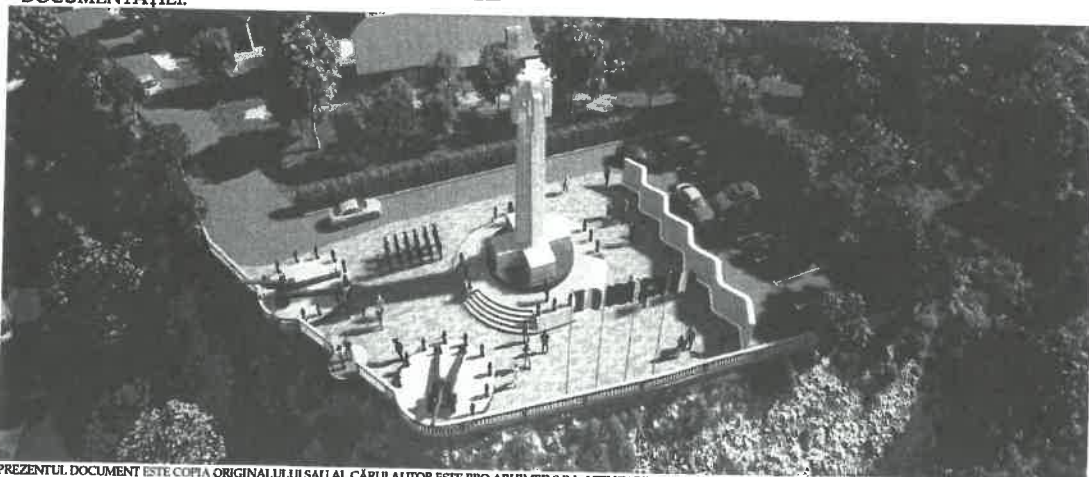


Ordinul
Arhitecților
din
România

PREZENTUL DOCUMENT ESTE COPIA ORIGINALULUI SAU AL CĂRUI AUTOR ESTE PRO ARHIMED S.R.L. UTILIZAREA SA TOTALĂ SAU PARȚIALĂ, ASA CA ȘI ORICE REPRODUCERE SAU CEDARE CĂTRE TERȚI, VA NECESITA O AUTORIZARE ANTERIOARĂ EXPRESĂ DIN PARTEA AUTORILOR SAȘI, ASTFEL FIIND INTERZISĂ ORICE MODIFICARE UNILATERALĂ A ACESTUIA.

Autor:

PRO ARHIMED S.R.L.

ARH. DIMA GEORGIAN MIRCEA - TNA 6724



V.20161202

Pag. 1

PRO-ARHIMED S.R.L.



Mun. Bucuresti, Sect.4, Aleea Ornamentului, Nr.4, Bl.E6, Ap.36, CP 041805, CIF.31086762; J40/1006/2016; TEL: 0720538138; arhimd@yahoo.ro www.arhimd.ro



Perspectiva aeriana 1



**Ordinul
Arhitecților
din
România**

Perspectivă aeriana 2

Autor:
PRO ARHIMED S.R.L.
ARH. DIMA GEORGIAN MIRCEA - TNA 6724




V.20161202

Pag. 2

PRO-ARHIMED S.R.L.



Mun. Bucuresti, Sect.4, Aleea Ornamentului, Nr.4, Bl.E8, Ap.36, CP 041805. CIF.31086762; J40/1006/2016; TEL: 0720538138; arhimd@yahoo.ro www.arhimd.ro

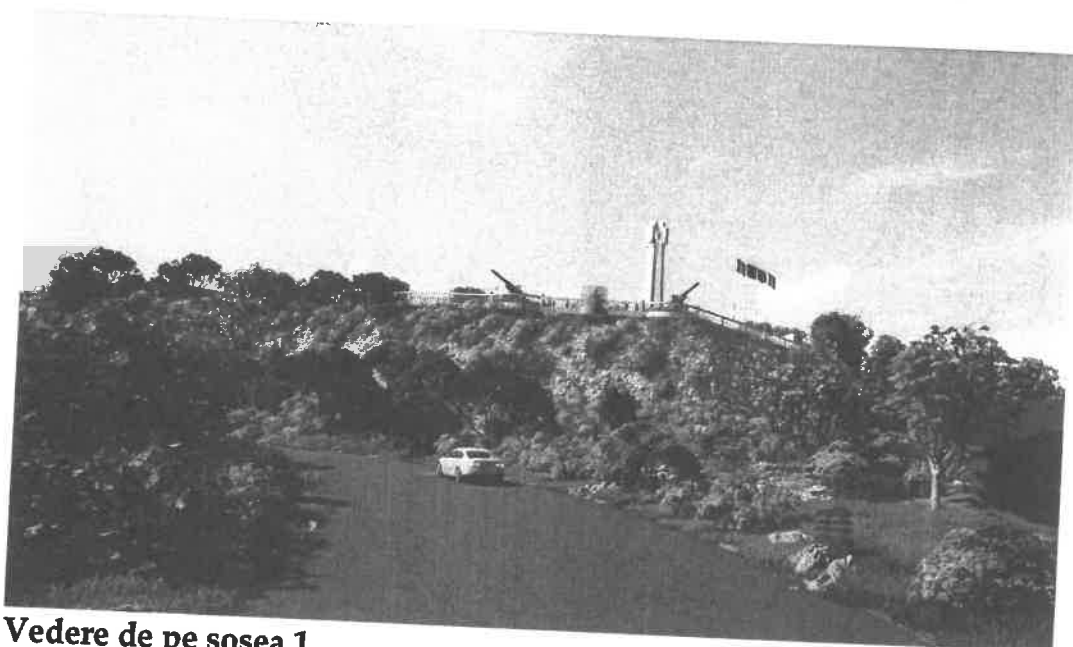

Vedere de pe sosea 1



Perspectivă la nivlul ochiului 1



*Ordinul
Arhitecților
din
România*

Autor:
PRO ARHIMED S.R.L.
ARH. DIMA GEORGIAN MIRCEA - TNA 6724




PRO-ARHIMED S.R.L.



Mun. Bucuresti, Sect.4, Aleea Ornamentului, Nr.4, Bl.E8, Ap.36, CP 041805. CIF.31086762; J40/1008/2016; TEL: 0720538138; arhimd@yahoo.ro www.arhimd.ro



Perspectiva la nivelul ochiului 2

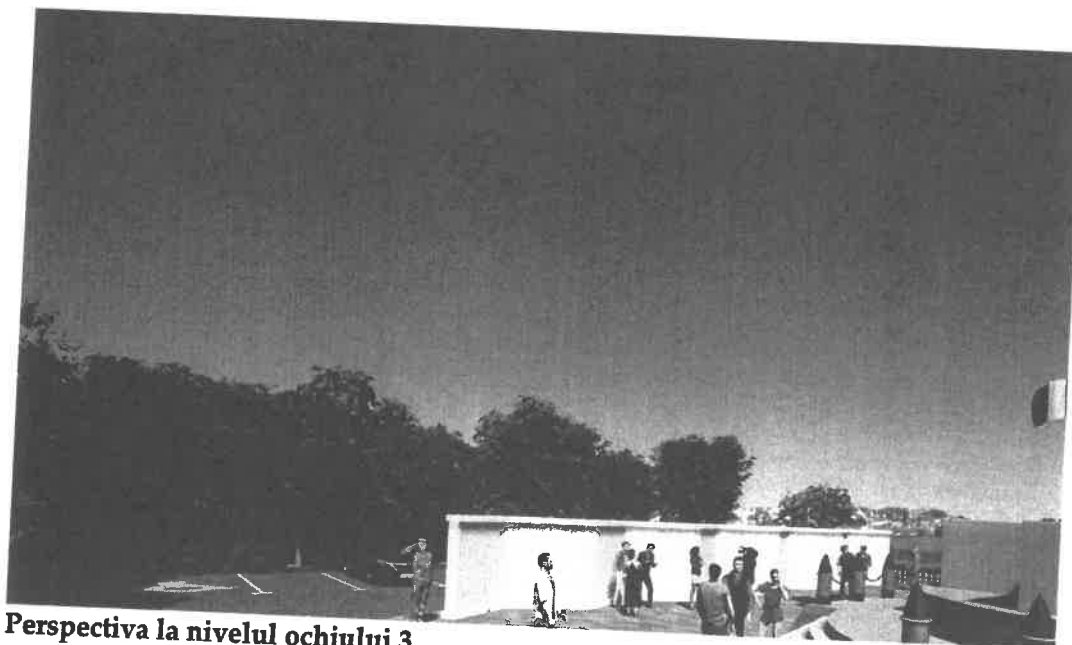

Perspectiva la nivelul ochiului 3



Ordinul
Arhitecților
din
România


Autor:
PRO ARHIMED S.R.L.
ARH. DIMA GEORGIAN MIRCEA - TNA 6724




PRO-ARHIMED S.R.L.



Mun. Bucuresti, Sect.4, Aleea Ornamentului, Nr.4, Bl.E8, Ap.38, CP 041805. Cif.31086762; J40/1006/2016, TEL: 0720538138; arhimd@yahoo.ro www.arhimd.ro

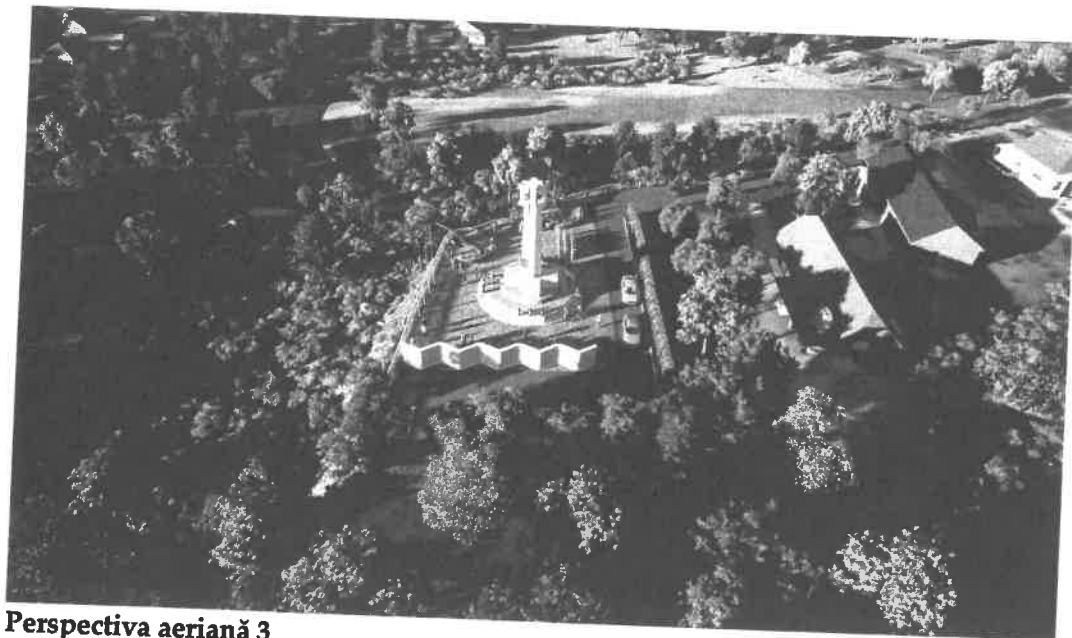


Perspectiva aeriană 3

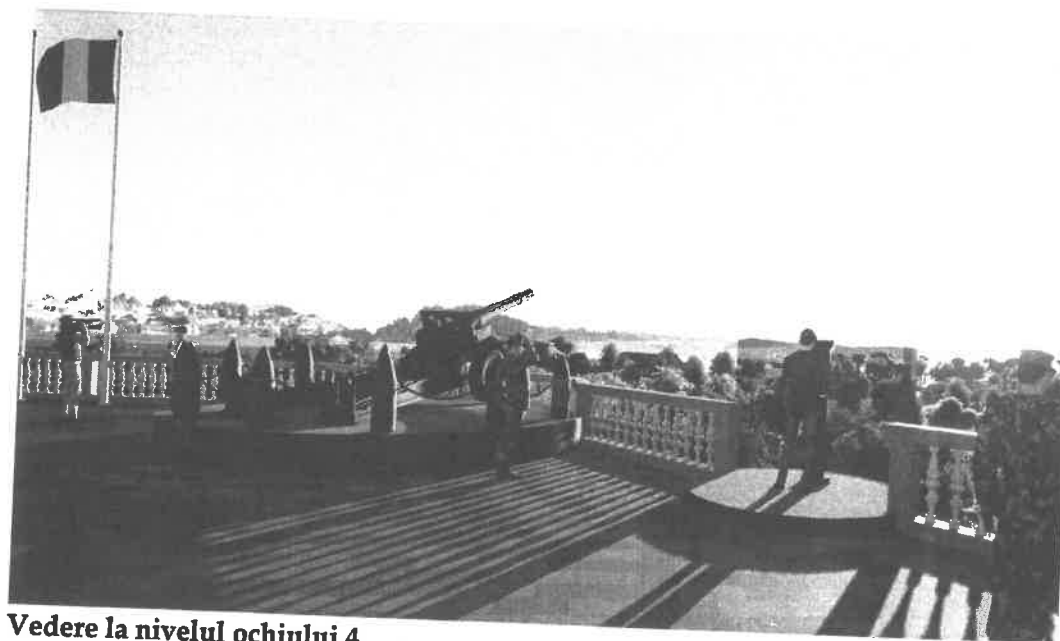

Ordinul
Arhitecților
din
România


Vedere la nivelul ochiului 4

Autor:
PRO ARHIMED S.R.L.
ARH. DIMA GEORGIAN MIRCEA - TNA 6724




PRO-ARHIMED S.R.L.

Mun. Bucuresti, Sect.4, Aleea Ornamentului, Nr.4, Bl.E8, Ap.36, CP 041805, CIF.31086762, J40/1006/2016; TEL: 0720538138; arhimd@yahoo.ro www.arhimd.ro

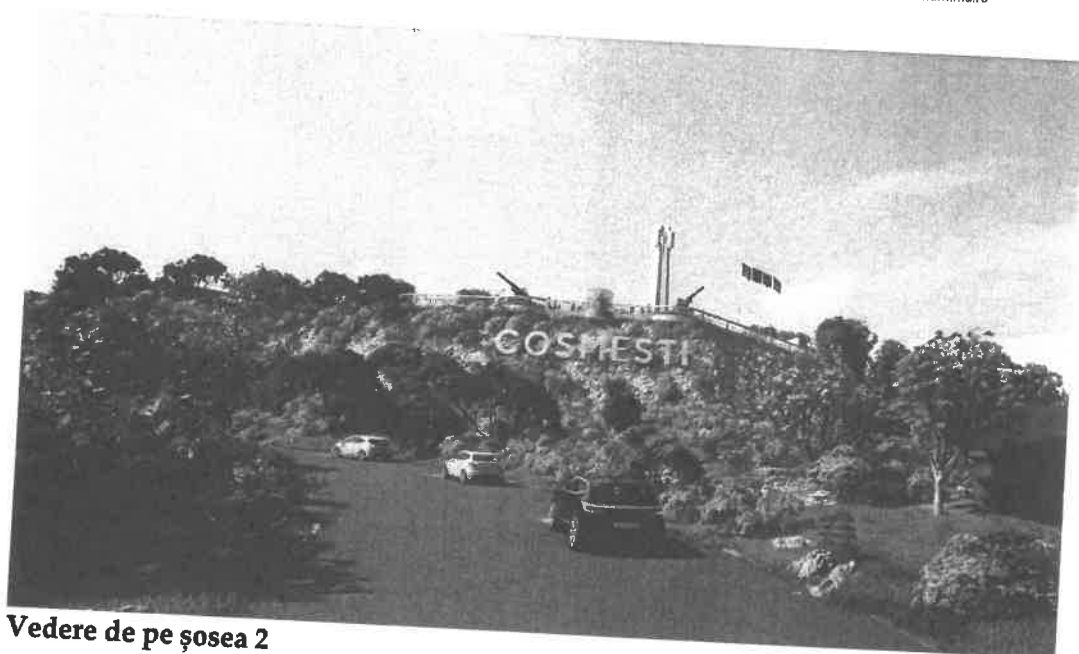

Vedere de pe șosea 2

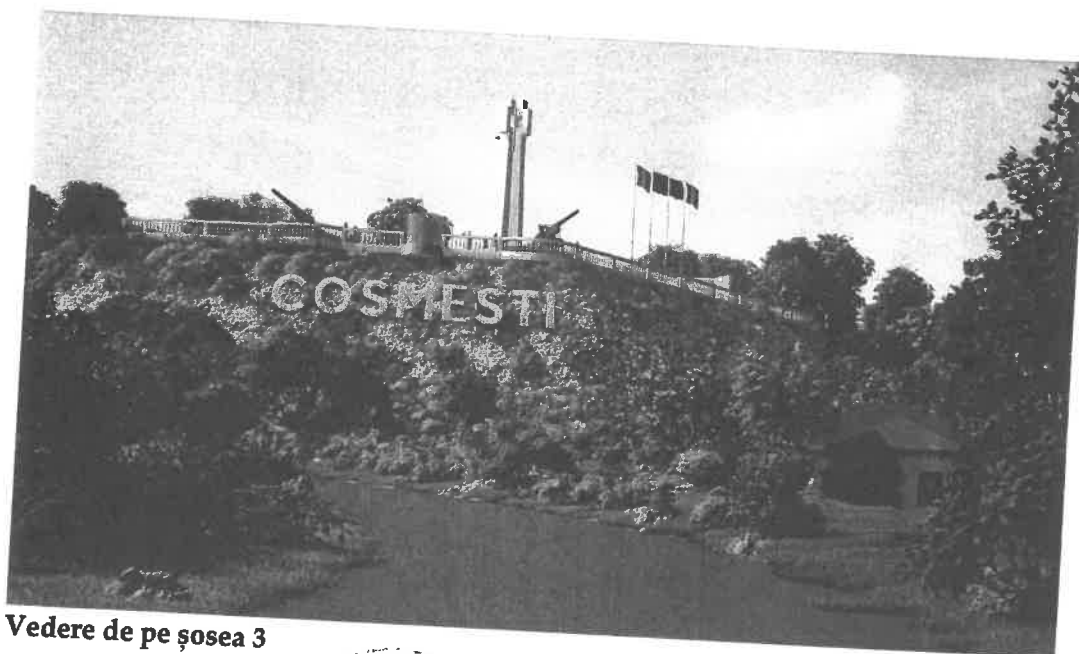

Ordinul
Arhitecților
din
România

Vedere de pe șosea 3


Autor:
PRO ARHIMED S.R.L.
ARH. DIMA GEORGIAN MIRCEA - TNA 6724



PRO-ARHIMED S.R.L.



Mun. Bucuresti, Sect.4, Aleea Ornamentului, Nr.4, Bl.E8, Ap.36, CP 041805. CIF.31086782; J40/1006/2016; TEL: 0720538138; arhimd@yahoo.ro www.arhimd.ro

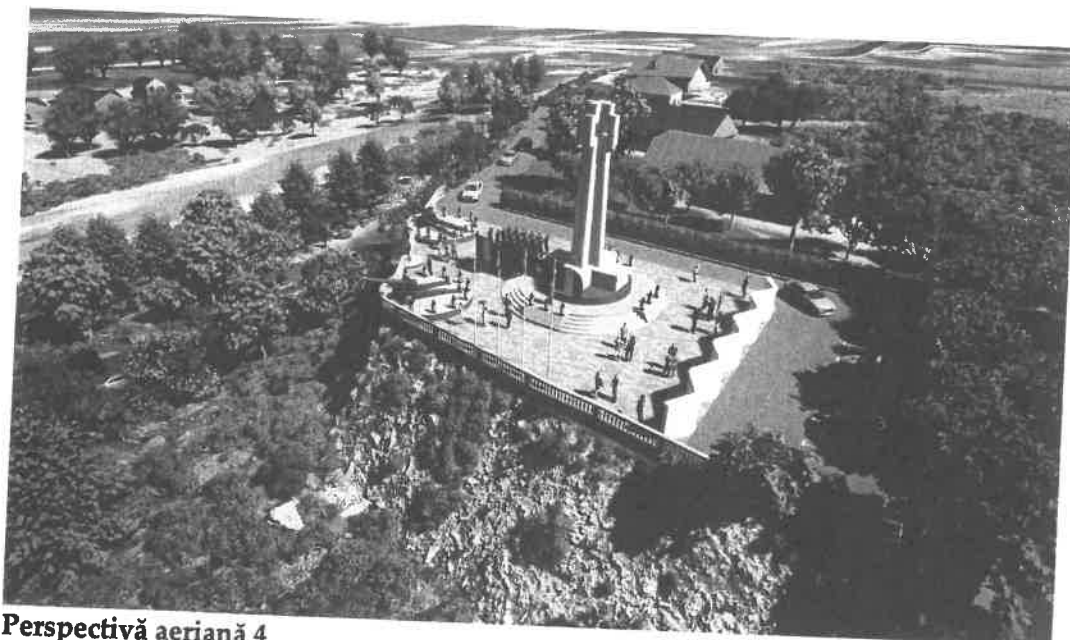

Perspectivă aeriană 4




Perspectivă aeriană 5



Ordinul
Arhitecților
din
România

Autor:
PRO ARHIMED S.R.L.
ARH. DIMA GEORGIAN MIRCEA - TNA 6724



V.20161202

Pag. 7

PRO-ARHIMED S.R.L.

CIF 31086762; J40/1006/2016 TEL: 004 0720 538 138

Beneficiar: **COMUNA COSMEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI**

Executant:

Proiectant: **PRO ARHIMED S.R.L.**

Obiectivul: **266- CONSTRUIRE MONUMENT EROI ÎN LOCALITATEA COSMEȘTI, COMUNA COSMEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI**

DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizării

In lei/euro la cursul

4,925 LEI/EURO DIN DATA 09.08.2022

TVA=

19%

		In lei/euro la cursul		4,925 LEI/EURO DIN DATA 09.08.2022		TVA=		19%	
Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (cu TVA)				
		Lei	Euro	Lei	Lei	Euro			
CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului									
1.1	Obtinerea terenului								
1.2	Amenajarea terenului	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	5.000,00	1.015,23	950,00	5.950,00	1.208,12			
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CAPITOL 1		5.000,00	1.015,23	950,00	5.950,00	1.208,12			
CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii									
2.1	Obiectul 10. Branșamente.	5.000,00	1.015,23	950,00	5.950,00	1.208,12			
TOTAL CAPITOL 2		5000,00	1015,23	950,00	5950,00	1208,12			
CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica									
3.1	Studii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.1	Studii de teren	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3	Alte studii specifice	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	Expertizare tehnica	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5	Proiectare	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5.1	Tema de proiectare	52.500,00	10.659,90	9.975,00	62.475,00	12.685,28			
3.5.2	Studiu de fezabilitate	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	35.000,00	7.106,60	6.650,00	41.650,00	8.456,85			
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	8.500,00	1.725,89	1.615,00	10.115,00	2.053,81			
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	2.500,00	507,61	475,00	2.975,00	604,06			
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	6.500,00	1.319,80	1.235,00	7.735,00	1.570,56			
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	-	-	-	-	-	-	-	-
3.7	Consultanta	-	-	-	-	-	-	-	-
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	-	-	-	-	-	-	-	-
3.7.2	Auditul financiar	-	-	-	-	-	-	-	-
3.8	Asistenta tehnica	-	-	-	-	-	-	-	-
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	24.500,00	5.076,14	4.750,00	29.750,00	6.040,61			
		2.000,00	507,61	475,00	2.975,00	604,06			

Investitie 266 - DEVIZ GENERAL

Investitie 266 - DEVIZ GENERAL

PRO-ARHIMED S.R.L.

CIF 31086762; J40/1006/2016 TEL: 004 0720 538 138

3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor					
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de cate Inspectoratul de Stat in Constructii	2.500,00	507,61	475,00	2.975,00	604,06
3.8.2	Dirigentie de santier					
TOTAL CAPITOL 3		20.000,00	4.060,91	3.800,00	23.800,00	4.832,49
CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza		77.000,00	15.736,04	14.725,00	92.225,00	18.725,89

4.1	Constructii si instalatii					
4.1.1	Obiectul 1. Consolidarea sitului prin cămășuirea taluzului vestic.	461.214,51	93.647,62	87.630,76	548.845,26	111.440,66
4.1.2	Obiectul 2. Împrejmuirea obiectivului, (inclusiv balustrada cu balustri).	79.936,60	16.230,78	15.187,95	95.124,55	19.314,63
4.1.3	Obiectul 3. Realizarea platformelor din beton amprentat.	45.723,47	9.283,95	8.687,46	54.410,93	11.047,90
4.1.4	Obiectul 4. Obelisc în formă de cruce stilizată, inclusiv soclu.	85.132,40	17.285,77	16.175,16	101.307,56	20.570,06
4.1.5	Obiectul 5. Panouri informative.	53.170,00	10.795,94	10.102,30	63.272,30	12.847,17
4.1.6	Obiectul 6. Parcare pentru vizitatori, (inclusiv alee).	7.758,00	1.575,23	1.474,02	9.232,02	1.874,52
4.1.7	Obiectul 7. Amenajare postamente pentru obuziere.	17.939,04	3.642,44	3.408,42	21.347,46	4.334,51
4.1.8	Obiectul 8. Obuziere.	12.960,00	2.631,47	2.462,40	15.422,40	3.131,45
4.1.9	Obiectul 9. Iluminat.	0,00	0,00	-	0,00	0,00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	158.595,00	32.202,03	30.133,05	188.728,05	38.320,42
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00	-	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	-	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	-	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	3.500,00	710,66	665,00	4.165,00	845,69
TOTAL CAPITOL 4		0,00	0,00	-	0,00	0,00
CAPITOL 5 Alte cheltuieli		464.714,51	94.358,28	88.295,76	553.010,26	112.286,35


5.1	Organizare de santier					
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	2.000,00	1.015,23	950,00	5.950,00	1.208,12
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00	-	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	5.000,00	1.015,23	950,00	5.950,00	1.208,12
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	10.166,86	2.064,34	0,00	10.166,86	2.064,34
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	0,00	0,00	-	0,00	0,00
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	2.348,57	476,87	-	2.348,57	476,87
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	469,71	95,37	-	469,71	95,37
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	2.348,57	476,87	-	2.348,57	476,87
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	5.000,00	1.015,23	-	5.000,00	1.015,23
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	5.000,00	1.015,23	950,00	5.950,00	1.208,12
TOTAL CAPITOL 5		0,00	0,00	-	0,00	0,00
CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste		17.166,86	4.094,79	1.900,00	22.066,86	4.480,58

6.1	Pregatirea personalului de exploatare					
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	-	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		1.500,00	304,57	285,00	1.785,00	362,44
TOTAL		1500,00	304,57	285,00	1785,00	362,44
TOTAL Constructii+Montaj		570.381,37	116.524,14	107.105,76	680.987,12	138.271,50
		469.714,51	95.373,50	89.245,76	558.960,26	113.494,47

Investitie 266 - DEVIZ GENERAL

PRO-ARHIMED S.R.L.
CIF 31086762; J40/1006/2016 TEL: 004 0720 538 138

Beneficiar
COMUNA COSMEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI



Ofertant



ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
COMUNA COSMEȘTI
PRIMAR



Str. G-ral Dumitru Dămăceanu, nr. 73, COSMEȘTI, cod postal 807085; jud. Galați; tel.: 0236336227;

Fax: 0236336218; CUI3655943; e-mail: cosmesti@gl.e-adm.ro; Web-site: www.primaria-cosmesti.ro

Nr. 7095/30.08.2022

REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotărâre privind: *Aprobarea Documentației Tehnice, faza SF pentru obiectivul „Construire monument închinat eroilor din comuna Cosmești, județul Galați”.*

Domnilor consilieri, ținând cont de prevederile Codului Administrativ, aprobat prin OUG nr. 57/2019, cu privire la obligațiile administrației publice locale pentru dezvoltarea comunităților locale și luând în considerare **aprobarea Consiliului Local Cosmești de a dezvolta proiectul de realizare a unui Monument închinat eroilor comunei Cosmești**, aduc în fața dumneavoastră un proiect de hotărâre privind ***Aprobarea Documentației Tehnice, faza SF pentru obiectivul „Construire monument închinat eroilor din comuna Cosmești, județul Galați”.***

Este de competența Consiliului Local de a discuta și aproba acest proiect și a Comisiilor de specialitate de a aviza sau a propune amendamente justificate și legale, pe care le va prezenta secretarului general al comunei înaintea ședinței.

Solicit Compartimentului Urbanism și Biroului financiar contabil întocmirea Raportului de specialitate, în termenul prevăzut de lege.

În baza acestei Hotărâri a Consiliului Local al comunei Cosmești, comuna Cosmești poate continua realizarea proiectului, care va contribui la dezvoltarea edilitară a comunei, la progresul și bunăstarea comunității.

Prin proiectul susmenționat autoritățile locale își asumă modernizarea comunității locale pentru păstrarea memoriei colective a importanței istorice pe care a reprezentat-o zona noastră. Proiectul vizează cinstirea eroilor din toate satele comunei, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 21/2022.

Astfel domnilor consilieri propun spre aprobare proiectul de hotărâre privind ***Aprobarea Documentației Tehnice, faza SF pentru obiectivul „Construire monument închinat eroilor din comuna Cosmești, județul Galați”.***

PRIMAR,
Ing. Ion Tuchiluş



RAPORT DE SPECIALITATE COMUN

La proiectul de hotărâre privind: *Aprobarea Documentației Tehnice, faza SF pentru obiectivul „Construire monument închinat eroilor din comuna Cosmești, județul Galați”.*

Prezentul raport de specialitate este întocmit în conformitate cu prevederile art. 136, alin.(4) și alin.(8) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

- Proiectul de hotărâre inițiat de d-l ing. Tuchiluş Ion, primarul comunei Cosmești, este bine justificat și corect încadrat juridic: art. 129 alin. (2) lit. “b” și alin. (4) lit. “d” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- se asigură legalitatea conform art. art. 44 alin. (1 și 4) din Legea 273 din 29 iunie 2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- proiectul este legal, necesar și oportun
- prin acest proiect se asigură creșterea nivelului de trai a cetățenilor comunei.

Se are în vedere faptul că proiectul este necesar, deoarece de mai mulți ani se dorește ridicarea unui monument al eroilor în comună, Consiliul Local și-a dat acordul de principiu de a dezvolta acest proiect prin HCL nr. 21/2022 și are o valoare sentimentală pentru cosmeșteni fiind un mod de a păstra vie amintirea istorică a comunei. Proiectul este oportun și este legal deoarece este de competența Consiliului Local de a decide aprobarea documentațiilor tehnico-economice a construirii unui monument de for public și utilizării fondurilor financiare.

Domnul primar a venit în întâmpinarea nevoilor comunității de a fi menținute în condiții bune proprietățile aparținând comunei, estetice și civilizate pentru cetățenii comunei, acest proiect fiind un demers pentru o aliniere a standardelor de întreținere, realizare și finalizare a unor obiective de interes local.

Domnul primar a venit în întâmpinarea cetățenilor cu aceste proiect pentru o aliniere a standardelor de realizare și finalizare a unor obiective locale, motiv care justifică oportunitatea și necesitatea adoptării acestei hotărâri de către Consiliul Local Cosmești.

Se are în vedere faptul că proiectul „*Aprobarea Documentației Tehnice, faza SF pentru obiectivul „Construire monument închinat eroilor din comuna Cosmești, județul Galați”.*” este necesar, deoarece este un mod festiv de a păstra memoria colectivă a evenimentelor care au marcat istoria zonei noastre.

Este un proiect sustenabil pentru bugetul comunei, acordul de realizare fiind obținut din partea Consiliului Local și bugetul permite prevederea sumelor în vederea realizării lui.

Este de competența Consiliului Local al comunei Cosmești județul Galați, în conformitate cu prevederile art. 129 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, ca în ședință să discute și să adopte Hotărârea privind „*Aprobarea Documentației Tehnice, faza SF pentru obiectivul „Construire monument închinat eroilor din comuna Cosmești, județul Galați”.*”

Consilier superior
RESPONSABIL URBANISM,
IANCU ȚUCHEL

Șef Birou financiar contabil,
Ec. Eugen Floroiu



ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COSMEȘTI



CF: 3655943; Str. G-ral Dumitru Dămăceanu, nr.73, sat Cosmești, com. Cosmești, jud. Galați, CP: 807085;
e-mail: cosmesti@el.e-adm.ro; Web-site: www.primaria-cosmesti.ro; TEL 0236336227; FAX 0236336218

HOTĂRÂREA nr. 21

Din 28.02.2022

Privind: Aprobarea Notei Conceptuale și realizării unui Monument de for public „Monument închinat eroilor din comuna Cosmești, județul Galați”.

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

- art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
- art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
- art. 84, art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare;
- art.44 alin.1 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului 907/2016 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico- economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenție;
- art. 2 și art.4 lit. a) și lit. c) din Legea 120/2006 a monumentelor de for public, cu modificările ulterioare;
- HCL 11/2022 privind aprobarea constituirii și utilizării excedentului bugetului local al comunei Cosmești pe anul 2022;

Luând act de:

- Referatul de necesitate nr. 894/01.02.2022 întocmit de secretarul general al comunei;
 - Proiectul de hotărâre și referatul de aprobare prezentate de către primarul Tuchiluş Ion, în calitate sa de inițiator, înregistrate cu nr. 1198/11.02.2022, respectiv 1256/14.02.2022;
 - raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr. 1325/17.02.2022, prin care se motivează, în drept și în fapt, necesitatea și oportunitatea proiectului;
 - raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Cosmești,
- În temeiul prevederilor art. 139, alin. (3), lit. a) și g) și art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare,**

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COSMEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI, întrunit în ședința extraordinară în data de 28.02.2022, HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă *Nota Conceptuală și realizarea unui Monument de for public „Monument închinat eroilor din comuna Cosmești, județul Galați” pe terenul situat în Cosmești, str. Magnoliei, nr. 27, 28, P39, cu suprafață de 780mp, CF 107184.*

Art.2. Prezenta Hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primarul comunei Cosmești, prin aparatul de specialitate.

Art.3. Prezenta va fi adusă la cunoștința Instituției Prefectului Galați, primarului, Biroului financiar-contabil și va fi făcută publică prin afișare și publicare pe pagina web a Comunei Cosmești prin grija secretarului general al comunei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Lionte Radu

[Signature]



Contrasemnează,
Secretar general al comunei
Cristina Zaharia

[Signature]

Consilieri în funcție =15; Consilieri prezenți =14; Consilieri „pentru” =14; Consilieri” contra” =0.

Aprob,
Primar,
Ing. Ion Tuchiluş
L.S.

NOTĂ CONCEPTUALĂ –

conținut-cadru conform H.G.907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice –

1. Informații generale privind obiectivul de Investiții propus:

1.1. Denumirea obiectivului de investiții: **Monument închinat eroilor din comuna Cosmești, județul Galați.**

1.2. Ordonator principal de credite/investitor: **Comuna Cosmești.**

1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar): -

1.4. Beneficiarul investiției: **Comuna Cosmești, județul Galați.**

2. Necesitatea și oportunitatea obiectivului de investiții propus

2.1. Scurtă prezentare privind:

a) deficiențe ale situației actuale:

Pe locul propus pentru edificarea obiectivului comemorativ, există documente și fotografii cu privire la evenimentele prilejuite de Primul Război Mondial când, în această zonă, au fost desfășurate ample mișcări de trupe ale Armatei Române, care au fost conduse de generalul Eremia Grigorescu. În confruntările armate și-au pierdut viața fii ai comunei Cosmești, a căror memorie trebuie să fie cinstită prin edificarea monumentului pe care îl vom descrie în prezenta Notă Conceptuală. De asemenea, tot în acest loc, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, au avut loc lupte între trupele germane și cele de eliberare. Totodată, edificiul are menirea de a menține vie amintirea jertfelor eroilor cosmeșteni căzuți pe toate câmpurile de luptă din cele două conflagrații mondiale.

b) efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiții:

Prin realizarea acestui ansamblu comemorativ, comuna Cosmești, județul Galați, se va înscrie pe harta obiectivelor comemorative ale eroilor români care și-au jertfit viețile pentru apărarea patriei. Realizarea sitului va crea un spațiu menit desfășurării de activități oficiale, culturale, sociale legate de istoria comunei. Obeliscul în formă de cruce stilizată, prin înălțimea sa va atrage turiștii aflați în zonă. Pe timpul nopții, acesta va putea fi vizibil de la distanță foarte mare, astfel devenind un punct de reper în zonă. În cadrul ansamblului se vor realiza o serie de panouri informative imprimate pe care se vor prezenta informații legate de istoria comunei, a sitului și a evenimentelor desfășurate în zonă în decursul timpului. Pentru evocarea luptelor eroice desfășurate în perioada primului război mondial, se va construi un *punct de belvedere* cu un ecran din sticlă securizată și gravată cu harta militară a luptelor din vara anului 1917 prin intermediul căreia, privitorul va putea înțelege însemnătatea promontoriului în timpul războiului, dar și disponerea forțelor combatante în regiune. Prin realizarea obiectivului, se vor putea realiza evenimente și comemorări ale eroilor, inclusiv vizite organizate ale claselor de la școlile din comună sau din localitățile învecinate, în vederea desfășurării unor cursuri interactive, privind istoria zonei în ansamblul istoriei naționale. Acesta se dorește a deveni un punct de atracție pentru turiștii care trec prin zonă, pentru locuitorii din zonele învecinate, pentru toți pasionații de reprezentarea zonei în conglomeratul istoriei naționale. Comuna Cosmești, prin amplasarea ei a făcut parte din linia frontului supracunoscută Mărășești-Mărăști-Oituz, Podul de peste Siret de aici de la Cosmești fiind nod de trecere important pe axa est-vest.

c) impactul negativ previzionat în cazul nerealizării obiectivului de investiții:

Prin nerealizarea obiectivului, istoria comunei va rămâne în continuare prea puțin cunoscută și importanța eroilor locali în contextul eroilor naționali va fi veșnic subapreciată. Nerealizarea sitului comemorativ va duce la pierderea memoriei colective pentru generațiile următoare, referitor la evenimentele istorice desfășurate în zonă, de o importanță națională, știut fiind că aici în zona noastră a avut sediul cel mai mare spital de campanie, coordonat chiar de către Regina Maria. Comunitatea pierde posibilitatea atragerii de turiști și implicit de fonduri care ar putea fi surse de venituri pentru investitori locali și pentru autoritățile publice locale.

2.2. Prezentarea, după caz, a obiectivelor de investiții cu aceleași funcțiuni sau funcțiuni similare cu obiectivul de investiții propus, existente în zonă, în vederea justificării necesității realizării obiectivului de investiții propus:

Pe teritoriul comunei Cosmești nu mai există investiții de asemenea amploare, cel mai apropiat fiind Mausoleul de la Mărășești, dar care nu comemorează în mod explicit eroii locali și nici evenimentele desfășurate în această zonă, fiind după cum se știe, un ansamblu cu caracter național, de patrimoniu.

2.3. Existența, după caz, a unei strategii, a unui master plan ori a unor planuri similare, aprobate prin acte normative, în cadrul cărora se poate încadra obiectivul de investiții propus: *Nu este cazul.*

2.4. Existența, după caz, a unor acorduri internaționale ale statului care obligă partea română la realizarea obiectivului de investiții: *Nu este cazul.*

2.5. Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investiției:

Prin realizarea acestei investiții va crește afluența de turiști, Comuna Cosmești va deveni un reper socio cultural pentru zonă. Prin atragerea turiștilor în zonă, vor fi stimulați investitorii privați locali în dezvoltarea de mici afaceri care vor duce la creșterea nivelului de trai pentru locuitorii zonei. Construirea sitului va contribui la menținerea memoriei colective cu privire la evenimentele desfășurate în zonă, a personalităților care au participat, a cunoașterii eroilor locali și a cinstirii permanente a acestora dar și a celor care au căzut la datorie pe raza comunei Cosmești, întru apărarea țării, etc.

3. Estimarea suportabilității investiției publice:

3.1. Estimarea cheltuielilor pentru execuția obiectivului de investiții, luându-se în considerare, după caz: - costurile unor investiții similare realizate; - standarde de cost pentru investiții similare:

Obiectul 1. Studii de fezabilitate și Proiectare;

Obiectul 2. Consolidarea sitului prin cămășuirea taluzului vestic.

Obiectul 3. Împrejmuirea obiectivului.

Obiectul 4. Realizarea platformelor din beton amprentat.

Obiectul 5. Obelisc în formă de cruce stilizată, inclusiv soclu.

Obiectul 6. Panouri informative.

Obiectul 7. Parcare pentru vizitatori.

Obiectul 8. Amenajare postamente pentru obuziere.

Obiectul 9. Obuziere.

Obiectul 10. Iluminat.

Obiectul 11. Branșamente.

Valoarea totală a întregului obiectiv este estimată la circa 660.000 lei, valoare cu TVA, în care este inclusă și valoarea capitolului 3 din Devizul general: proiectare și asistență tehnică, inclusiv studii.

3.2. Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentației tehnico-economice aferente obiectivului de investiție, precum și pentru elaborarea altor studii de specialitate în funcție de specificul obiectivului de investiții, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege:

-valoarea propusă pentru capitolul 3 Cheltuieli pentru asistență tehnică, inclusiv pentru realizarea studiilor necesare, este considerată în cuantum de aproximativ 10% din valoarea investiției.

3.3. Surse identificate pentru finanțarea cheltuielilor estimate (în cazul finanțării nerambursabile se va menționa programul operațional/axa corespunzătoare, identificată):

Investiția va fi realizată din fonduri ale administrației publice locale, donații și sponsorizări. Se va informa autoritatea deliberativă cu privire la sumele din sponsorizări sau donații, destinate exclusiv efectuării acestui monument.

4. Informații privind regimul juridic, economic și tehnic al terenului și/sau al construcției existente:

Terenul pe care se propune realizarea obiectivului identificat prin Cartea Funciară nr 107184, cu Număr Cadastral 107184, în suprafață de 780 mp, este proprietate publică a comunei Cosmești, județul Galați. Terenul este dobândit prin Contract de Donație autentificat prin încheierea nr 4558 din 01/09/2021, de către BNP Manoliu Ionuț-Bogdan. Terenul situat în Comuna Cosmești, strada Magnoliei, nr 27, identificat cu CF 107184, a fost donat comunei Cosmești de către Doamna Bărlădeanu Gabriela, cu acest scop "utilitate publică (amenajare monument comemorativ)", pentru a fi folosit pentru realizarea obiectivului propus.

Din punct de vedere economic, este un teren arabil, la marginea satului, în apropiere de malul înal al Siretului, cu o suprafață mică, dar care din punct de vedere tehnic este propice efectuării unui astfel de proiect, fiind pe un teren înalt față de comună și care dispune de amplitudinea necesară vizualizării obiectivului.

5. Particularități ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru realizarea obiectivului de investiții:

a) descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (localizare, suprafața terenului, dimensiuni în plan): Terenul pe care se propune realizarea investiției are suprafața de 780 mp, este situat în Comuna Cosmești, strada Magnoliei, nr 27, județul Galați, identificat cu CF 107184 și proprietate publică a comunei Cosmești. Terenul este situat pe un promontoriu care oferă vizibilitate asupra întregii zone, evidențiat în special de pe Drumul European

DE581 și/sau calea ferată care leagă Mărășești de Tecuci (București-Iași). Terenul are dimensiunile de 40,67 m pe direcția Est-Vest și 21,99 m pe direcția Nord-Sud, fiind perfect pentru edificarea obiectivului propus.

b) relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile:

Situl este conectat cu Drumul European E581 prin strada Magnoliei, cale de acces foarte bună și pe care comuna Cosmești, intenționează să o cuprindă în primul proiect de asfaltare al străzilor locale.

c) surse de poluare existente în zonă: *Nu este cazul.*

d) particularități de relief:

Terenul este amplasat pe promontoriul dealului oferind vizibilitate asupra văii Siretului și a căilor de comunicații – drum, cale ferată – care tranzitează comuna.

e) nivel de echipare tehnico-edilitară a zonei și posibilități de asigurare a utilităților:

În proximitatea terenului se află o rețea edilitară pentru energie electrică și pe viitor, dacă se va constitui Rețea inteligentă de distribuție a gazelor naturale, poate fi racordat și la această rețea în interesul ținerii aprinse ale unor torțe permanente.

f) existența unor eventuale rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate: *Nu este cazul.*

g) posibile obligații de servitute: *Nu este cazul.*

h) condiționări constructive determinate de starea tehnică și de sistemul constructiv al unor construcții existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenții, după caz: *Nu este cazul.*

i) reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentațiilor de urbanism aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal și regulamentul local de urbanism aferent:

Se vor respecta reglementările urbanistice zonale conform Certificatului de Urbanism pe care îl va emite Primăria Cosmești în faza de dezvoltare a Temei de proiectare.

j) existența de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate: *Nu este cazul.*

6. Descrierea succintă a obiectivului de investiții propus, din punct de vedere tehnic și funcțional:

a) destinație și funcțiuni: Ansamblul comemorativ propus pentru edificare prin obiectele din care va fi format din Monument, Postament placat cu marmură, panouri informative, 2 obuziere, un spațiu pentru vizionare, alee de acces, locuri de parcare, catarge pentru drapele, panouri informative, spațiu verde și împrejmuire. Va avea destinația de spațiu social, cultural și petrecere a timpului liber. Se dorește ca prin construcția întregului ansamblu, acest loc să devină un punct de referință, un reper geografic pentru întreaga regiune, nu numai pentru comuna Cosmești. În acest fel, ansamblul trebuie să devină „un magnet” pentru vizitatori, pentru turiști, clase de copii care îl vor vizita în scopuri de documentare istorică, inclusiv ca punct de întâlnire pentru locuitorii localității. Odată cu iluminarea pe timpul nopții a obeliscului stilizat în formă de cruce și a obuzierelor, întregul ansamblu va putea fi vizibil de la distanță, ceea ce îi va da un plus valoare artistică. Funcțiunea principală va fi aceea de loc de comemorare a eroilor. Spațiul va putea găzdui diferite ceremonii laice sau religioase la care să poată participa și publicul larg. Prin dispunerea informativă, se va păstra caracterul documentar și educativ cu privire la evenimentele petrecute în sit dar și asupra memoriei istorice a participanților. Folosirea celor două obuziere, pe lângă crearea atmosferei militare vor avea și rolul de exponate de muzeu. Postamentele pe care vor fi dispuse obuzierele în poziție de tragere, vor fi împrejmuite cu un sistem de obuze stilizate, legate între ele cu un lant, astfel încât să limiteze trecerea dar să nu incomodeze vizionarea acestora. Pe obuzele stilizate vor fi inscripționate numele toponimice și datele desfășurării luptelor la care au participat eroii comunei Cosmești.

Pe latura sud-vestică, pe marginea promontoriului se va amplasa un punct de belvedere prin intermediul căruia vizitatorii vor avea posibilitatea să înțeleagă mai bine desfășurarea luptelor de la Cosmești, dispunerea unităților tactice, desfășurarea luptelor, cât și traiectoria proiectilelor de artilerie. Punctul de belvedere va fi dotat cu un binoclu care va ghida perspectiva privitorului.

În cadrul acestui proiect, într-o fază ulterioară se va putea realiza o digitalizare a sitului, care să ofere un grad de interacțiune a vizitatorilor cu informațiile documentare prezentate, astfel încât să poată fi realizate holograme cu diferite momente sau persoane (personalități) legate de evenimentele comemorate sau de localitate. Prin intermediul unor coduri QR, la o simplă scanare, pot fi furnizate informații documentare direct pe dispozitivele inteligente folosite de vizitatori. Pentru o și mai bună punere în rol, se pot implementa sisteme audio care să reproducă atmosfera de luptă, narațiuni regizate, coloane sonore muzicale... etc. Această fază ulterioară nu este bugetată în prezenta nota conceptuală, urmând a face obiectul altei investiții.

b) caracteristici, parametri și date tehnice specifice, preconizate:

Obiectul 1. Consolidarea sitului prin cămășuirea taluzului vestic. În urma realizării studiului geotehnic se va stabili dacă vor fi necesare lucrări de consolidare a dealului pe versantul vestic. Lucrările propuse vor consta în cămășuirea

dealului și torcretarea cu beton proiectat, care ulterior va avea aspectul de piatră. Suprafața propusă pentru a fi consolidată este de aproximativ 420 mp.

Obiectul 2. Împrejmuirea obiectivului. Se propune a se realiza pe latura nordică și estică din panouri prefabricate din beton, cu o lungime totală de aproximativ 84,0 m, pe latura sudică, spre calea ferată, din panouri bordurate cu înălțimea de 1,2 m și lungime de 35,62 m, dublată de gard viu, iar pe latura vestică, cu o balustradă cu baluștri în lungime totală de 52,0 m, care să împiedice posibila avansare a vizitatorilor până la marginea dealului.

Obiectul 3. Realizarea platformelor din beton amprentat. Se propune realizarea unei platforme generale din beton amprentat pe un terasament din piatră tasată, conform studiului geotehnic. Platformă din beton amprentat- 467,50 mp, cale de acces către parcare: 359,50 mp, parcare- 282,00 mp.

Obiectul 4. Obelisc în formă de cruce stilizată, inclusiv soclu. Baza obeliscului va fi înălțată la 0,87 m și se va accede pe aceasta prin intermediul a 5 trepte. Soclul obeliscului va avea o înălțime de 1,5 m, și un volum total de 30,0 mc și va fi realizat din beton armat, astfel încât să poată prelua sarcinile și încărcările date de obeliscul propriu- zis. Pe fețele soclului vor fi dispuse o serie de plăci pe care vor fi înscrise numele eroilor și bătăliile la care au participat. Tot pe acest soclu, vor fi dispuse niste cârlige pentru a putea fi montate coroanele sau jerbele care vor fi aduse în timpul ceremoniilor.

Obeliscul propriu zis va avea înălțimea proprie de 11,10 m cu un volum de beton armat de cca. 27,86 mc și va da o înălțime maximă a întregului ansamblu de circa 13,80 m, peste care se va monta o baliză de semnalizare pentru semnalizarea obstacolului în traseele aeriene.

Obiectul 5. Panouri informative. Panourile informative vor avea o lungime totală de 27 metri cu o înălțime de circa 2,4 metri. Pe fața interioară acestea vor fi placate cu o serie de litouri imprimate pentru exterior, prin intermediul cărora se va putea realiza o documentare a vizitatorilor. Suprafață totală pentru expunere este de aproximativ 54,0 mp.

Obiectul 6. Parcare pentru vizitatori. Se prevede realizarea unei parări pentru 22 locuri de parcare, din care 2 vor fi adaptate pentru persoane cu dizabilități. Suprafața totală parcare, fără calea de rulare este de 282,0 mp.

Obiectul 7. Amenajare postamente pentru obuziere. Obuzierele vor fi amplasate în poziție de tragere, pe niște postamente cu dimensiunile de 4x 6m cu înălțimea de 35 cm. Postamentele vor fi împrejmuite cu un sistem de obuze stilizate, legate între ele cu un lanț, astfel încât să limiteze trecerea dar să nu incomodeze vizionarea acestora. Pe obuzele stilizate vor fi inscripționate numele toponimice și datele desfășurării luptelor la care au participat eroii comunei Cosmești.

Obiectul 8. Obuziere. Obuzierele vor fi preluate de la Ministerul Apărării Naționale după ce vor fi blintuite și dezafectate, astfel încât să nu mai poată fi folosite pentru trageri ci doar ca exponat de muzeu.

Obiectul 9. Iluminat. Se propune realizarea iluminarea prin intermediul mai multor circuite după cum urmează:

- realizarea unui iluminat ambiental al întregului sit;
- iluminarea panourilor informative;
- iluminarea multicoloră a obeliscului și a celor două obuziere, astfel încât să poată fi vizibile de la distanță foarte mare.

Obiectul 10. Branșamente. Situl va fi branșat la rețeaua de curent electric din zonă.

c) durată minimă de funcționare apreciată corespunzător destinației/funcțiunilor propuse: Minim 50 ani. Este dedicat eroilor comunei, devine responsabilitatea cosmeștenilor de a-l păstra și menține vizibil, indiferent cine va trăi aici în continuare.

d) nevoi/solicitări funcționale specifice: Nu este cazul.

7. Justificarea necesității elaborării, după caz, a:

- studiului de fezabilitate, în cazul obiectivelor/proiectelor majore de investiții: Nu este cazul.
- expertizei tehnice și, după caz, a auditului energetic ori a altor studii de specialitate, audituri sau analize relevante, inclusiv analiza diagnostic, în cazul intervențiilor la construcții existente:

În faza de elaborare a Studiului de Fezabilitate se vor realiza Studiu Geotehnic și Studiu Topografic.

- unui studiu de fundamentare a valorii resursei culturale referitoare la restricțiile și permisivitățile asociate cu obiectivul de investiții, în cazul intervențiilor pe monumente istorice sau în zone protejate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Lionte Radu

[Signature]



Contrasemnează,

Secretar general al comunei

Cristina Zaharia

[Signature]



EXTRAS DE CARTE FUNCİARĂ PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 107184 Cosmesti

TEREN Extravilan

A. Partea I. Descrierea imobilului

Adresa: Jud. Galati

Nr. Crt	Nr. cadastral Nr. topografic	Suprafața* (mp)	Observații / Referințe
A1	107184	780	Teren neîmprejmuit; LOTUL 1. TERENUL ESTE ÎMPREJMUIT CU GARD DIN TABLA DOAR PE LATURA NORD

B. Partea II. Proprietari și acte

Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale		Referințe
31125 / 02/09/2021 Act Notarial nr. act de dezlipire și contract de donație aut. nr. 4558, din 01/09/2021 emis de BNP Manoliu Ionut Bogdan;		
B1	Se înființează cartea funciara 107184 a imobilului cu numărul cadastral 107184 / UAT Cosmesti, rezultat din dezmembrarea imobilului cu numărul cadastral 107159 înscris în cartea funciara 107159;	A1
31126 / 02/09/2021 Act Notarial nr. act de dezlipire și contract de donație aut. nr. 4558, din 01/09/2021 emis de BNP Manoliu Ionut Bogdan;		
B3	Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1 1) COMUNA COSMESTI DOMENIUL PUBLIC, CIF:3655943	A1


C. Partea III. SARCINI .

Înscrieri privind dezmembrările dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini	Referințe
NU SUNT	

Teren

Nr cadastral	Suprafața (mp)*	Observații / Referințe
107184	780	LOTUL 1. TERENUL ESTE IMPREJMUIT CU GARD DIN TABLA DOAR PE LATURA NORD

* Suprafața este determinată în planul de proiecție Stereo 70.

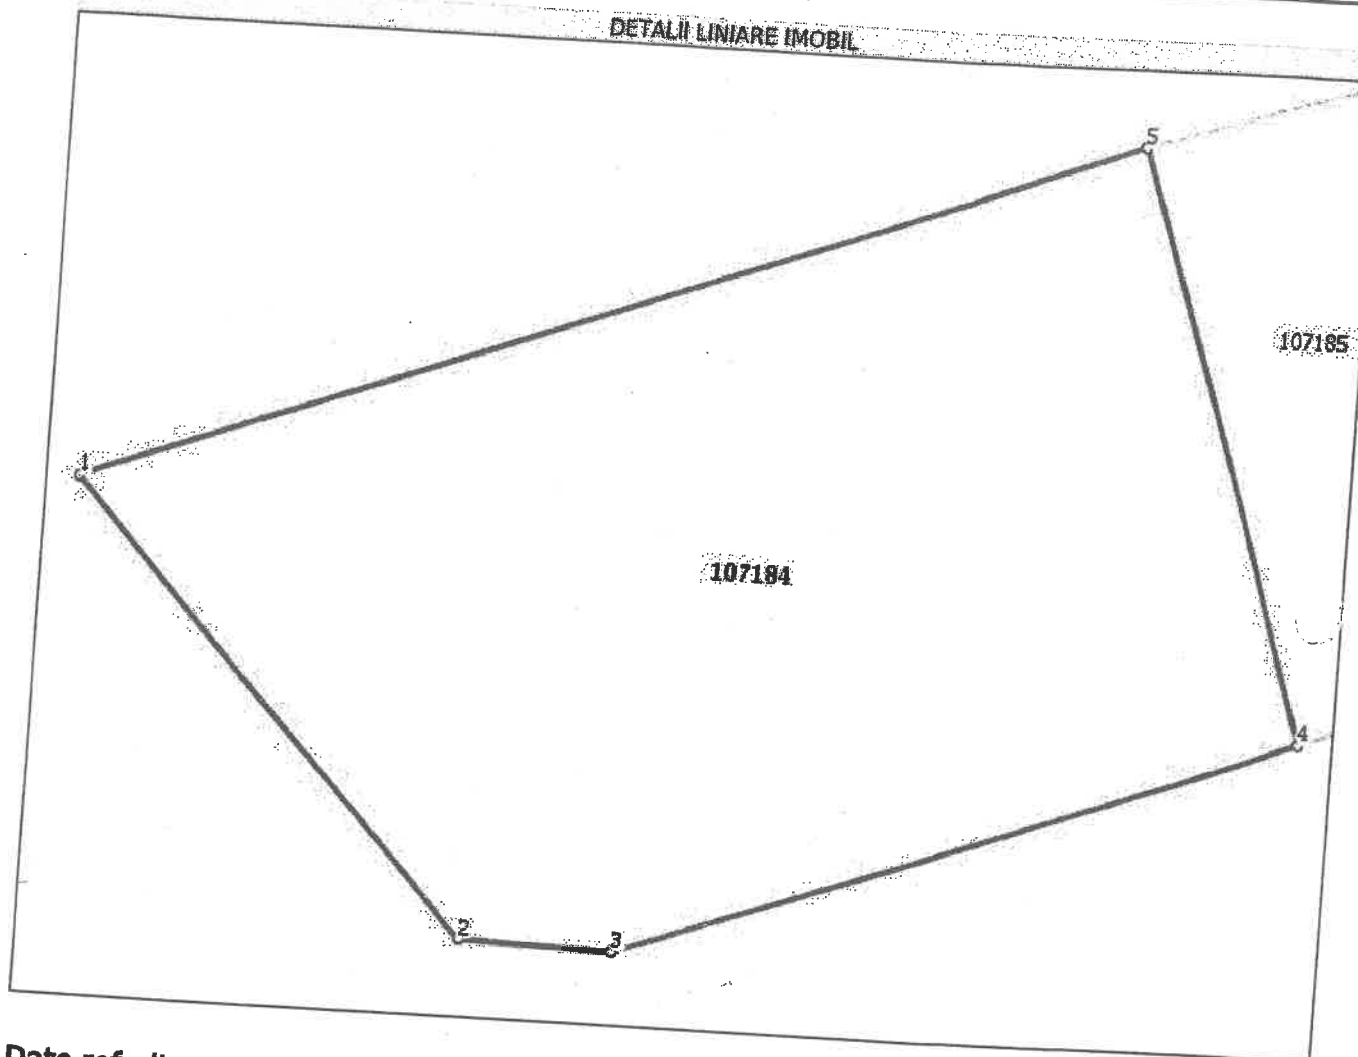

Date referitoare la teren


Nr Crt	Categorie folosință	Intra vilan	Suprafața (mp)	Tarla	Parcelă	Nr. topo	Observații / Referințe
1	arabil	NU	780	28	39	-	LOTUL 1

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început	Punct sfârșit	Lungime segment (m)
1	2	21.936
2	3	5.715
3	4	26.26
4	5	21.993
5	1	40.67


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.
 *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

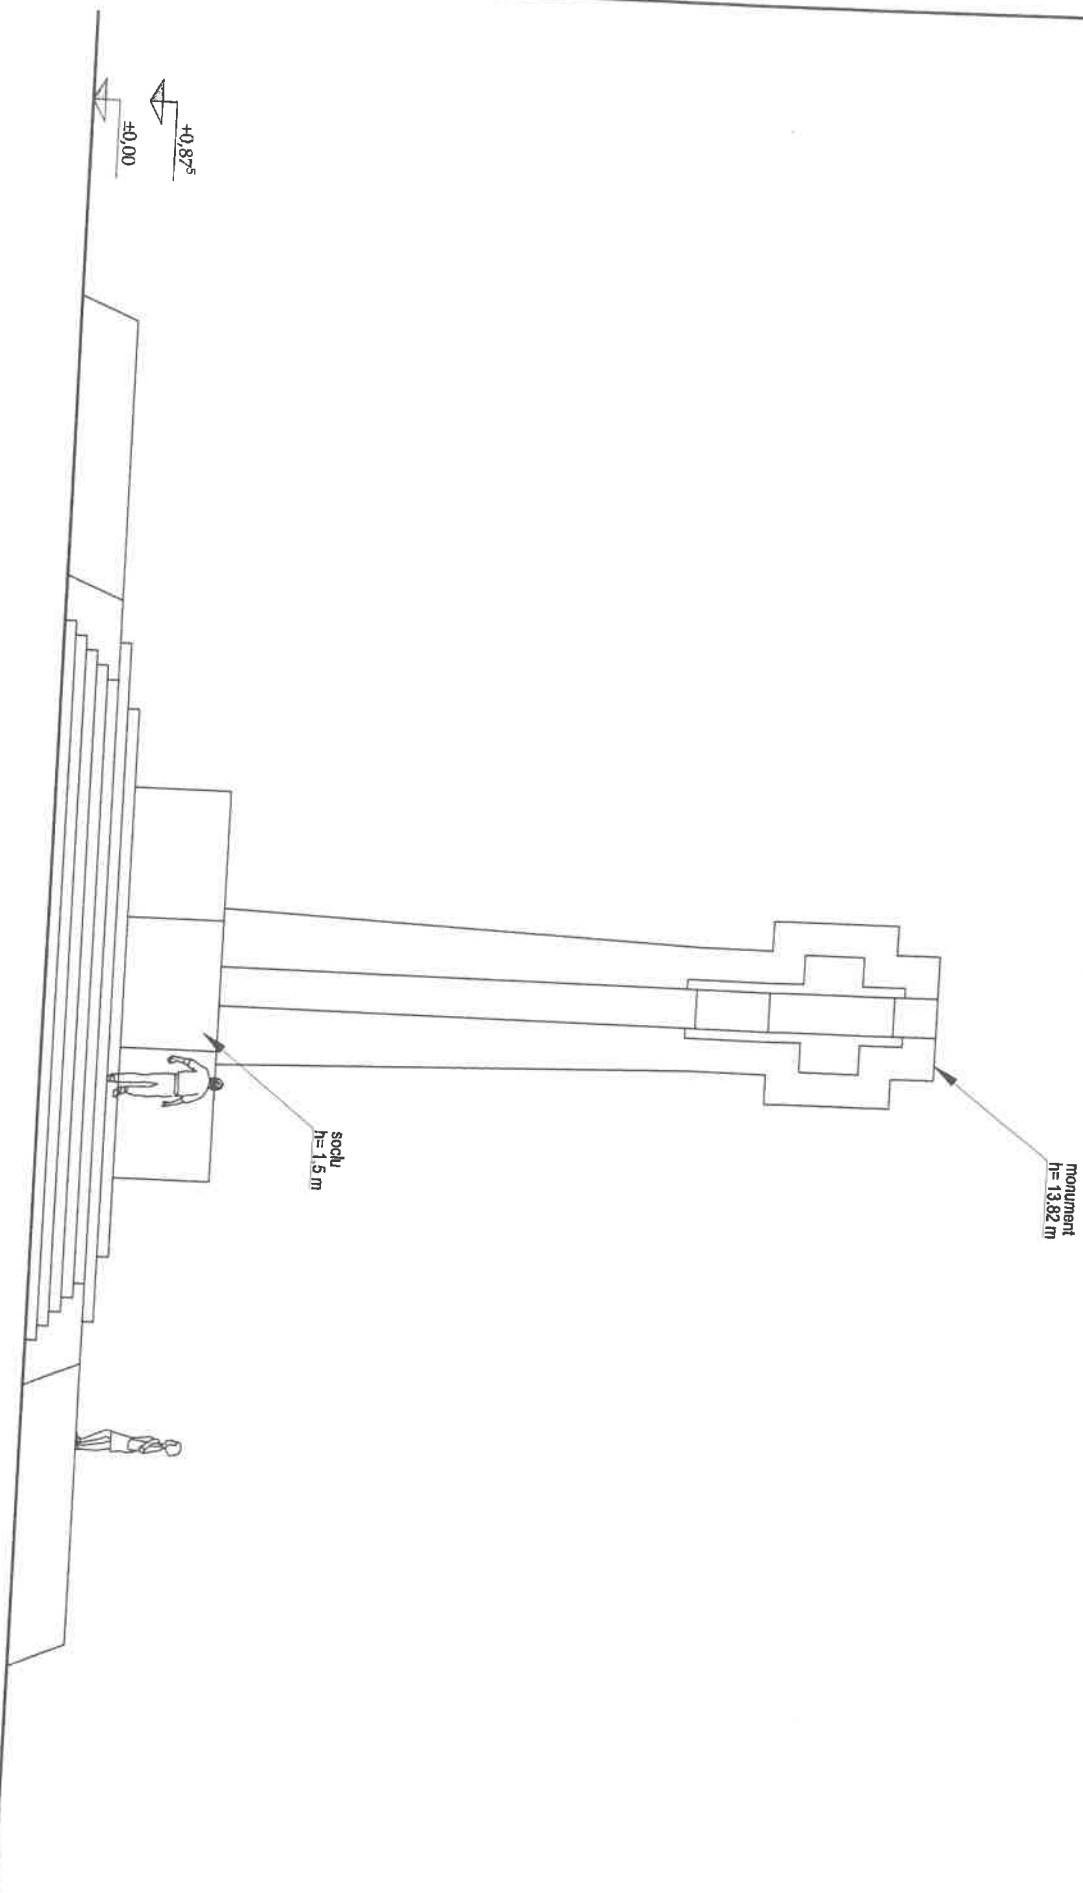

Proiectant: **MONUMENT ÎNCHINAT EROILOR DIN COSMEȘTI.**
Amplasament: **COMUNA COSMEȘTI, STR**
MAGNOULIEI, NR 27,
NR CAD. 107159, CF. 107159

Beneficiar: **COMUNA COSMEȘTI**

PROPUNERE VEDERE LATERALA A MONUMENTULUI
A 001 SCARA 1/75

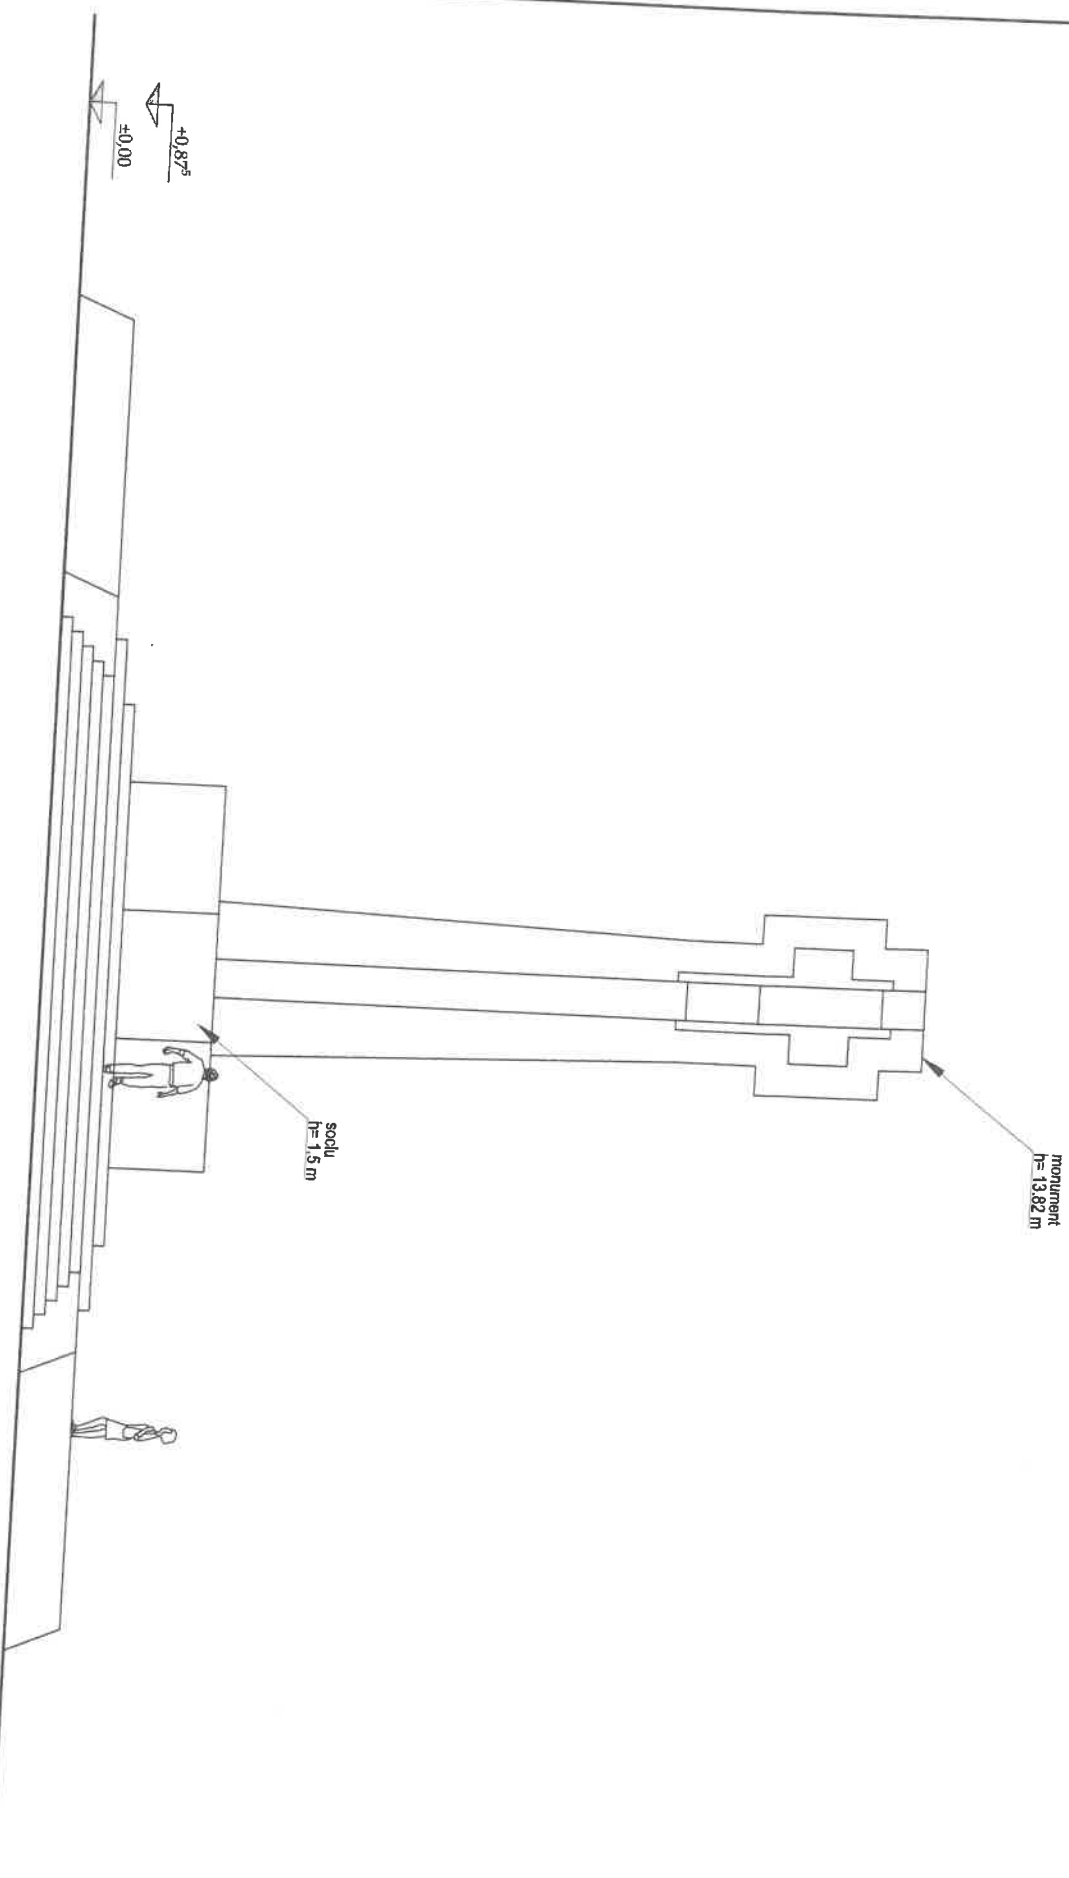


PLANUL DE ÎNCADRARE

MONUMENT ÎNCHINAT EROILOR DIN COSMEȘTI.
Amplasament:
COMUNA COSMEȘTI, STR
MAGNOLIEI, NR 27,
NR CAD. 107159, CF. 107159

Beneficiar:
COMUNA COSMEȘTI

PROPOUNERE VEDERE LATERALA A MONUMENTULUI

A 001 SCARA 1/75

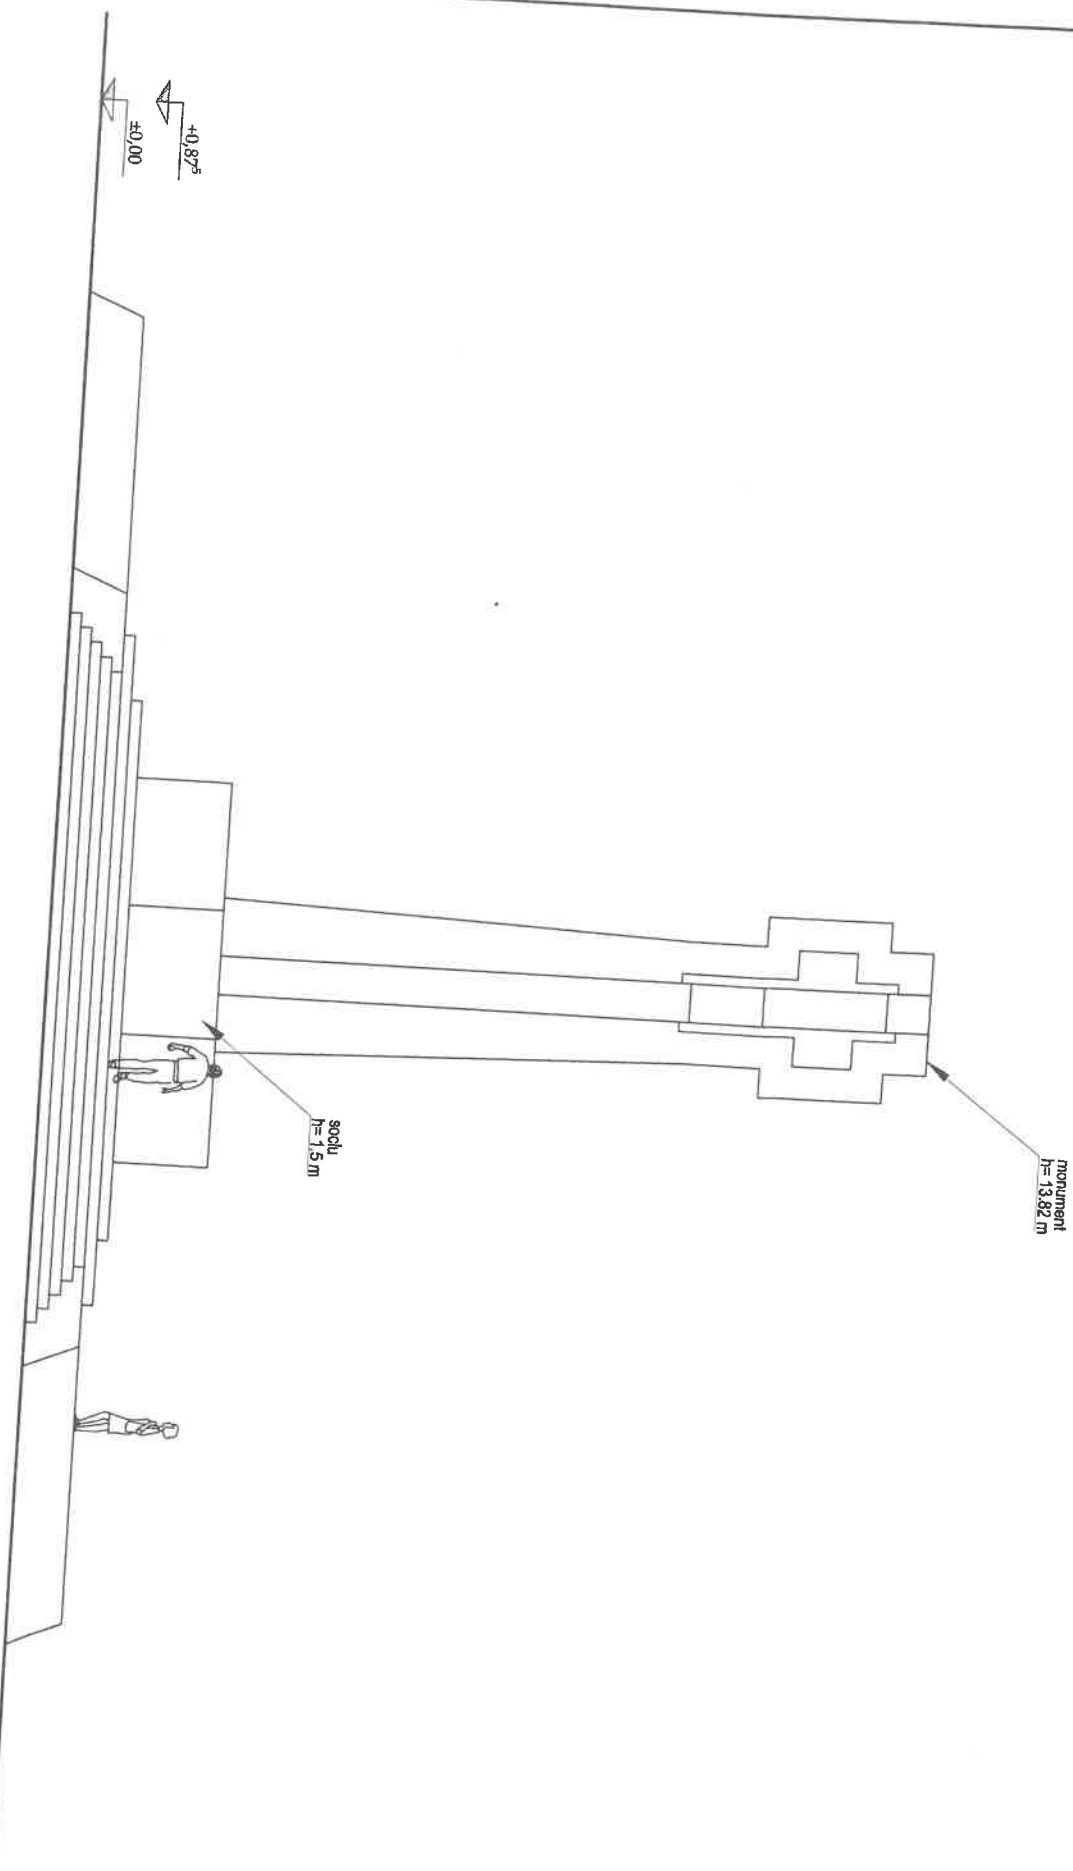


Beneficiar: **Comuna Cosmești**
Amplasament: **Comuna Cosmești, Str. Magnoliei, Nr. 27, Nr. Cad. 107159, Cf. 107159**

Beneficiar: **Comuna Cosmești**

PROPOUNERE VEDERE LATERALA A MONUMENTULUI

A 001 SCARA 1/75

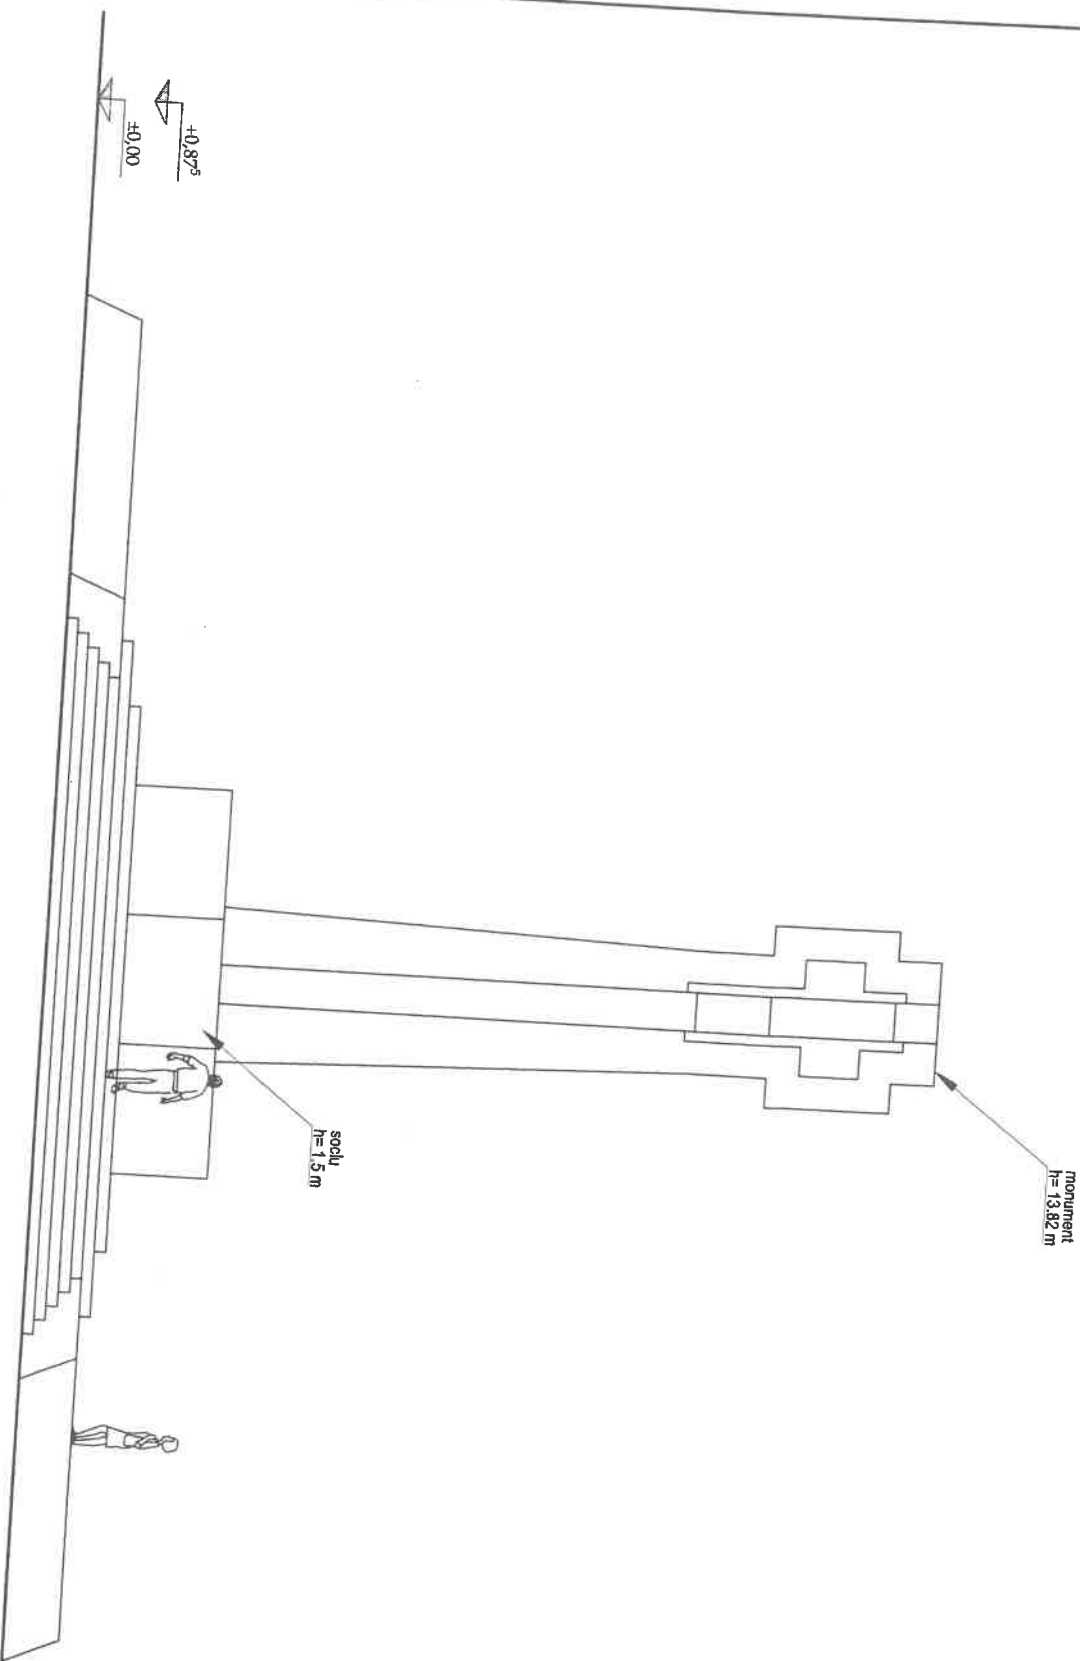

Obiectiv cultural nr. 12
MONUMENT ÎNCHINAT EROILOR DIN COSMEȘTI.
Amplasament:
COMUNA COSMEȘTI, STR
MAGNOLEI, NR 27,
NR CAD. 107159, CF. 107159
Beneficiar:
COMUNA COSMEȘTI

PROFUNDARE VEDERE LATERALA A MONUMENTULUI
A 001 SCARA 1/75

22

7083
08 30

REFERAT DE NECESITATE

Am fost
Progr. urgent
monument
în Consiliul Local
30.08.2022

Domnule Primar,

Subsemnatul Țuchel Iancu, consilier superior în cadrul compartimentului Urbanism, Achiziții Publice, vă aduc la cunoștință că a fost întocmit Studiul de fezabilitate pentru proiectul Construire monument eroi în localitatea Cosmești, Comuna Cosmești, Județul Galați, aprobat de către Consiliul Local conform HCL 21/28.02.2022, privind aprobarea Notei Conceptuale și realizării unui monument de for public "Monument închinat eroilor din comuna Cosmești, județul Galați", care trebuie adus la cunoștința Consiliului local pentru aprobare.

Vă rog dispuneți!





**ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
COMUNA COSMEȘTI
PRIMAR**



Str. G-ral Dumitru Dămăceanu, nr. 73, COSMEȘTI, cod postal 807085; jud. Galați; tel.: 0236336227;

Fax: 0236336218; CUI 3655943; e-mail: cosmesti@el.e-adm.ro; Web-site: www.primaria-cosmesti.ro

Nr. 7201/02.09.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Privind: rectificarea bugetului local al Comunei Cosmești, județul Galați pentru anul 2022.

Inițiat de: primar Ion Tuchiluş validat prin Încheierea în Camera de Consiliu a Judecătorei Tecuci, în dosarul nr. 4235/324/2020;

Înregistrat la nr. 7201/02.09.2022

Analizând prevederile:

- art. 7 alin. (2) din Codul civil;
- art. 19 alin. (2) și art. 20, alin. (1) lit. c) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 105, alin. (1) și (2), din Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;
- Legii 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022;
- art. 129, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a) și lit. g), alin. (7), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare;

Luând act de :

- Referatul de necesitate nr. 7199/01.09.2022 întocmit de șeful Biroului financiar contabil,
- Adresele DGRFP Galați nr. 16915/29.08.2022 înregistrată sub nr. 7029/29.08.2022, Școlii gimnaziale Cosmești nr. 1925/18.08.2022 înregistrată sub nr. 6755/18.08.2022, nr. 2015/01.09.2022 înregistrată sub nr. 7194/01.09.2022 și a Clubului sportiv nr. 222/31.08.2022 înregistrată sub nr. 7100/31.08.2022;
- Proiect de hotărâre 7201/02.09.2022 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Cosmești, județul Galați pe anul 2022 și referatul de aprobare înregistrat sub nr. 7206/02.09.2022 al primarului comunei Cosmești, în calitate sa de inițiator;
- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cosmești, înregistrat sub nr. 7297/05.09.2022;
- raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului Local al comunei Cosmești, județul Galați,

În temeiul art. 139, alin. (3), lit. a) și cel al art. 196, alin. (1) lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare,

**CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COSMEȘTI, întrunit în ședință
extraordinară în data de adoptă prezenta hotărâre:**

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Cosmești, județul Galați pentru anul 2022, conform **Anexei nr. 1** la prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei, prin aparatul de specialitate, respectiv Biroul financiar contabil.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în termenul prevăzut de lege, de către secretarul general al comunei, primarului, Biroului financiar contabil, Instituției Prefectului Galați și se aduce la cunoștință publică prin afișare și publicare pe pagina web la adresa: www.primaria-cosmesti.ro.

Primar, ing. Ion Tuchiluş



Anexa nr. 1 la proiectul nr. 7201/02.09.2022

Avand in vedere Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, urmare adresei DGRFP Galati nr. 16915/29.08.2022 prin care s-a aprobat modificarea repartizarii pe trimestre, pentru anul 2022, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate, avand in vedere adresele Scolii Gimnaziale General Dumitru Damaceanu numerele 1925/18.08.2022 si 2015/01.09.2022 avand in vedere necesitatea efectuării de virari de credite la nivel de alineat la Clubul sportiv, solicit rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Cosmesti pe anul 2022, dupa cum urmează:

INFLUENȚE LA BUGETUL LOCAL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI:

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Total an	Trim III	Trim IV
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)	00.01	0.00	-9.00	9.00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	0.00	-9.00	9.00
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	0.00	-9.00	9.00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	0.00	-9.00	9.00
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	0.00	-9.00	9.00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	0.00	-9.00	9.00
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	0.00	-9.00	9.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0.00	-9.00	9.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0.00	16.00	-16.00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0.00	16.00	-16.00
Salarii de baza	10.01.01	0.00	16.00	-16.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0.00	-18.00	18.00
Bunuri si servicii	20.01	10.00	-28.00	38.00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0.00	-18.00	18.00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	10.00	10.00	0.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0.00	-20.00	20.00
Reparatii curente	20.02	-10.00	-10.00	0.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0.00	20.00	-20.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0.00	20.00	-20.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0.00	-7.00	7.00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0.00	-7.00	7.00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0.00	-2.00	2.00
Tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță	57.02.03	0.00	-5.00	5.00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0.00	0.00	0.00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0.00	0.00	0.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0.00	0.00	0.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0.00	0.00	0.00
Bunuri si servicii	20.01	0.00	-20.00	20.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0.00	-20.00	20.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0.00	20.00	-20.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0.00	20.00	-20.00
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	0.00	0.00	0.00
Autoritati executive	51.02.01.03	0.00	0.00	0.00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	0.00	-9.00	9.00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0.00	-25.00	25.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0.00	-25.00	25.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0.00	-18.00	18.00
Bunuri si servicii	20.01	0.00	-18.00	18.00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0.00	-18.00	18.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0.00	-7.00	7.00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0.00	-7.00	7.00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0.00	-2.00	2.00
Tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță	57.02.03	0.00	-5.00	5.00
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04	0.00	-20.00	20.00

Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0.00	-20.00	20.00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0.00	-5.00	5.00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0.00	0.00	0.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0.00	0.00	0.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0.00	0.00	0.00
Bunuri si servicii	20.01	10.00	10.00	0.00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	10.00	10.00	0.00
Reparatii curente	20.02	-10.00	-10.00	0.00
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05	0.00	0.00	0.00
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	0.00	0.00	0.00
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	0.00	16.00	-16.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0.00	16.00	-16.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0.00	16.00	-16.00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0.00	16.00	-16.00
Salarii de baza	10.01.01	0.00	16.00	-16.00
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	0.00	16.00	-16.00
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0.00	16.00	-16.00
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.02	0.00	0.00	0.00

Astfel datorita acestor modificari, Bugetul local al comunei Cosmești nu se modifica nici la partea de venituri nici la cea de cheltuieli, rezultand la partea de venituri suma **16.542,64 mii lei** iar partea de cheltuieli o valoare de **18.283,01 mii lei**, avand un deficit de **1.740,37 mii lei**, finantat din excedentul bugetului local pe anul 2021.


Avand in vedere adresa nr. 222/31.08.2022 a Clubului Sportiv Local Siretul Cosmesti prin care se solicita rectificarea bugetului ca urmare a virarilor de credite, avem urmatoarele modificari:

BUGETUL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII DE LA BUGETUL LOCAL

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Total an	Trim III	Trim IV
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	49.10	0.00	0.00	0.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0.00	0.00	0.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0.00	0.00	0.00
Bunuri si servicii	20.01	0.00	-2.50	2.50
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0.00	-2.50	2.50
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0.00	3.00	-3.00
Hrana pentru oameni	20.03.01	0.00	3.00	-3.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	5.00	2.50	2.50
Uniforme si echipament	20.05.01	5.00	5.00	0.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0.00	-2.50	2.50
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	-5.00	-3.00	-2.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	-5.00	-3.00	-2.00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	0.00	0.00	0.00
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	0.00	0.00	0.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0.00	0.00	0.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0.00	0.00	0.00
Bunuri si servicii	20.01	0.00	-2.50	2.50
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0.00	-2.50	2.50
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0.00	3.00	-3.00
Hrana pentru oameni	20.03.01	0.00	3.00	-3.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	5.00	2.50	2.50
Uniforme si echipament	20.05.01	5.00	5.00	0.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0.00	-2.50	2.50
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	-5.00	-3.00	-2.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	-5.00	-3.00	-2.00
Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)	67.10.05	0.00	0.00	0.00
Sport	67.10.05.01	0.00	0.00	0.00
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.10	0.00	0.00	0.00

Ordonator principal de credite
Primar, Ing. Ion Tuchiluş

Vizat CFP, ec. Eugen Floroiu



REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotărâre privind: **rectificarea bugetului local al Comunei Cosmești, județul Galați pentru anul 2022**

Având în vedere Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, urmare adresei DGRFP Galați nr. 16915/29.08.2022 prin care s-a aprobat modificarea repartizării pe trimestre, pentru anul 2022, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate, având în vedere adresele Școlii Gimnaziale General Dumitru Damaceanu numerele 1925/18.08.2022 și 2015/01.09.2022 având în vedere necesitatea efectuării de virări de credite la nivel de alineat la Clubul sportiv, solicit rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Cosmești pe anul 2022, după cum urmează:

INFLUENȚE LA BUGETUL LOCAL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI:

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Total an	Trim III	Trim IV
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)	00.01	0.00	-9.00	9.00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	0.00	-9.00	9.00
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	0.00	-9.00	9.00
A4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	0.00	-9.00	9.00
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	0.00	-9.00	9.00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București	11.02.02	0.00	-9.00	9.00
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	0.00	-9.00	9.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0.00	-9.00	9.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0.00	16.00	-16.00
Cheltuieli salariale în bani	10.01	0.00	16.00	-16.00
Salarii de bază	10.01.01	0.00	16.00	-16.00
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0.00	-18.00	18.00
Bunuri și servicii	20.01	10.00	-28.00	38.00
Încalzit, Iluminat și forță motrică	20.01.03	0.00	-18.00	18.00
Apa, canal și salubritate	20.01.04	10.00	10.00	0.00
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	0.00	-20.00	20.00
Reparații curente	20.02	-10.00	-10.00	0.00
Bunuri de natură obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0.00	20.00	-20.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0.00	20.00	-20.00
TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0.00	-7.00	7.00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0.00	-7.00	7.00
Ajutoare sociale în numerar	57.02.01	0.00	-2.00	2.00
Tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță	57.02.03	0.00	-5.00	5.00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0.00	0.00	0.00
Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0.00	0.00	0.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0.00	0.00	0.00
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0.00	0.00	0.00
Bunuri și servicii	20.01	0.00	-20.00	20.00
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	0.00	-20.00	20.00
Bunuri de natură obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0.00	20.00	-20.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0.00	20.00	-20.00
Autorități executive și legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	0.00	0.00	0.00
Autorități executive	51.02.01.03	0.00	0.00	0.00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	0.00	-9.00	9.00
Învățământ (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0.00	-25.00	25.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0.00	-25.00	25.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0.00	-18.00	18.00
Bunuri si servicii	20.01	0.00	-18.00	18.00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0.00	-18.00	18.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0.00	-7.00	7.00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0.00	-7.00	7.00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0.00	-2.00	2.00
Tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță	57.02.03	0.00	-5.00	5.00
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04	0.00	-20.00	20.00
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0.00	-20.00	20.00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0.00	-5.00	5.00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0.00	0.00	0.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0.00	0.00	0.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0.00	0.00	0.00
Bunuri si servicii	20.01	10.00	10.00	0.00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	10.00	10.00	0.00
Reparatii curente	20.02	-10.00	-10.00	0.00
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05	0.00	0.00	0.00
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	0.00	0.00	0.00
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	0.00	16.00	-16.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0.00	16.00	-16.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0.00	16.00	-16.00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0.00	16.00	-16.00
Salarii de baza	10.01.01	0.00	16.00	-16.00
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	0.00	16.00	-16.00
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0.00	16.00	-16.00
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.02	0.00	0.00	0.00

Astfel datorita acestor modificari, Bugetul local al comunei Cosmești nu se modifica nici la partea de venituri nici la cea de cheltuieli, rezultand la partea de venituri suma **16.542,64 mii lei** iar partea de cheltuieli o valoare de **18.283,01 mii lei**, avand un deficit de **1.740,37 mii lei**, finantat din excedentul bugetului local pe anul 2021.

Avand in vedere adresa nr. 222/31.08.2022 a Clubului Sportiv Local Siretul Cosmesti prin care se solicita rectificarea bugetului ca urmare a virarilor de credite, avem urmatoarele modificari:

BUGETUL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII DE LA BUGETUL LOCAL

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Total an	Trim III	Trim IV
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	49.10	0.00	0.00	0.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0.00	0.00	0.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0.00	0.00	0.00
Bunuri si servicii	20.01	0.00	-2.50	2.50
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0.00	-2.50	2.50
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0.00	3.00	-3.00
Hrana pentru oameni	20.03.01	0.00	3.00	-3.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	5.00	2.50	2.50
Uniforme si echipament	20.05.01	5.00	5.00	0.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0.00	-2.50	2.50
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	-5.00	-3.00	-2.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	-5.00	-3.00	-2.00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	0.00	0.00	0.00
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	0.00	0.00	0.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0.00	0.00	0.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0.00	0.00	0.00

Bunuri si servicii	20.01	0.00	-2.50	2.50
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0.00	-2.50	2.50
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0.00	3.00	-3.00
Hrana pentru oameni	20.03.01	0.00	3.00	-3.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	5.00	2.50	2.50
Uniforme si echipament	20.05.01	5.00	5.00	0.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0.00	-2.50	2.50
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	-5.00	-3.00	-2.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	-5.00	-3.00	-2.00
Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)	67.10.05	0.00	0.00	0.00
Sport	67.10.05.01	0.00	0.00	0.00
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.10	0.00	0.00	0.00

Solicite Raport de specialitate Biroului financiar contabil cu respectarea termenelor prevăzute de lege și Raport de avizare comisiei nr. 1 a Consiliului local, conform termenelor prevăzute în Dispoziția de convocare a ședinței în care se va discuta proiectul.

PRIMAR,
Ing. Ion Tuchiluş



RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de hotărâre privind: *rectificarea bugetului local al Comunei Cosmești, județul Galați pentru anul 2022*

În temeiul art. 136, alin.(4) și alin.(8) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, analizând propunerea inițiatorului, proiect de hotărâre privind *rectificarea bugetului local al Comunei Cosmești, județul Galați pentru anul 2022*, constat următoarele:

- proiectul de hotărâre este temeinic, bine justificat în concordanță cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. b), alin.(7), lit.a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;
- se asigură legalitatea conform art. 19 alin. (2) și următoarele din Legea nr. 273/29.06.2006 privind finanțele publice locale;
- proiectul este necesar și oportun și corespunde cu documentele contabile ale instituției;
- prin rectificare se asigură reechilibrarea bugetului local și sprijinirea capitolelor, în vederea bunei desfășurări a activităților locale pentru efectuarea unor obiective locale, sprijinirea cultelor și achitarea unor obligații cedecurg din acorduri în care este parte comuna Cosmești.

Este de competența Consiliului Local al comunei, în conformitate cu prevederile art. 129, alin. (4) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, de a aproba Hotărârea privind *rectificarea bugetului local al Comunei Cosmești, județul Galați pentru anul 2022*.

ȘEF BIROU FINANCIAR CONTABIL,
Ec. Eugen FLOROIU

Referat de necesitate

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei COSMEȘTI pentru anul 2022

Avand in vedere Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, urmare adresei DGRFP Galati nr. 16915/29.08.2022 prin care s-a aprobat modificarea repartizarii pe trimestre, pentru anul 2022, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate, avand in vedere adresele Scolii Gimnaziale General Dumitru Damaceanu numerele 1925/18.08.2022 si 2015/01.09.2022 avand in vederea necesitatea efectuarii de virari de credite la nivel de alineat, solicit rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Cosmesti pe anul 2022, dupa cum urmeaza:

INFLUENTE LA BUGETUL LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI

Denumirea indicatorilor	Cod indicat or	Total an	Trim III	Tri m IV
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)	00.01	0.00	-9.00	9.00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	0.00	-9.00	9.00
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	0.00	-9.00	9.00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	0.00	-9.00	9.00
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	0.00	-9.00	9.00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	0.00	-9.00	9.00
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	0.00	-9.00	9.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0.00	-9.00	9.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0.00	16.00	- 16.0 0
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0.00	16.00	- 16.0 0
Salarii de baza	10.01.01	0.00	16.00	- 16.0 0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0.00	- 18.00	18.0 0
Bunuri si servicii	20.01	10.00	- 28.00	38.0 0
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0.00	- 18.00	18.0 0
Apa, canal si salubritate	20.01.04	10.00	10.00	0.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0.00	- 20.00	20.0 0
Reparatii curente	20.02	- 10.00	- 10.00	0.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0.00	20.00	- 20.0 0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0.00	20.00	- 20.0 0
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0.00	-7.00	7.00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0.00	-7.00	7.00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0.00	-2.00	2.00
Tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță	57.02.03	0.00	-5.00	5.00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0.00	0.00	0.00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0.00	0.00	0.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0.00	0.00	0.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0.00	0.00	0.00
Bunuri si servicii	20.01	0.00	-	20.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0.00	-	20.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0.00	20.00	-
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0.00	20.00	-
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	0.00	0.00	0.00
Autoritati executive	51.02.01.03	0.00	0.00	0.00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	0.00	-9.00	9.00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0.00	-	25.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0.00	-	25.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0.00	-	18.00
Bunuri si servicii	20.01	0.00	-	18.00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0.00	-	18.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0.00	-7.00	7.00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0.00	-7.00	7.00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0.00	-2.00	2.00
Tichete de creşă şi tichete sociale pentru grădiniţă	57.02.03	0.00	-5.00	5.00
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04	0.00	-	20.00
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0.00	-	20.00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0.00	-5.00	5.00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0.00	0.00	0.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0.00	0.00	0.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0.00	0.00	0.00
Bunuri si servicii	20.01	10.00	10.00	0.00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	10.00	10.00	0.00
Reparatii curente	20.02	-	-	0.00
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05	0.00	0.00	0.00
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	0.00	0.00	0.00
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	0.00	16.00	-
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0.00	16.00	-
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0.00	16.00	-
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0.00	16.00	-
Salarii de baza	10.01.01	0.00	16.00	-

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	0.00	16.00	-
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0.00	16.00	16.00
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.02	0.00	0.00	0.00

Astfel datorita acestor modificari , Bugetul local al comunei Cosmești nu se modifica nici partea de venituri nici cea de cheltuieli , rezultand la partea de venituri suma **16.542,64 mii lei** iar partea de cheltuieli o valoare de **18.283,01 mii lei**, avand un deficit de **1.740,37 mii lei**, finantat din excedentul bugetului local pe anul 2021.

Avand in vedere adresa nr. 222/31.08.2022 a Clubului Sportiv Local Siretul Cosmesti prin care se solicita rectificarea bugetului ca urmare a virarilor de credite pe trimestre și alineate, avem urmatoarele modificari:

BUGETUL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII DE LA BUGETUL LOCAL

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Total an	Trim III	Trim IV
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	49.10	0.00	0.00	0.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0.00	0.00	0.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0.00	0.00	0.00
Bunuri si servicii	20.01	0.00	-2.50	2.50
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0.00	-2.50	2.50
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0.00	3.00	-3.00
Hrana pentru oameni	20.03.01	0.00	3.00	-3.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	5.00	2.50	2.50
Uniforme si echipament	20.05.01	5.00	5.00	0.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0.00	-2.50	2.50
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	-5.00	-3.00	-2.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	-5.00	-3.00	-2.00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	0.00	0.00	0.00
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	0.00	0.00	0.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0.00	0.00	0.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0.00	0.00	0.00
Bunuri si servicii	20.01	0.00	-2.50	2.50
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0.00	-2.50	2.50
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0.00	3.00	-3.00
Hrana pentru oameni	20.03.01	0.00	3.00	-3.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	5.00	2.50	2.50
Uniforme si echipament	20.05.01	5.00	5.00	0.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0.00	-2.50	2.50
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	-5.00	-3.00	-2.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	-5.00	-3.00	-2.00
Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)	67.10.05	0.00	0.00	0.00
Sport	67.10.05.01	0.00	0.00	0.00
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.10	0.00	0.00	0.00

Șef Birou financiar-contabil,
Ec. Floroiu Eugen



MINISTERUL FINANTELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANTELOR
PUBLICE GALAȚI
ACTIVITATEA DE TREZORERIE ȘI CONTABILITATE
PUBLICĂ



Direcția Generală Regională
a Finanțelor Publice - Galați

Nr. GLR_TRZ-16915/29 august 2022

KIR 7029/29.08.2022

Domnului Ion TUCHILUS
Primar, Comuna Cosmești
Comuna Cosmești, județul Galați

Stimate domnule primar,

Ca răspuns la solicitarea dumneavoastră și potrivit adresei Ministerului
Finanțelor nr. 465754/2022, vă comunicăm faptul că vi s-a aprobat
modificarea repartizării pe trimestre, pentru anul 2022, a sumelor defalcate
din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate
la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului
București, potrivit prevederilor art. 50 din Legea privind finanțele publice
locale, nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

Trimestrul III
-9 mii lei

Trimestrul IV
9 mii lei

Vă rugăm să dispuneți măsurile necesare pentru modificarea corespunzătoare a
bugetului unității dumneavoastră administrativ-teritoriale.

Cu deosebită considerație,

Aurica VIRGOLICI

Director executiv trezorerie



Str. Brăilei, nr. 33
Galați, CP 800083
Tel : 0236460584
e-mail: registratura.atcp.gl@anaf.ro

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

Scoala Gimn Gen D Damaceanu Cosmesti
Nr. Inreg. 1925/18.08.2022

NR. 675/ 18.08.2022.

Situatia necesarului de sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si municipiului Bucuresti, pentru primele 9 luni ale anului 2022

Nr. crt	Denumire indicatori	Prevederi bugetare aprobate pentru primele 9 luni ale a.c.	Plati efectuate pana la data de 17.08.2022	Necesar pentru platile de efectuat pana la finele trimestrului III a.c.	Necesar suplimentar/Economii sume defalcate din T.V.A. pentru efectuarea platilor pana la finele trimestrului III a.c.
a	b	1	2	3	4= (col2+col3)-col 1
1	cheltuielile prevazute la art. 104 alin. (2) lit. b) - d) din Legea educatiei nationale nr.1/2011				-18
2	drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiile lunare ale persoanelor cu handicap grav	175	107	50	
3	drepturilor stabilite de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate				0
4	drepturilor copiilor cu cerințe educationale speciale integrati in invatamantul de masa				0
5	cheltuielile de functionare a caminelor pentru persoane varstnice	23	21	0	-2
6	acordarea suportului alimentitar pentru prescolari si elevi				0
7	cheltuielile cu bursele acordate elevilor din unitatile de invatamant preuniversitar de stat				0
8	Total sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si municipiului Bucuresti	120	100	20	-20
		318	228	70	

mii lei

Ordonator de credite,

Prof Oanca Veronica



Conducatorul compartimentului financiar contabil,
Vasilache Lucica

[Signature]

MINISTERUL EDUCAȚIEI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GENERAL DUMITRU DĂMĂCEANU”
COM. COSMEȘTI JUD. GALAȚI TEL/FAX 0236863365
Email: scosmesti@yahoo.com

Nr.2015/01.09.2022


NR. 2194/01.09.2022

CĂTRE,
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA
Com. COSMEȘTI

Ca urmare a adresei 1925/18.08.2022 va solicitam rectificarea bugetara pe trimestrul III/2022 la Titlul II „Cheltuieli cu bunuri și servicii” și la Titlul IX „Cheltuieli cu ajutoare sociale” astfel :

	Trim III	TrimIV
- 20.01.03	- 18000 lei	+18000
- 57.02.01	- 2000 lei	+ 2000

Director
Prof. OANCA VERONICA



Contabil
VASILACHE LUCICA

CLUBUL SPORTIV LOCAL „SIRETUL”

COM. COSMESTI/JUD. GALATI

COD FISCAL 39544776

Nr. 222/31.08.2022

KIR. 7100/ 31.08.2022

CATRE,

U.A.T COSMEȘTI

Având în vedere că la nivelul clubului activitatea sportivilor a atins rezultate deosebite, pentru continuarea în condiții optime, vă solicităm rectificarea bugetului și virarea între alineate după cum urmează:

Trim III

20.01.09 = -2.500 (prestări servicii) ✓
20.03.01 = + 3.000 (hrana) ✓
20.05.01 = +5000 (echipament) ✓
20.05.30 = -2.500 (alte obiecte de inventar) ✓
20.30.30 = -3.000 (alte cheltuieli cu bunuri și servicii) ✓

Trim IV

20.01.09 = ✗ +2.500 (prestări servicii) ✓
20.03.01 = - 3.000 (hrana) ✓
20.05.30 = ✗ + 2.500 (alte obiecte de inventar) ✓
20.30.30 = -2.000 (alte cheltuieli cu bunuri și servicii)

Director,

Prof. Bîrlădeanu Emil Constantin

Contabil,

Dumbrovca Mariana

BIRLADEANU EMIL-
CONSTANTIN

Digitally signed by BIRLADEANU EMIL-CONSTANTIN
DN: c=RO, fo=SAT BALTARETI, sn=BIRLADEANU,
givenName=EMIL-CONSTANTIN,
serialNumber=200506245BEC44, nids=BIRLADEANU
EMIL-CONSTANTIN, cn=BIRLADEANU EMIL-
CONSTANTIN
Date: 2022.09.02 10:07:31 +03'00'

DUMBROVCA
SILVANA-MARIANA

Digitally signed by DUMBROVCA SILVANA-MARIANA
DN: c=RO, fo=TEGUJ, sn=DUMBROVCA, givenName=SILVANA-
MARIANA, serialNumber=200506245DSM32,
name=DUMBROVCA SILVANA-MARIANA, cn=DUMBROVCA
SILVANA-MARIANA
Date: 2022.09.02 10:07:53 +03'00'
